
ZMLUVA O DIELO č. 2024/024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

na Dielo: stavbu „Kanalizácie obce Mníchova Lehota“

medzi:

Objednávateľ:	Obec Mníchova Lehota
so sídlom:	Mnichova Lehota 90, 913 21
IČO:	00311774
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín
číslo účtu vo formáte IBAN:	IBAN: SK80 5600 0000 0006 1127 8001
konajúci prostredníctvom:	Mgr. Jozef Kováč – starosta obce
kontakt:	0905 399 742

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Vedúci člen skupiny dodávateľov:

Dodávateľ:	BAUMANN Nitra s.r.o.
so sídlom:	Lehota 906; 951 36 Lehota
IČO:	47240768
IČ DPH:	SK2023571187
zapísaný:	OR Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vl.č. 41043/N
bankové spojenie:	Tatra banka a.s
číslo účtu vo formáte IBAN:	SK46 1100 0000 0029 4707 6568
konajúci prostredníctvom:	Tomáš Zaujec - konateľ
kontakt:	0910 421 859

(ďalej len „Dodávateľ“ / „Zhotoviteľ“)

(ďalej Dodávateľ a Objednávateľ spolu len „Zmluvná strana“ alebo „Zmluvné strany“)

Člen skupiny dodávateľov :

Dodávateľ:	AAA MIDEA s.r.o.
so sídlom:	Dvorská 23, 940 02 Nové Zámky
IČO:	47 642 343
IČ DPH:	SK2023993763
zapísaný:	OR Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, v.č. 36670/N
bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s
číslo účtu vo formáte IBAN:	SK17 0200 0000 0041 8489 9353
konajúci prostredníctvom:	Peter Habrman - konateľ
kontakt:	0908 841 093

(ďalej len „Dodávateľ“ / „Zhotoviteľ“)

(ďalej Dodávateľ a Objednávateľ spolu len „Zmluvná strana“ alebo „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Objednávateľ je obec Mníchova Lehota, ktorá má záujem o zhotovenie diela – stavbu „Kanalizácie obce Mníchova Lehota“

Dodávateľ je právnickou osobou podnikajúcou v oblasti stavebníctva.

Nakoľko Dodávateľ má záujem zabezpečiť pre Objednávateľa zhotovenie diela – stavbu „Kanalizácie obce Mníchova Lehota“ a vykonať všetky práce a úkony s tým súvisiace, ktorými sú najmä práce a úkony uvedené v tejto Zmluve, práce a úkony vykonávané v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, ako aj iné práce a úkony, bez vykonania ktorých by bolo zhotovenie tohto diela nemožné alebo by k jeho zhotoveniu nemohlo dôjsť za podmienok stanovených v tejto Zmluve, dohodli sa Zmluvné strany na uzavretí tejto Zmluvy za podmienok nižšie uvedených.

I.

PREDMET ZMLUVY

1.1 Dodávateľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje vykonať na vlastné náklady a nebezpečenstvo pre Objednávateľa dielo definované v tejto Zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné zhotovenie diela zaplatiť Dodávateľovi diela cenu za podmienok a vo výške uvedenej v tejto Zmluve.

1.2 Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie:

Výkon všetkých stavebných prác potrebných pre riadne zhotovenie stavby v súlade s projektom pod „Kanalizácie obce Mnichova Lehota“

- v rozsahu podľa zoznamu stavebných objektov a v súlade so všetkými príslušnými právnymi normami, vyjadreniami orgánov a povoleniami vzťahujúcimi sa na prevedenie stavebných prác, stavebných postupov a iných činností súvisiacich so zhotovením vyššie uvedenej stavby;
- postup pri zhotovovaní diela v zmysle stavebného povolenia (Dokladov a vyjadrení orgánov o povolení stavby v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktoré tvoria Prílohu č. 1a a 1b k tejto Zmluve;
- postup pri zhotovovaní diela podľa projektovej dokumentácie stavby, ktorej elektronická podoba tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve
- povinnosť Dodávateľa vykonať všetky úkony a činnosti potrebné na to, aby Objednávateľ mohol dielo použiť na plánovaný účel, ktorý je Dodávateľovi známy zo súťažných podmienok a súťažnej dokumentácie, ktorú obdržal počas procesu verejného obstarávania
- zhotovenie alebo zabezpečenie zhotovenia projektovej dokumentácie v zmysle prílohy *Požiadavky objednávateľa na Dokumentáciu zhotoviteľa, súvisiacu inžiniersku činnosť a skúšky* v zmysle Prílohy č. 4 tejto zmluvy.

(ďalej všetko spolu len „Dielo“)

- 1.3. Dodávateľ po vykonaní a odovzdaní Diela zabezpečí zhotovenie tzv. „Projektu skutočného vyhotovenia“ a ostatných dokumentov v zmysle prílohy Dokumentácia podľa platných právnych predpisov pre všetky vykonané práce. Dodávateľ predloží Objednávateľovi šesť (6) kópií týchto projektov v pevnom plastickom obale spolu s CD nosičom s plánmi vo formáte .dwg , .dxf a pdf. Spolu s Projektom skutočného vyhotovenia Diela Dodávateľ predloží Objednávateľovi aj zameranie skutočného stavu Diela od autorizovaného geodeta týkajúce sa umiestnenia ním zhotovenej podzemnej aj nadzemnej infraštruktúry. Projekt skutočného vyhotovenia Diela ako aj zameranie skutočného stavu Diela od autorizovaného geodeta sa Dodávateľ zaväzuje predložiť Objednávateľovi najneskôr 5 dní pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.

Pre vylúčenie pochybností sa Objednávateľ a Dodávateľ výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je predmetom tejto Zmluvy sa týka úplného zhotovenia celého Diela „Kanalizácie obce Mnichova Lehota“ v rozsahu podľa bodu 1.2 za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku V. tejto Zmluvy. Súčasťou Diela sú taktiež (i) práce a dodávky, ktoré síce nie sú v dokumentácii príslušajúcej k Dielu uvedené, avšak ktoré sú nutné k realizácii funkčného Diela v rozsahu, v prevedení, v lehotách a kvalite stanovenej Zmluvou (napr. skryté prekážky ktorými môžu byť napr. iné uloženie ostatných inžinierskych sietí ako je v projektovej dokumentácii.) a (ii) práce a dodávky súvisiace s realizáciou Diela, ktoré mal a mohol Dodávateľ na základe svojich odborných a technických znalostí predpokladať a

zistiť. Realizácia týchto prác a dodávok v žiadnom prípade nezvyšuje cenu Diela dohodnutú v Zmluve.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že prediskutovanie a zaistenie prípadného zvláštneho užívania komunikácií, rozkopových povolení a projektu organizácie dopravy vrátane jeho odsúhlasenia a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje. Týka sa to všetkých činností a vyjadrení uvedených v Prílohe č.3 Ocenený výkaz výmer vrátane Preambuly a Požiadaviek na ocenenie a zahrnutie prác v jednotlivých položkách vo VV pre VO a v Prílohe č.4 Požiadavky objednávateľa na Dokumentáciu zhotoviteľa, súvisiacu inžiniersku činnosť a skúšky.

- 1.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Dodávateľ potvrdzuje, že s účelom vypracovania Diela bol oboznámený zo strany Objednávateľa pred vypracovaním cenovej ponuky a túto pripravil s ohľadom na účel vypracovania Diela tak, aby tento účel vypracovania Diela bol dosiahnutý po vykonaní všetkých úkonov uvedených a zahrnutých v cenovej ponuke. Z tohto dôvodu je Dodávateľ povinný vykonať všetky úkony potrebné pre dosiahnutie účelu vypracovania Diela a nie je oprávnený požadovať zmenu ceny Diela s odôvodnením potreby vykonania ďalšieho úkonu, ktorý nebol v cenovej ponuke zahrnutý, okrem prípadu, že Dodávateľ preukáže, že potrebu vykonania týchto úkonov nemohol predvídať ani s vynaložením odbornej starostlivosti.

Dodávateľ prehlasuje, že:

je spôsobilý na riadne a odborné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy,
disponuje dostatočnými personálnymi, technickými a materiálnymi prostriedkami, aby jeho záväzky podľa tejto Zmluvy mohli byť plnené riadne a včas,
dobře pozná všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy týkajúce sa vykonania Diela v zmysle tejto Zmluvy a pri plnení tejto Zmluvy sa bude nimi riadiť,
žiadna prekážka mu nebráni alebo ho neobmedzuje vo vykonaní Diela podľa tejto Zmluvy a ani mu nie je známa žiadna prekážka, ktorá by sa mohla v budúcnosti vyskytnúť a zabrániť alebo obmedziť vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy s výnimkou podľa ustanovení o vyššej moci v zmysle čl. XII tejto zmluvy a s výnimkou vyskytnutia sa nepredvídateľných prekážok napríklad na strane Objednávateľa.

- 1.5 V prípade, že niektoré z prehlásení podľa bodu 1.4 tejto Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé, Objednávateľ je oprávnený domáhať sa od Dodávateľa zaplata zmluvnej pokuty

- a) vo výške 1.000,- EUR; týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa domáhať sa za to isté porušenie Zmluvy popri zmluvnej pokute aj náhrady škody vo výške, ktorá presiahne zmluvnú pokutu;
- b) odstúpiť od tejto Zmluvy podľa článku XVII. tejto Zmluvy.

II.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

2.1 Dielo sa bude zhotovovať na nasledovnom mieste:

- pozemky, nachádzajúce sa v k.ú. **Mníchova Lehota** ktoré budú vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa alebo má Objednávateľ právo na nich zriadiť stavbu, najmä parcely uvedené v stavebnom povolení, ktoré tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve (ďalej len „**Stavenisko**“);
- v miestach a priestoroch, kde sa nachádzajú objekty infraštruktúry vymenované v tejto Zmluve;

2.2 Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Dodávateľovi Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy (ktorá bola aj súčasťou súťažných podkladov), podľa ďalších písomných pokynov Objednávateľa a v súlade:

- s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom,
- s pokynmi, normami alebo postupmi (napr. technický list) vyhotovenými výrobcom vecí použitých pri zhotovovaní Diela, pričom tieto majú prednosť pred všeobecne záväznými technickými normami za predpokladu, že výrobca týchto vecí požaduje pre ich použitie pri zhotovovaní Diela splnenie prísnejších podmienok než požadujú všeobecne záväzné technické normy,
- s ďalšími požiadavkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky,
- s príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami Obce Mníchova Lehota. Hlavné VZN 2/2022 O miestnych daniach a poplatkoch
- s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, resp. konečným užívateľom Diela, umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel,
- so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu,
- s požiadavkami na akosť požadovanými jednotlivými správcami sietí.

2.3 Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že je oprávnený k realizácii Diela podľa Zmluvy, že predmet Zmluvy obsahuje všetko, čo je potreba k riadnemu zhotoveniu Diela a že pred začiatkom prác s náležitou odbornou starostlivosťou preveril, že dokumenty a podklady pre zhotovenie Diela prevzaté od Objednávateľa nemajú chyby, jasné nedostatky ani rozpory so stanovenými technickými ukazovateľmi. Dodávateľovi je známe množstvo zadávaných prác i miestne podmienky pre zhotovenie Diela.

2.4 Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky podklady prevzaté od Objednávateľa a na ich základe bude Dielo zhotovovať, pričom tieto podklady posúdil s odbornou starostlivosťou, hlavne po stránke technickej a že v nej nezistil žiadne chyby a nedostatky. Dodávateľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná prístupnosť Staveniska. Dodávateľ zároveň potvrdzuje, že sa nemôže odvolávať na chybu alebo konanie v omyle,

ktoré boli spôsobené v dôsledku zanedbania jeho odbornej starostlivosti. V prípade, ak sa preukáže vyhlásenia Dodávateľa uvedené v tomto bode a v bode 2.3 Zmluvy ako nepravdivé, znáša Dodávateľ všetky dôsledky s tým spojené, pričom cena Diela podľa bodu 5.3 Zmluvy sa tým nemení.

2.5 Dodávateľ sa zaväzuje k vykonaniu Diela na svoje náklady, svoje nebezpečenstvo, v dobe a za podmienok ďalej vymedzených touto Zmluvou a Objednávateľ sa zaväzuje v priebehu realizácie Diela Dodávateľovi poskytnúť všetku súčinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, v dohodnutej lehote realizované Dielo prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu.

2.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ.

2.7 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša až do riadneho vykonania a odovzdania Diela, vrátane odstránenia všetkých jeho väd a nedorobkov, Dodávateľ v plnom rozsahu.

2.8 Dodávateľ nie je oprávnený zadať zhotovovanie Diela alebo jeho časti tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

III. DOBA ZHOTOVENIA DIELA

3.1 Dodávateľ začne práce na realizácii Diela do 15 dní od odovzdania staveniska tak, aby Dokumentáciu Dodávateľa a celé Dielo Dodávateľ vyhotovil a dokončil do 12 mesiacov od dňa písomného odovzdania staveniska Dodávateľovi v súlade s Harmonogramom plnenia a v lehote plnenia.

Objednávateľ si vyhradzuje právo odovzdať stavenisko až po ukončení kontroly procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého bola táto zmluva, pričom výsledok tejto kontroly musí umožňovať financovanie predmetu zmluvy tak, aby spolu s dostupnými zdrojmi Objednávateľa bola finančne pokrytá celá zmluvná cena predmetu zmluvy.

3.2 Termíny uvedené v bode 3.1 tejto Zmluvy musia byť presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní Diela Dodávateľom. Za ukončenia jednotlivých termínov a míľnikov je považované, včasné a úplne ukončenie príslušných prác, vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov a meraní, ktoré je objektívne možné alebo podľa príslušných predpisov potrebné vykonať alebo zabezpečiť v rámci týchto termínov a míľnikov, ako aj odstránenie prípadných väd príslušnej časti Diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenie Objednávateľom. Vykonanie predpísaných skúšok, atestov a meraní, ktoré nie je objektívne možné vykonať alebo zabezpečiť v rámci týchto termínov a míľnikov, sa Dodávateľ zaväzuje vykonať alebo zabezpečiť čo najskôr, ako to bude objektívne možné, najneskôr však do konania konečnej akceptácie Diela v zmysle bodu 11.5 Zmluvy.

3.3 V prípade, ak Dodávateľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy a ustanovení o vyššej moci čl. XII tejto zmluvy a stanovené miľníky podľa harmonogramu prác v bežnom pracovnom čase, a tým splní svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, je povinný samostatne alebo na príkaz Objednávateľa alebo miestneho technického dozoru zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve sa v takýchto prípadoch nemení. V prípade, ak by realizácia diela pripadla na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy bude termín realizácie diela vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Dodávateľa, pričom musí byť dodržaný harmonogram predložený v ponuke Dodávateľa, resp. aktualizovaný harmonogram, ktorý bol konkretizovaný v súlade s harmonogramom predloženým v ponuke Dodávateľa.

3.4 V prípade, ak Dodávateľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť, v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pričom prevzatie riadne vykonaného Diela, alebo jeho častí, nebude Objednávateľom bez vážneho dôvodu odmietnuté.

IV.

PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

4.1 Až do úplného vykonania Diela sa uskutoční týždenné koordinačné rokovanie (kontrolný deň) Objednávateľa a Dodávateľa na Dielo vykonávanom na Stavenisku. Termín koordinačného rokovania (kontrolný deň) bude určený Objednávateľom. Dodávateľ je povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného zástupcu.

4.2 Bez vopred získaného písomného súhlasu Objednávateľa, nemôže Dodávateľ dohadovať alebo vykonávať akékoľvek presuny termínov rozhodných pre zhotovovanie Diela alebo zmeny projektovej dokumentácie stavby.

4.3 Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Dodávateľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude dosiahnuteľný denne od 08:00 hod. do 22:00 hod. mobilným telekomunikačným zariadením. Týmto bude: Tomáš Zaujec. Pripadnú výmenu zodpovedného zástupcu oznámi Dodávateľ bezodkladne Objednávateľovi.

4.4 Okrem pravidelných týždenných koordinačných rokovaní (kontrolných dní) o Dielo je Dodávateľ povinný udržiavať stály kontakt s osobami poverenými Objednávateľom a miestnym technickým dozorom.

- 4.5 Nakoľko práce za účelom zhotovovania Diela sa budú vykonávať v sťažených podmienkach v súvislosti s vykonávaním zemných prác a s priamym výjazdom na komunikáciu II. triedy a miestne komunikácie, Dodávateľ týmto prehlasuje, že počíta s určitými obmedzeniami a potrebou koordinovať práce. Dodávateľ prehlasuje, že si obzrel budúce Stavenisko pred vystavením samotnej ponuky a prerokoval s príslušnými orgánmi skutočnosť, ktoré je potrebné zakalkulovať do celkovej ceny Diela a zabezpečiť si s príslušnými štátnymi orgánmi stavebné pripojky vody, elektrickej energie a iné pripojky potrebné pre zhotovenie Diela (stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie, zabratie verejných priestranstiev a poplatky s tým spojené, a pod.). Dodávateľ berie na vedomie, že navyše náklady vyplývajúce z neznalosti pomerov na Stavenisku nebudú hradené navyše a sú započítané v cene Diela uvedenej v článku V. bod 5.3 Zmluvy.
- 4.6 Dodávateľ bude sám uskutočňovať za seba a za svojich zamestnancov a pracovníkov všetky kontroly plnenia všetkých svojich povinností a záväzkov tak, ako sú stanovené v tejto Zmluve. Na tento účel sa Dodávateľ zaväzuje časovo kontrolovať a merať stavebné práce, súvisiace veci a tovary, zásoby, služby a siete prostredníctvom odborníkov a kompetentných kontrolórov, alebo príslušných orgánov, na základe projektovej dokumentácie stavby prevzatej od Objednávateľa spolu s predbežnými stanoviskami orgánov, so všetkými úradnými návrhmi a dokumentmi výstupnej kontroly, najmä začiatok výstavby, rôzne kontroly atď., pričom všetky náklady týchto kontrol a meraní sú neoddeliteľnou súčasťou ceny za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy a nebudú dodatočne účtované Objednávateľovi.
- 4.7 Dodávateľ bude na žiadosť Objednávateľa poskytovať Objednávateľovi a osobám určeným technickým dozorom správy o postupe prác obsahujúcu minimálne stav postupu zhotovovania Diela (vrátane štúdií, dodania, výroby a výkonu v súvislosti s vyššie uvedenými prácami), dátum, zúčastnené osoby a výsledky všetkých kontrol, meraní a/alebo úradného prieskumu vykonávaného za vyššie uvedeným účelom, prípadné ťažkosti, ktoré sa vyskytli pri plnení Diela, ako aj akékoľvek nápravné opatrenia a dopĺňajúce práce vykonané za účelom riadneho a včasného splnenia Diela v súlade s touto Zmluvou.
- 4.8 Objednávateľ, zástupcovia Objednávateľa ako aj osoby určené technickým dozorom sú počas celého obdobia trvania Zmluvy oprávnení uskutočniť buď na Stavenisku, v dielňach a priestoroch Dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov kedykoľvek v pracovnom čase akúkoľvek kontrolu súvisiacu so Zmluvou tak, aby neprimerane nenarušili alebo nezdržali postup súvisiacich výrobných činností. Dodávateľ poskytne zamestnancom Objednávateľa možnosť vykonania týchto činností, vrátane toho, že im zaistí prístup, svoje zariadenia, povolenia a bezpečnostné vybavenie. Ak počas takýchto kontrol tieto osoby zistia

nedostatky alebo vady, sú oprávnené odmietnuť predmetné veci a tovary alebo ktorékoľvek z predmetných častí Diela.

4.9 Pri častiach Diela, ktoré budú trvale zakryté (napr. potrubia, kanalizácie a pod.) bude Objednávateľ a ním určené osoby (napr. miestny technický dozor, zástupca Objednávateľa a pod.) pred ich zakrytím Dodávateľom písomne pozvaný minimálne dva pracovné dni vopred na vykonanie kontroly tejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, Dodávateľ je povinný opätovne Objednávateľa vyzvať. Ak sa Objednávateľ nedostaví hoci bol na to riadne vyzvaný v súlade s týmto odsekom, je Dodávateľ oprávnený pokračovať v plnom rozsahu vo vykonávaní Diela. Ku kontrole zakrývaných častí Diela predloží Dodávateľ všetky výsledky o vykonaných skúškach, dôkazy o kvalite materiálov použitých pre zakrývané časti Diela, certifikáty a atesty, pokiaľ ich bolo objektívne možné do tohto času vykonať. Pred zakrytím zabezpečí Dodávateľ fotografickú dokumentáciu alebo videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom Objednávateľom a odovzdá ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.

4.10 Objednávateľ alebo zástupcovia kontrolných orgánov majú právo dodatočne požiadať Dodávateľa o odkrytie niektorých častí Diela za účelom ich preverenia (vrátane prác, ktoré boli zakryté podľa bodu 4.9, pričom v takomto prípade:

- (a) má Dodávateľ právo na úhradu prác a nákladov, ktoré boli vyvolané požiadavkou Objednávateľa na odkrytie niektorých častí Diela a
- (b) termín na vykonanie Diela sa predĺži o čas, ktorý je primerane potrebný na vykonanie prác, ktoré boli vyvolané požiadavkou Objednávateľa na odkrytie niektorých častí Diela ak kvalita prevedených prác zodpovedá daným predpisom. Ak sa zistia vady na takto odkrytej časti diela, náklady znáša Dodávateľ.

4.11 Kontrola tovarov, prác, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom, zástupcami Objednávateľa a/alebo osobami poverenými technickým dozorom neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov, prác, Diela alebo ich častí Objednávateľom. Dodávateľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do konečnej akceptácie Objednávateľa s vykonaním a odovzdaním Diela do svojej dispozície.

4.12 Ďalej je Dodávateľ povinný:

- (a) riadiť sa pokynmi a záujmami Objednávateľa, ktoré sú mu známe alebo mu musia byť známe a to s účelom, ktorý sa má dosiahnuť;
- (b) akceptovať prípadnú zmenu technického riešenia, ktoré bude Objednávateľ požadovať v súvisi so zmenou nevyhnutnou na zabezpečenie súladu realizácie s vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov uvedených v stavebnom

povolení. Práce, ktoré vykoná Dodávateľ bez súhlasu Objednávateľa odchyľne od ustanovení tejto Zmluvy, nebudú Dodávateľovi uhradené a v prípade vážnych nedostatkov tieto musí Dodávateľ na svoje náklady odstrániť;

- (c) písomne oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri vykonávaní Diela, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa;
- (d) vykonať Dielo riadne a s odbornou starostlivosťou a pri vykonaní Diela postupovať tak, aby zabránil vzniku škôd;
- (e) vykonať Dielo v celom dohodnutom rozsahu a dohodnutých termínoch;
- (f) vykonať Dielo riadne, t.j. bez väd a nedorobkov;
- (g) vykonať Dielo v súlade s dokumentáciou uvedenou v bode 2.2 tejto Zmluvy a pri vykonávaní Diela dodržiavať záväzné technické a iné platné normy ako aj platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, pri práci sa tiež riadiť rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a subjektov, ktorých majetok alebo práva sú alebo môžu byť dotknuté zhotovením Diela;
- (h) vykonávať Dielo na vlastné náklady, nebezpečenstvo, zodpovednosť a vlastnými prostriedkami a zariadeniami;
- (i) zabezpečiť vykonanie všetkých skúšok s príslušnými výstupmi a atestmi v súlade s platnými právnymi predpismi a v rozsahu príslušných technických noriem a prílohy požadovaných skúšok, pokiaľ sú takéto skúšky alebo atesty platnými predpismi vyžadované a pokiaľ ich je vzhľadom na štádium dokončenia Diela potrebné vykonať;
- (j) zabezpečiť pre vlastných zamestnancov všetky osobné ochranné pracovné pomôcky, predmety a iné nástroje potrebné na vykonávanie Diela;
- (k) dodržiavať inštrukcie a pokyny Objednávateľa. Dodávateľ je oprávnený odchyliť sa od pokynov Objednávateľa aj bez jeho súhlasu, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a Dodávateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. Týmto nie je dotknutá povinnosť Dodávateľ na nevhodnosť pokynov písomne Objednávateľa upozorniť, inak Dodávateľ zodpovedá za následky tým spôsobené. Dodávateľ nezodpovedá za následky spôsobené dodržaním nevhodných pokynov Objednávateľa, ak Dodávateľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval;
- (l) vykonať všetky kroky na ochranu životného prostredia (na stavenisku a aj mimo neho) a na zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom a ďalšími následkami jeho činnosti. Dodávateľ zabezpečí, aby emisie a povrchové znečistenie, spôsobené jeho činnosťou nepresiahli hodnoty stanovené všeobecnými záväznými právnymi predpismi.

- 4.13 Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov, ako aj ostatných pracovníkov, ktorých si vyberie a s ktorými bude spolupracovať pri vykonaní

Diela. Dodávateľ zodpovedá za škody vzniknuté porušením predpisov BOZP a OPP počas plnenia predmetu Zmluvy.

- 4.14 Dodávateľ je povinný použiť pri plnení zmluvy opatrenia environmentálneho manažerstva, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažerstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažerstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L342, 22.12.2009) v platnom znení). Postačuje, aby do schémy EMAS bolo zaradené aspoň jedno miesto dodávateľa (sídlo spoločnosti, prevádzka) s kódom NACE 42.99 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n. (uveďené platí aj pre iný rovnocenný dôkaz).
- 4.15 Dodávateľ stavebných prác počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. [Zákoník práce] minimálne päť osôb, spĺňajúcich kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba.

Na účely tejto Zmluvy sa za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, poskytne Objednávateľ Dodávateľovi stavebných prác potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak Dodávateľ stavebných prác nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Dodávateľ stavebných prác oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

Dodávateľ stavebných prác na preukázanie splnenia povinnosti zamestnať minimálne päť osôb, spĺňajúcich predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, predloží Objednávateľovi na vyzvanie dokumenty preukazujúce ich splnenie (doklad o uzatvorení pracovného vzťahu, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a kópiu občianskeho preukazu tejto zamestnanej osoby).

V.

CENA DIELA

- 5.1 Zmluvná cena je stanovená podľa § 3 zákona NR SR 4. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky a iných poplatkov) platnú počas celej doby vykonávania Diela, vrátane prípadov uvedených v ods. 5.2 Zmluvy.
- 5.2 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu článku I. a II. tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán a je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, projektovej dokumentácie stavby a súťažných podkladov.
- 5.3 Cena za dielo je maximálna a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Dodávateľa vyplývajúcich zo zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov Dodávateľa vrátane celkových nákladov na dopravu, akýchkoľvek poplatkov alebo platieb, ktoré je potrebné zaplatiť v súvislosti s vykonávaním Diela, nákladov na získanie akéhokoľvek potrebného povolenia na vykonávanie Diela a nákladov potrebných na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri vykonávaní Diela, skladné, náklady na obsluhu, náklady spotrebovanej energie, vodné, stočné, náklady na opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany, ubytovanie, colné a dovozné poplatky, náklady plynúce z obmedzených priestorov staveniska a verejnej dopravy, náklady na stráženie, udržiavanie čistoty staveniska, na vykonanie všetkých revízií a skúšok, dokladovanie kvality všetkých zabudovaných materiálov (certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.), vrátane všetkých ostatných nákladov vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa Zmluvy a súťažných podkladov, v tom tiež náklady na vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie diela. V Cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním Diela, a to aj náklady, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a účel uvedený v tejto zmluve. Zhotoviteľ si voči Objednávateľovi nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.
- Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela s výnimkou možnosti podľa ods.5.7 sú vylúčené.
- 5.4 Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podľa článku I. a II. tejto Zmluvy je stanovená na sumu:

Cena Diela bez DPH: 1 138 818,50 €

20% DPH: 227 763,70 €

Cena Diela s DPH: 1 366 582,00 €

(slovom: jedenmiliónstotridsať osemtisícosemnaásť €)

Príslušná výška DPH bude pripočítaná a účtovaná k cene diela v zmysle platných právnych predpisov.

5.5 Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré Dodávateľ neocenil, sú ocenené v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú Dodávateľa a platia počas trvania tejto Zmluvy.

5.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že v Cene Diela podľa bodu 5.4 sú zahrnuté aj tieto práce a činnosti.

- Pasportizácia komunikácií, terénu a prísluších objektov pred začiatkom realizácie
- búracie práce, uloženie na skládku, rezanie betónu,
- realizácia dopravného značenia počas trvania Diela;
- realizácia potrebných cestných provizórií (premostenia, lávky pre peších, značky a pod.);
- vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí pred začatím Diela, vrátane dodatočného vytýčenia kolidujúcich sietí, nájdených počas realizácie Diela;
- predpísané skúšky podľa STN;
- geodetické zameranie prípojok resp. nových inžinierskych sietí po vykonaní stavebných prác v rámci Diela, vrátane ich križovania s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami, vrátane geometrického plánu vyhotoveného:
 - a) v grafickej forme v troch vyhotoveniach,
 - b) v digitálnej forme v programe Autocad vo formáte ".dwg" v troch vyhotoveniach podľa bodu 1.3,
- dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela v počte 6 sád, vrátane dokladov vydaných v priebehu realizácie Diela podľa príslušných STN (revízne správy, atesty, dokumentácia a pod.) v zmysle prílohy Dokumentácia. Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela bude dodaná aj v digitálnej forme 3-krát na CD nosiči;
- protokolárne zaškolenie pracovníkov obsluhy Objednávateľa;
- vyhotovenie minimálne 36 (tridsiatich šiestich) digitálnych fotografií v dvoch kópiách každý kalendárny mesiac po dobu výstavby Diela. Tieto fotografie budú preukazovať postup prác a tam, kde je to potrebné, zachytia detaily problémových prvkov. Fotografie musia byť zreteľne označené dátumom a hodinou ich vyhotovenia. Fotografie budú doplnené ich stručným popisom zo strany Dodávateľa.

5.7 K zmene ceny môže dôjsť:

5.7.1. pri zmene zákonnej sadzby DPH

5.7.2 pri zmene colných poplatkov a dovozne prírážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke. Toto musí Dodávateľ preukázať,

5.7.3. v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 ZVO

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Dielo bude financované z finančných prostriedkov pridelených Objednávateľovi z podpory Environmentálneho fondu formou dotácie a z vlastných zdrojov. Fakturačné a platobné podmienky sú stanovené na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov poskytovateľom dotácie. Cena Diela bude Objednávateľom zaplatená na základe štvrtročných faktúr (daňového dokladu) vystavených Dodávateľom za práce vykonané počas predchádzajúceho obdobia na základe zástupcom Objednávateľa (technický dozorom) odsúhlasených položkovitých súpisov úplne alebo pomerne vykonaných prác vyplývajúcich z položiek rozpočtu (Príloha č. 3). Tieto faktúry musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „Čiastkové faktúry“). Po odovzdaní Diela vystaví Dodávateľ konečnú faktúru na základe zástupcom Objednávateľa odsúhlaseného položkovitého súpisu všetkých vykonaných prác (ďalej len „Konečná faktúra“). Po vystavení Konečnej faktúry nebudú ďalšie faktúry Dodávateľa spojené s vykonaním Diela v zmysle tejto Zmluvy uznané. Dodávateľ sa zaväzuje doručovať všetky faktúry Objednávateľovi na jeho adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ Objednávateľ výslovne neurčí inak.

Faktúra – daňový doklad bude obsahovať:

- a) označenie faktúra – daňový doklad a jej číslo
- b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, DIČ objednávateľa a DIČ zhotoviteľa, v prípade, že zhotoviteľ nie je platcom DPH, tak doplní IČO
- c) číslo zmluvy a označenie časti diela
- d) kód projektu ITMS a názov projektu (ak relevantné)
- e) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- f) deň vystavenia a odoslania faktúry
- g) výšku fakturovanej čiastky
- h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum zdaniteľného plnenia
- i) pečiatku a podpis vystavovateľa
- j) v prílohe: súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom objednávateľa oprávneným konať vo veciach technických

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v písm. a) – i) tohto bodu zmluvy je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

- 6.2 Konečnú faktúru je Dodávateľ povinný vystaviť po konečnej akceptácii Diela podľa bodu 11.5 Zmluvy. Konečná faktúra musí obsahovať čiastku zostávajúcu k úhrade a musí byť doložená stanovenými podkladmi, hlavne Objednávateľom potvrdeným protokolom a súpisom všetkých doposiaľ vystavených faktúr. Súčasne je Dodávateľ povinný v Konečnej faktúre prehlásiť, že v tejto faktúre uplatnil všetky svoje peňažné nároky voči Objednávateľovi vzniknuté zo zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou do doby vystavenia Konečnej faktúry, a že nemá voči Objednávateľovi žiadne iné peňažné nároky vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu.
- 6.3 Dodávateľ je povinný pred predložením faktúry predložiť Objednávateľovi v piatich (5) vyhotoveniach súpis vykonaných prác s nižšie predpísanými prílohami na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti. Dodávateľ doručí Objednávateľovi súpis vykonaných prác v členení podľa položkovitého rozpočtu (Príloha č. 3), z ktorých sú zrejmé všetky špecifikácie, zvláštnosti, postupy pri výpočtoch a iné doklady (najmä výsledky vykonaných kontrolných a revízných skúšok a meraní, atesty a certifikáty zabudovaných materiálov v súlade s príslušnými STN, porealizačné geometrické zameranie Diela alebo jeho častí, geometrické plány Diela, resp. jeho častí, dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela, alebo jeho častí) (ďalej len „Kontrolovateľné podklady“) najskôr posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý požaduje uhradiť príslušnú časť ceny Diela. Dodávateľ predloží len tie Kontrolovateľné podklady, ktoré je objektívne možné zabezpečiť a predloží najneskôr do 30 kalendárnych dní nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, za ktorý požaduje uhradiť príslušnú časť ceny Diela. Kontrolovateľné podklady, ktoré nie je objektívne možné zabezpečiť a predloží najneskôr do 30 kalendárnych dní nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, za ktorý Dodávateľ požaduje uhradiť príslušnú časť ceny Diela, sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť a predložiť čo najskôr, ako to bude objektívne možné, najneskôr však do konania konečnej akceptácie Diela v zmysle bodu 11.5 Zmluvy. Dodávateľ predloží Kontrolovateľné podklady a všetky prílohy Objednávateľovi okrem listinnej formy aj vo forme elektronickej (t.j. na CD nosiči) v súlade s Objednávateľom požadovaným členením súborov tak, aby takto vypracované súpisy vykonaných prác a Kontrolovateľné podklady plne vyhověli procesu posudzovania faktúr Objednávateľom.
- 6.4 Úplnosť Kontrolovateľných podkladov podľa bodu 6.2 je nevyhnutným predpokladom na skontrolovanie vykonaných prác Objednávateľom. Objednávateľ má sedem (7) pracovných dní na kontrolu predložených Kontrolovateľných podkladov. Počas týchto siedmich (7) pracovných dní je Objednávateľ povinný sa vyjadriť k akceptácii alebo neakceptácii predložených Kontrolovateľných podkladov, inak je Dodávateľ oprávnený zastaviť realizáciu Diela až do takéhoto vyjadrenia Objednávateľa, pričom v takomto prípade sa Dodávateľ nedostáva do omeškania so zhotovovaním Diela oproti stanoveným míľnikom podľa harmonogramu prác. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany

dohodli, že neodsúhlasenie Kontrolovateľných podkladov zo strany Objednávateľa vo vyššie uvedenej lehote, nemožno považovať za ich akceptáciu a odsúhlasenie. Následne po písomnom odsúhlasení požadovaných Kontrolovateľných podkladov Objednávateľom je Dodávateľ oprávnený vystaviť na ich základe jednotlivé faktúry a doručiť ich Objednávateľovi v troch (3) vyhotoveniach. V prípade, že faktúra vystavená Dodávateľom nespĺňa náležitosti podľa tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť a požadovať jej opravu. Ako dátum doručenia faktúry platí preto deň obdržania faktúry vystavenej podľa tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov.

- 6.5 V prípade, že Objednávateľ zistí, že súpis prác alebo iné dokumenty uvedené v Kontrolovateľných podkladoch nezodpovedajú skutočnosti, vráti tieto Kontrolovateľné podklady v lehote siedmich (7) pracovných dní od ich predloženia Dodávateľovi k oprave. Práce a iné úkony, ktoré nezodpovedajú skutočnosti (uvedené vo vrátených Kontrolovateľných podkladoch) je Dodávateľ oprávnený vyúčtovať až po ich odsúhlasení Objednávateľom. K prácam a iným úkonom uvedených v Kontrolovateľných podkladoch, ktoré neboli vrátené Dodávateľovi na opravu podľa tohto bodu, je Objednávateľ povinný sa vyjadriť podľa bodu 6.4 Zmluvy.

- 6.6 Splatnosť faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi v súlade s týmto článkom Zmluvy. Platba bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa uvedený na príslušnej faktúre.

Objednávateľ je v súlade so zmluvou o poskytnutí podpory s Poskytovateľom dotácie, ktorým je Environmentálny fond oprávnený uhrádzať faktúry z prostriedkov dotácie až na základe kladného stanoviska s úhradou faktúr Poskytovateľom dotácie.

Zo všetkých Dodávateľom vystavených faktúr, Objednávateľ zadrží 5% z fakturovanej ceny do odstránenia väd a nedorobkov z preberacieho konania a úhrady sankcií a zmluvných pokút udelených podľa tejto zmluvy. Po ich odstránení zadržaná čiastka bude uvoľnená do 60 dní, nie však skôr, ako v termíne splatnosti konečnej faktúry za dielo doručenej Objednávateľovi. Zadržné bude Objednávateľovi slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia akýchkoľvek záväzkov Dodávateľa podľa zmluvy.

- 6.7 Jednotlivé platby ceny Diela Objednávateľom nemajú vplyv na zodpovednosť a garancie Dodávateľa. Tieto platby nie je možné chápať ako prevzatie čiastkových výkonov.
- 6.8 Cena Diela bude Dodávateľovi vyplatená na základe príslušných bodov a ustanovení tejto Zmluvy, avšak iba za predpokladu, že Dodávateľ splnil všetky svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, časť Diela za ktorú sa platí je riadne a včas vykonaná (najmä Dodávateľ splnil termíny a míľniky stanovené touto Zmluvou a jej prílohami, v požadovanej kvalite vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov, potrebných preverení a odovzdania dokladovej časti, čo bude doložené potvrdením Objednávateľa). Dodávateľ je oprávnený vystaviť poslednú faktúru až po konečnej akceptácii Diela podľa článku XI. tejto Zmluvy.
- 6.9 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamena, že táto faktúra bola prijatá, pričom Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby

uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplyva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúce uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Dodávateľa a ním poskytnuté záruky.

6.10 Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Dodávateľa v prípade, ak Dodávateľ (i) podstatne poruší túto Zmluvu, (ii) je v omeškaní s vecným plnením podľa tejto Zmluvy, (iii) je v omeškaní so zhotovením Diela podľa harmonogramu prác alebo (iv) preruší realizáciu stavebných prác na Diele, ak takéto prerušenie realizácie stavebných prác môže mať, podľa názoru Objednávateľa, za následok nedodržanie termínov podľa Zmluvy alebo podľa harmonogramu prác. Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Dodávateľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Dodávateľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle čl. VI tejto Zmluvy.

6.11 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať na zaplatenie ceny Diela zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie, resp. akékoľvek nároky, na ktoré má voči Dodávateľovi podľa tejto Zmluvy nárok. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať na zaplatenie ceny Diela akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu vznikne voči Dodávateľovi. Dodávateľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky zo Zmluvy voči pohľadávkam Objednávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

VII.

ZODPOVEDNOSŤ DODÁVATEĽA

7.1 Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú na zhotovovanom Diele a jeho častiach, Stavenisku, zariadeniach existujúcich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobách, pri prácach ktorými bol poverený bez ohľadu či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými podnikateľmi alebo Subdodávateľmi. Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, alebo za ktorú zodpovedá, v plnej výške, okrem prípadu, ak je možné obnovenie pôvodného stavu. Dodávateľ sa v takom prípade zaväzuje obnoviť pôvodný stav na svoje náklady, pričom tieto náklady nebudú mať žiadny vplyv ani sa akokoľvek inak premietajú na výšku ceny Diela a jeho častí dohodnutej podľa tejto Zmluvy.

7.2 Dodávateľ zodpovedá za všetky ním vykonané alebo zariadené práce, výkony a dodávky tým spôsobom, že u všetkých nedostatkov, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej lehoty, zariadi na vyzvanie Objednávateľa alebo užívateľa Diela začatie ich odstránenia v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch (napr. pri výpadkoch akéhokoľvek druhu energie) v technicky najkratšom možnom čase (v prípade havárií

ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. V prípade neplnenia týchto termínov má Objednávateľ právo nechať tieto nedostatky odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Dodávateľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v ponuke Dodávateľa. Pri výskyte nedostatkov idú aj všetky škody vzniknuté dôsledkom nedostatkov a práce navyše potrebné na ich odstránenie (napr. odstránenie obložení, náklady na sledovanie nedostatkov a pod.) na farchu Dodávateľa bez ohľadu na ich výšku. Obdobne je Objednávateľ oprávnený postupovať aj v prípade, ak Dodávateľ do dohodnutej lehoty nedokončí odstraňovanie daných nedostatkov.

- 7.3 Ak je Dodávateľ v omeškaní so zhotovovaním Diela oproti stanoveným míľnikom podľa harmonogramu prác, zodpovedá za škodu vzniknutú z dôvodu vis major a takéto náklady navyše nemôžu byť uplatnené voči Objednávateľovi, nakoľko sú súčasťou dohodnutej ceny Diela podľa tejto Zmluvy.
- 7.4 Dodávateľ je zodpovedný za poškodenie verejných alebo súkromných komunikácií, vozoviek, chodníkov, parkovacích plôch a podobne, ktoré sa spôsobí v dôsledku výkonu stavebných prác na Diele. Dodávateľ je po dobu realizácie Diela zodpovedný za udržiavanie čistoty verejných komunikácií (ciest a ulíc) v blízkosti Staveniska a za ich udržiavanie bez nečistôt a odpadkov, ktoré vznikli v dôsledku výkonu stavebných prác na Diele. Dodávateľ je povinný sledovať zákonné nariadenia a iné záväzné opatrenia príslušných orgánov verejnej moci, ktoré sa týkajú čistoty verejných komunikácií (ciest a ulíc).
- 7.5 V prípade, že Dodávateľ poverí vykonaním časti Diela inú osobu (Subdodávateľa), má pri takomto vykonávaní Diela Dodávateľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám.
- 7.6 Dodávateľ sa zaväzuje včas a s predstihom písomne upozorniť Objednávateľa na relevantné dôvody, ktoré môžu spôsobiť posunutie ktoréhokoľvek termínu dohodnutého v tejto Zmluve, za ktorý nenesie zodpovednosť. V opačnom prípade znáša Dodávateľ škodu, ktorá tým Objednávateľovi vznikne.
- 7.7 Dodávateľ sa zaväzuje do piatich (5) kalendárnych dní od začatia realizácie Diela na viditeľnom mieste označiť stavbu tabuľou, na ktorej bude uvedené meno stavebníka, čísla a dátumy stavebných povolení, zodpovedný projektant, technický dozor, zhotoviteľ, zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa a termín realizácie. Návrh takejto tabule musí Dodávateľ predložiť Objednávateľovi na schválenie.
- 7.8 Dodávateľ zodpovedá za dopravu a manipuláciu s odpadmi vzniknutými v súvislosti so zhotovovaním Diela. Všetky odpady vzniknuté činnosťou Dodávateľa (vrátane odpadov z demolácií a demontáží, obalových materiálov, obalov od farieb, čistidiel, mazadiel, chemikálií a pod.), ktoré nemožno zneškodniť v areáli staveniska, je Dodávateľ povinný zneškodniť a zlikvidovať na vlastné náklady, preukázateľne mimo miesta vykonania Diela. Úhrada nákladov na zneškodnenie odpadov vrátane dopravných nákladov je v réžii Dodávateľa. Dodávateľ je povinný odpady vzniknuté výstavbou odovzdať na zhodnotenie, zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa platného a účinného zákona o odpadoch. Dodávateľ je povinný viesť evidenciu o množstvách a nakladaní so

vzniknutými stavebnými odpadmi a údaje z tejto evidencie ohlasovať príslušnému úradu životného prostredia. K preberaciemu konaniu predloží vyjadrenie orgánu štátnej správy o likvidácii v odpadovom hospodárstve zoznam odpadov vzniknutých pri výstavbe a ich materiálovú bilanciu spolu s dokladmi o spôsobe ich využitia alebo znehodnotenia resp. zneškodnenia.

- 7.9 Dodávateľ je povinný pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu, pri ktorom dôjde k obnaženiu inžinierskych sietí prizvať pracovníkov osoby zodpovednej za funkčnosť a riadny stav príslušnej inžinierskej siete za účelom kontroly stavu izolácie, obsypu a dodržania príslušných noriem.
- 7.10 Dodávateľ je povinný preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov ako aj iných pracovníkov a zamestnancov Subdodávateľov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s polohou zariadení, rozvodov jednotlivých správcov (napr. telekomunikačný kábel, plynovod a i.) a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené. Okrem vyššie uvedeného oboznámenia určených osôb s polohou zariadení a rozvodov jednotlivých správcov nachádzajúcich sa na Stavenisku je Dodávateľ povinný zabezpečiť, aby pred nástupom na akékoľvek práce vykonávané na Stavenisku boli všetky zariadenia a rozvody jednotlivých správcov jednoznačne a viditeľne vytýčené (vyznačené).
- 7.11 Objednávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku činnosti Dodávateľa pri výkone zemných alebo iných prác, najmä ak týmto dôjde k poškodeniu podzemných alebo nadzemných zariadení a rozvodov jednotlivých správcov. Dodávateľ hradí náhradu takýchto škôd v ich plnej výške a zodpovedá za ich odstránenie. Týmto nie je dotknutá výška ceny Diela.
- 7.12 Dodávateľ je povinný v prípade zámeru prenechania výkonu časti diela subdodávateľom, bezodkladne o tejto skutočnosti písomne informovať a zároveň si vyžiadať súhlas Objednávateľa, pričom musí špecifikovať, ktorá časť Diela bude vykonávaná subdodávateľmi, ako aj špecifikovať subdodávateľov a predmet subdodávky.
- 7.13 Keďže zmluva je uzavretá v rámci verejného obstarávania podlimitnej zákazky, ktorá je realizovaná bežným postupom pre podlimitné zákazky, Zhotoviteľ je povinný postupovať nasledovne:
- a) najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviesť Objednávateľovi v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, predmet a rozsah ich subdodávok vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Zoznam všetkých subdodávateľov tvorí prílohu č. 6 tejto zmluvy
 - b) Dodávateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, najneskôr do 5 pracovných dní od uskutočnenia zmeny.
 - c) V prípade zmeny subdodávateľa je Dodávateľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi aspoň 10 pracovných dní vopred údaje o navrhovanom novom

subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno, sídlo o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných činností.

- d) Ak tak určí Objednávateľ v súťažných podkladoch subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ musí byť v prípadoch ustanovených zákonom zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak sa táto povinnosť na subdodávateľa vzťahuje. Ak bol subdodávateľ povinný spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní, pri zmene subdodávateľa musí tieto podmienky spĺňať aj nový subdodávateľ. V takom prípade Dodávateľ predloží Objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa čestné vyhlásenie, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. Ak o to Objednávateľ požiada, Dodávateľ mu predloží v lehote určenej objednávatelom, inak bez zbytočného odkladu, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti subdodávateľa v zmysle zákona.
- e) Zmena subdodávateľa sa vykoná zápisom o zmene zoznamu subdodávateľov (prílohy k zmluve), ktorý podpíšu osoby oprávnené konať podľa zmluvy vo veciach technických za Dodávateľa i Objednávateľa. Objednávateľ odmietne subdodávateľa, ktorý nebude spĺňať podmienky vyžadované pre subdodávateľa zákonom a zmluvou alebo ich splnenie hodnoverne nepreukáže, písomným oznámením zaslaným Dodávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa. Ak sa dodatočne zistí, že subdodávateľ nespĺňa určené podmienky, Objednávateľ ho odmietne bez zbytočného odkladu po tomto zistení.
- f) Subdodávateľ môže vykonávať činnosť v zmysle zmluvy až po jeho odsúhlasení zo strany Objednávateľa a jeho uvedení v zozname subdodávateľov. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, že subdodávateľ, ktorého Objednávateľ odmietol, nebude vykonávať žiadnu činnosť podľa zmluvy. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, že subdodávateľ nezádá subdodávku resp. jej časť ďalšiemu subjektu (nevzťahuje sa na dodávku tovaru). Porušenie povinností podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- g) Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať Dodávateľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Objednávateľ resp. jeho stavebný dozor môže upozorniť Dodávateľa na porušenie povinností alebo správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je Objednávateľ oprávnený využiť právo podľa prvej vety tohto odseku. Odvolaný subdodávateľ bude Dodávateľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia diela, ani zmluvná cena. Všetky náklady spojené so zabezpečením nového subdodávateľa znáša Dodávateľ.

7.14 Dodávateľ bude okrem iného, resp. už vyššie uvedeného:

- a) v prípade využívania Subdodávateľov v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie uvedenej úlohy (časti zhotovovaného Diela) takisto, ako keby ju vykonával sám;
- b) zabezpečovať, že Subdodávatelia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú podmienky Zmluvy, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť a na životné prostredie. Za týmto účelom Dodávateľ v prípade potreby prevedie na Subdodávateľov všetky nevyhnutné záväzky z tejto Zmluvy a osobitne skontroluje kvalifikáciu a autorizáciu zamestnancov a zástupcov Subdodávateľov,
- c) zodpovedať za všetky zdravotné, bezpečnostné a pracovné právne predpisy, ako aj tie z oblasti životného prostredia a záväzky týkajúce sa Subdodávateľov,
- d) okamžite odstraňovať porušenie povinnosti Subdodávateľa, ak také nastane, prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a bude tímit' z toho vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmenou Subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti,
- e) v plnom rozsahu vyplácať Subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby a bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti Diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Dodávateľa a na jeho nebezpečenstvo.

7.15 V prípade, ak nebudú dodržané vyššie uvedené povinnosti, má Objednávateľ právo na nevyplatenie ceny za zhotovenie tých častí Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedených podmienok, bez toho, aby tým bol dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú mohol Objednávateľ potenciálne utrpieť. Všetky relevantné registrácie, osvedčenia alebo akékoľvek iné zákonné požiadavky musia byť splnené a preukázané Dodávateľom a všetkými Subdodávateľmi počas celej doby plnenia Zmluvy. Dodávateľ je povinný preukázať potrebné všetky atesty, certifikáty a technické listy pre všetky materiály zabudované do Diela, a to vždy pred ich zabudovaním. Pred samotným zabudovaním musia byť tieto časti Diela písomne schválené Objednávateľom.

7.16 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom neobmedzuje zodpovednosť Dodávateľa a neznamena v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú Dodávateľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcich zo Zmluvy. Dodávateľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich Subdodávateľov, ich zástupcov a personál tak, ako je Dodávateľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť alebo jeho zamestnancov alebo pracovníkov.

VIII.

ZÁRUČNÁ DOBA

- 8.1 Všeobecná záručná doba na Dielo je šesťdesiat (60) mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Diela.
- 8.2 Dodávateľ predloží Objednávateľovi aj návrhy servisných zmlúv na tie časti zhotovovaného Diela, pri ktorých je potrebné vykonávať pravidelný servis.
- 8.3 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. U tých väd, ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených väd a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 8.4 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zhotovené Dielo bolo užívané riadne a zároveň aby bola vykonávaná všetka potrebná údržba s potrebnou starostlivosťou. Dodávateľ na tento účel písomne upozorní Objednávateľovi pri odovzdaní Diela na všetky špecifiká zhotoveného Diela a zároveň odovzdá Objednávateľovi podrobný manuál s definovaním potrebnej údržby a pravidelného servisu a zápisom o zaškolení obsluhy.
- 8.5 Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Dodávateľ zúčastnil záverečnej obhliadky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.
- 8.6 Nároky z väd podľa tohto článku Zmluvy sa nedotýkajú ostatných nárokov Objednávateľa s tým spojených, najmä nároku na náhradu škody a zmluvnú pokutu.
- 8.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez súhlasu Dodávateľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých Dodávateľom podľa tejto Zmluvy na osobu, na ktorú súčasne prevádza vlastníctvo k Dielu alebo k jeho časti alebo na osobu, ktorá je oprávnená zabezpečovať správu vykonaného Diela. O takomto postúpení práv je Objednávateľ povinný Dodávateľa písomne oboznámiť. Postúpenie práv zo záruk je voči Dodávateľovi účinné dňom doručenia písomného oznámenia o ich postúpení tretej osobe zo strany Objednávateľa.

X.

ZOSTAVENIE ZOZNAMU VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁC A STAVEBNÝ DENNÍK

- 10.1 Presný zoznam (súpis) všetkých vykonaných stavebných prác pri zhotovení Diela podľa tejto Zmluvy, ktorý má byť základom pre vyúčtovanie ceny Diela musí byť pripravený podľa príslušných ustanovení článku VI. tejto Zmluvy. Z každého súpisu vykonaných stavebných prác obdrží technický dozor originál a jednu kópiu.
- 10.2 Súpisy vykonaných stavebných prác, v ktorých sú akékoľvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť. Dodávateľ je povinný bezodkladne

odstrániť namietnuté nedostatky súpisov vykonaných stavebných prác a takéto bez nedostatkov ich doručiť Objednávateľovi.

10.3 Dodávateľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska a mať ho trvale dostupný na stavbe počas pracovného času.

10.4 Dodávateľ je povinný viesť stavebný denník a zapisovať v ňom všetky náležitosti podstatné pre vykonávanie Diela, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, dodávky materiálov a pod.. Dodávateľ je povinný stavebný denník predkladať Dozorovi na odsúhlasenie.

10.5 Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odstránením väd a nedorobkov z Preberacieho konania. Stavebný denník bude umiestnený po dobu zhotovovania Diela u poverenej zodpovednej osoby Dodávateľa.

10.6 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu realizácie Diela kedykoľvek počas pracovnej doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a osoby podľa príslušných ustanovení Stavebného zákona v platnom znení sú oprávnené kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Záznamy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci Dodávateľa, prípadne jeho zástupca, zásadne v ten deň, kedy boli práce vykonané.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že žiadny záznam v stavebnom denníku nemeni obsah tejto Zmluvy.

XI.

PREBERACIE KONANIE

11.1 Hneď ako Dodávateľ dospeje k názoru, že Dielo je riadne zhotovené, Dodávateľ túto skutočnosť oznámi Objednávateľovi doporučeným listom a zároveň vyzve Objednávateľa na vykonanie ohliadky Diela za účelom overenia celkového stavu výkonu Diela a jeho plnohodnotného súladu so Zmluvou a pokynmi Objednávateľa. Následne bude po dohode medzi Zmluvnými stranami a miestnym technickým dozorom stanovený termín preberania Diela.

11.2 Ohliadka Diela bude vykonaná Objednávateľom a osobami ním určenými za účasti Dodávateľa, a ak je to potrebné aj v súčinnosti so Subdodávateľmi tak, aby sa uskutočnilo kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie všetkých vykonaných častí Diela. Dodávateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť Subdodávateľov na svoju zodpovednosť a náklady. Dodávateľ odstráni všetky nedostatky poškodzujúce prevádzku a užívanie Diela zistené a vytknuté počas ohliadky Diela pred vystavením predbežnej akceptácie podľa bodu 11.4 tohto článku Zmluvy.

11.3 Výsledky ohliadky Diela budú Zmluvnými stranami spísané v protokole, pričom výhrady Objednávateľa voči tým častiam Diela, ktoré nebudú zodpovedať parametrom a výkonom

dohodnutým v tejto Zmluve, musia byť Dodávateľom odstránené v čo najkratšom možnom čase.

11.4 Predbežná akceptácia Diela:

11.4.1 Po odstránení všetkých nedostatkov vytknutých Objednávateľom v protokole z ohliadky Diela, Dodávateľ oznámi Objednávateľovi prostredníctvom doporučeného listu záverečné ukončenie Diela vrátane riadneho vykonania a ukončenia opatrení s tým súvisiacich a požiada Objednávateľa o Predbežnú akceptáciu Diela. Následne sa Zmluvné strany dohodnú na dátume uskutočnenia Predbežnej akceptácie Diela.

11.4.2 Predbežná akceptácia Diela sa uskutoční na Stavenisku a Objednávateľ môže Dielo predbežne akceptovať, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky:

- všetky vady Diela vytknuté v protokole z ohliadky Diela boli odstránené k spokojnosti Objednávateľa;
- Dielo môže byť plne bezpečne užívané;
- dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela a celá dokumentácia potrebná k preberaciemu konaniu v zmysle prílohy Dokumentácia a v zmysle článku I bola riadne odovzdaná Objednávateľovi;
- Dodávateľ splnil všetky svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy;
- Zmluvné strany sa dohodli na konečnom rozsahu zhotoveného Diela a definitívnej cene Diela;
- boli úspešne vykonané všetky skúšky a atesty a Dodávateľ odovzdal Objednávateľovi tomu zodpovedajúce certifikáty a potvrdenia o úspešnosti vykonaných skúšok podľa bodu 14.11 Zmluvy;
- Dodávateľ odovzdal Objednávateľovi všetky doklady týkajúce sa Diela a použitých materiálov a postupov, potrebné na riadne užívanie Diela.

11.4.3 Objednávateľ sa môže rozhodnúť, že neodmietne Predbežnú akceptáciu Diela v prípade drobných väd, ktoré nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu alebo prevádzke Diela, ak sa Dodávateľ zaviaže odstrániť takéto vady v najkratšom možnom čase, najneskôr však do Konečnej akceptácie Diela podľa bodu 11.5 tohto článku Zmluvy.

11.4.4 Predbežná akceptácia bude formálne preukázaná správou (protokolom) podpísanou Dodávateľom a Objednávateľom. V takejto správe sa môžu nachádzať výhrady pokiaľ tieto podstatne nekolidujú s prevádzkou a/alebo užívaním Diela. Ak tieto výhrady podstatne kolidujú s prevádzkou a/alebo užívaním Diela, Objednávateľ Predbežnú akceptáciu odmietne. Následne Dodávateľ bez zbytočného odkladu, na svoje náklady odstráni reklamované vady a výhrady pred tým, ako požiada Objednávateľa o Konečnú akceptáciu.

11.5 Konečná akceptácia Diela:

11.5.1 Konečná akceptácia sa uskutoční po vykonanej Predbežnej akceptácii za predpokladu, že:

- všetky výhrady vznesené Objednávateľom počas Predbežnej akceptácie a drobné vady boli odstránené.

11.5.2 Konečná akceptácia Diela bude doložená písomnou správou (protokolom) spoločne podpísanou Dodávateľom a Objednávateľom.

11.5.3 Dodávateľ zostáva aj naďalej zodpovedný za všetky záväzky vzniknuté pred dňom Konečnej akceptácie Diela. Navyše Dodávateľ zostáva zodpovedný za všetky skryté vady po Konečnej akceptácii Diela v zmysle príslušných právnych predpisov a tejto Zmluvy.

11.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na odovzdaní a prebratí len niektorej časti Diela. V takom prípade sa ustanovenia týkajúce preberacieho konania uvedené vyššie v tomto článku Zmluvy budú aplikovať primerane na túto časť Diela.

11.7 Pre zamedzenie pochybností, Objednávateľ je oprávnený pozastaviť platbu akejkoľvek časti ceny Diela splatnú v súlade s touto Zmluvou až do odstránenia všetkých väd a nedorobkov Diela vytknutých pri jeho preberaní a Dodávateľ nemá nárok na zaplatenie akýchkoľvek výdavkov súvisiacich s odstraňovaním väd a nedorobkov Diela.

11.8 Dodávateľ je povinný vypratať stavenisko do 10 kalendárnych dní po Konečnej akceptácii Diela alebo ukončení tejto Zmluvy, ak dôjde k jej ukončeniu skôr, pokiaľ nie je v tejto Zmluve ustanovené inak.

XII.

ZMENY V PRIEBEHU STAVBY, VYŠŠIA MOC

12.1 Ak by bolo začatie zhotovovania Diela spôsobené zavinením Dodávateľa posunuté oproti nástupnému termínu podľa harmonogramu prác platí, že aj napriek tomu musí byť termín vykonania a odovzdania Diela dodržaný bez nároku na zvýšenie ceny Diela dohodnutej v tejto Zmluve.

12.2 Všetky nadväzujúce termíny sa posunú o rovnaký počet dní, o ktorý sa posunul začiatok zhotovenia Diela len v prípade, ak tento posun začiatku zhotovenia Diela písomne odsúhlasí Objednávateľ a Dodávateľ písomne vyjadrí svoj výslovný súhlas s takýmto posunutím. Sankcie podľa tejto Zmluvy ostávajú v platnosti v plnej výške počnúc novými termínmi. Ak Objednávateľ písomne neodsúhlasí posuny v termínoch, posuny v termínoch nemajú platnosť vo vzťahu na nárokovanie si upustenia od sankcií

dohodnutých k pôvodným termínom uvedeným v harmonograme prác odovzdaným Dodávateľom, ktorý tvorí prílohu k tejto Zmluve.

- 12.3 Za vyššiu moc, t.j. udalosť pri všetkej starostlivosti nepredvídateľnú a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvratiteľnú pre účely tejto zmluvy sa považujú najmä: živelné pohromy, vojenské akty (vyhlásené alebo nevyhlásené), občianske nepokoje, štrajky, výkon archeologických prieskumov a okolnosti, ktoré nastanú nezávisle od vôle akejkoľvek zmluvnej strany a bránia jej v splnení záväzku. Zmluvné strany sa dohodli, že za vyššiu moc sa budú považovať okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ustanovenie o Vyššej moci sa použije najmä v prípade nepredvídateľného počasia, ktoré by mohlo mať vplyv na samotný začiatok, priebeh a ukončenie diela a to z povahy samotného diela vyplývajúceho.
- 12.4 Ak je splneniu záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy na strane Objednávateľa alebo Dodávateľa zabránené vyššou mocou, postihnutá zmluvná strana sa zaväzuje bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe a rozsahu okolností v tejto otázke
- 12.5 Bez ohľadu na ktorékoľvek iné ustanovenie tejto zmluvy žiadna zo zmluvných strán nemôže byť obvinená z porušenia tejto zmluvy alebo inak byť zodpovedná voči druhej strane za omeškanie v plnení predmetu tejto zmluvy alebo za nevykonanie ktoréhokoľvek záväzku podľa tejto zmluvy, v rozsahu, v akom je omeškanie alebo nevykonanie dôsledkom pôsobenia vyššej moci, o ktorej bola druhá zmluvná strana informovaná.

XIII

TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY

- 13.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
- 13.1.1 zverejnenie Zmluvy v súlade s príslušnými Právnymi predpismi; a
- 13.1.2 pridelenie dotácie Objednávateľovi Poskytovateľom dotácie ktorým je Environmentálny fond a doručenie správy z kontroly verejného obstarávania poskytovateľom dotácie, pričom poskytovateľ dotácie neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly Objednávateľovi.
- Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu Objednávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly.

Alternatívne:

Táto zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení §47a Občianskeho zákonníka a §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V podpísanej zmluve bude uvedená tá alternatíva, ktorá bude relevantná na základe v tom čase známych podmienok Poskytovateľa dotácie o tom, či kontrola procesu verejného obstarávania sa bude realizovať pred podpisom zmluvy so Zhotoviteľom alebo po jej podpise alebo až po jej účinnosti.

O skutočnostiach podstatných pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy je Objednávateľ bezodkladne povinný informovať Zhotoviteľa.

- 13.2 Objednávateľ si v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy výsledky akejkoľvek kontroly verejného obstarávania alebo realizácie predmetu zmluvy Dodávateľom zo strany poskytovateľa podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie alebo iného oprávneného orgánu alebo iné rozhodnutie poskytovateľa podpory alebo oprávneného orgánu neumožňujú úplné financovanie predmetu zmluvy.

Zhotoviteľ až do odovzdania staveniska podľa tejto Zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela; v opačnom prípade Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi žiadne náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami Zhotoviteľa.

- 13.3 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 13.4 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.

- 13.5 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 13.6 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 13.7 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:
- ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu);
 - ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu ktorýchkoľvek Skúšok ktorejkoľvek časti Diela ani pri opakovaných Skúškach;
 - ak Zhotoviteľ zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi alebo uzatvorí zmluvu v snahe postúpiť akékoľvek práva podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu v rozpore s touto Zmluvou bez súhlasu Objednávateľa;
 - ak je Zhotoviteľ v omeškani s odovzdaním ktorejkoľvek časti Diela o viac ako 60 dní oproti príslušnej Lehote plnenia;
 - ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.
- 13.8 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) v prípade:
- a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákon o verejnom obstarávaní,
 - b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinností vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 13.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 13.10 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

XIV.
OSTATNÉ DOHODY

- 14.1 Dodávateľ je povinný prekontrolovať všetky podklady, plány a technické podklady, ktoré kedykoľvek obdržal alebo obdrží od Objednávateľa pre účely plnenia záväzkov podľa tejto Zmluvy. Ich nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má alebo by mohla mať za následok nefunkčnosť Diela alebo jeho častí, musí Dodávateľ písomne bezprostredne po zistení vady ohlásiť doporučeným listom zástupcovi Objednávateľa, v opačnom prípade zodpovedá za následky tým spôsobené, vrátane škody spôsobenej na Diele.
- 14.2 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Dodávateľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizácie prác a zhotovovania Diela zo strany Dodávateľa, pokiaľ tento bod Zmluvy neustanovuje inak. Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti. Ak dôjde k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizácie prác a zhotovovania Diela zo strany Dodávateľa z dôvodu neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany Objednávateľa, Dodávateľ nezodpovedá za takto vzniknutú škodu. Ustanoveniami v tomto bode nie sú dotknuté ustanovenia bodu 6.3 článku VI. tejto Zmluvy.
- 14.3 Dodávateľ zabezpečí bezvadnú, príslušným normám a predpisom zodpovedajúcu dodávku Diela a jeho častí. Pri vadných dodávkach a výkonoch jednotlivých častí Diela môže Objednávateľ tieto odmietnuť a požadovať riadnu dodávku a výkony, bez ovplyvnenia dohodnutých termínov a zmluvných sankcií. Odstránenie spomínaných nedostatkov nemá za následok vznik finančných nárokov Dodávateľa voči Objednávateľovi nad dohodnutú zmluvnú cenu podľa článku V. Zmluvy.
- 14.4 Dodávateľ sa zaväzuje urobiť všetko pre splnenie predmetu Zmluvy (všetky výkony potrebné pre dokončenie stavebného zámeru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a neprekážalo pri obstarávaní užívacieho povolenia.
- 14.5 Dodávateľ berie na vedomie, že pod pojmom všetky výkony potrebné pre zhotovenie Diela sa rozumejú aj všetky pre neho potrebné: dočasné dopravné značenie aj nad rámec projektovej dokumentácie stavby, náklady na dočasné užívanie plôch za účelom zrealizovania Diela, lešenia, paženia, zdvihacie mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný prúd, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za telefóny, prekryvanie plôch PVC fóliami, ktoré treba chrániť pred zašpinením inými technologickými procesmi, náklady za sociálne prenosné hygienické zariadenia,

strojové vybavenie potrebné pre rezanie materiálov, vykonanie predpísaných skúšok a revízie a pod. Súčasťou dodávky Dodávateľa sú aj všetky opatrenia potrebné a predpísané pre zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavbe a Stavenisku.

- 14.6 V prípadoch, keď je to potrebné pre zhotovenie Diela, sa Dodávateľ zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastný účet uzavrieť s vlastníkmi vedľajších pozemkov dohody o dočasnom užívaní vecí v ich vlastníctve alebo dohody o strpení výkonu určitých činností Dodávateľa spojených so zhotovovaním Diela, pokiaľ je tieto dohody potrebné nevyhnutne použiť alebo využiť pri zhotovení Diela podľa tejto Zmluvy. Náklady takýchto dohôd sú na ťarchu Dodávateľa a nemôžu byť vyúčtované Objednávateľovi.
- 14.7 Plochy a priestory zariadenia stavby, skladovacie a pracovné priestory môžu byť použité až do odvolania iba so súhlasom miestneho technického dozoru. Na výzvu technického dozoru musia sa tieto bezplatne uvoľniť v priebehu troch (3) dní, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený nechať ich uvoľniť tretími osobami na riziko a náklady Dodávateľa bez nutnosti opakovaného vyzvania.
- 14.8 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť včasné vymieranie Diela, príslušných objektov a inžinierskych sietí geodetom, resp. príslušnými úradmi, všetky úradné prihlášky a odhlášky, zvlášť začatie výstavby, rôzne obhliadky, atď. a prevziať s tým spojené náklady, ktoré si následne nebude nárokovať u Objednávateľa. Taktiež sa zaväzuje aj všetky projekty podliehajúce úradnému odobreniu a celú potrebnú dokumentáciu v zmysle prílohy Dokumentácia dať včas na schválenie, aby nenastal posun termínov stavebných prác.
- 14.9 O stráženie materiálov a zariadení potrebných pre zhotovovanie Diela alebo inak s ním súvisiacich sa postará Dodávateľ po dobu zhotovenia Diela, ako aj v čase prípadného prerušenia zhotovovania Diela, sám a na svoje náklady, okrem prípadu, kedy toto prerušenie prác zaviniť Objednávateľ svojim konaním.
- 14.10 Až po Konečnú akceptáciu Diela nesie všetku zodpovednosť za spôsob zhotovovania Diela a nebezpečenstvo škody na Dielach Dodávateľ. Dodávateľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú zabudované do Diela budú nové, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, vhodnej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb, a budú zodpovedať platným slovenským technickým normám. Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že všetky prostriedky, materiály a súčasti, ktoré do Diela vbuďoval alebo ktoré pri zhotovení Diela použije sú a budú bez právnych väd (nie sú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, neboli poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že

Dodávateľ je ich neobmedzeným vlastníkom. Dodávateľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál alebo komponenty, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva tretej osoby. Na tento účel Dodávateľ vyhlasuje, že Objednávateľ je oprávnený za každých okolností sa domnievať, že vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Dodávateľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela zhotovovaného podľa tejto Zmluvy sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Možná budúca oddeliteľnosť materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti Diela od zhotovovaného Diela už nemá vplyv na vlastnícke právo Objednávateľa.

- 14.11 Dodávateľ je ďalej povinný bezodplatne predložiť Objednávateľovi K preberaciemu konaniu všetky platné revízne správy, výsledky meraní, prehliadok a skúšok, certifikáty platné na území Slovenskej republiky týkajúce sa do Diela zabudovaných materiálov a všetky iné doklady potrebné ku kolaudačnému konaniu.
- 14.12 Dodávateľ sa zaväzuje všetku ním vytvorenú sutinu, odpadový a obalový materiál priebežne odstraňovať, za čo nebudú požadované u Objednávateľa žiadne náklady navyše. Na stavbe nesmú byť rozložené materiály, zvyšky materiálov alebo náradie, ktoré nie je práve v ten týždeň v priamom spracovateľskom procese. Ak by Dodávateľ tak neurobil, má plné právo takéto materiály Objednávateľ odstrániť treťou osobou na náklady Dodávateľ, bez upovedomenia vopred a bez ohľadu na ceny za podobnú činnosť, ktoré uviedol Dodávateľ v cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu k tejto Zmluve a bez nároku na uhradenie ich hodnoty Objednávateľom.
- 14.13 Pokiaľ Dodávateľ plánuje postavenie vlastnej informačno-reklamnej tabule, môže tak urobiť len po písomnom súhlase zástupcu Objednávateľa a na vlastné náklady. Súhlas Objednávateľa nebude bez vážneho dôvodu odopretý.
- 14.14 Dočasné oplotenie okolo Staveniska, ktoré je vo vlastníctve Dodávateľa, je Objednávateľ oprávnený využívať pre svoje reklamné účely tak, aby nedošlo k poškodeniu tohto dočasného oplotenia a aby nedochádzalo k obmedzovaniu výkonu stavebných prác na Diele.
- 14.15 Dodávateľ zabezpečí vyznačenie inžinierskych sietí na území stavby a Staveniska a tieto trasy opatrí zreteľnými kolíkmi. Dodávateľ zabezpečí po celý čas zhotovovania Diela obnovu poškodeného vyznačenia trás inžinierskych sietí a zároveň zabezpečí, aby nedošlo na vyznačených trasách inžinierskych sietí k poškodeniu z dôvodov: neplánovaných činností (napr. nenariadených výkopov), skladovania materiálu, prechádzania cez tieto inžinierske siete, parkovania so stavebnými mechanizmami, či inými dopravnými prostriedkami.

- 14.16 Objednávateľ odovzdá Dodávateľovi Stavenisko do termínu začatia prác. Aj v prípade, že Dodávateľ v stanovený termín prevzatia staveniska, stavenisko fyzicky nepreberie, považuje sa stavenisko za odovzdané a súčasne to nespôsobuje posun termínov vykonania Diela podľa tejto Zmluvy. V prípade, že Objednávateľ v stanovený termín stavenisko fyzicky neodovzdá, spôsobuje to posun termínov vykonania diela podľa tejto zmluvy presne o čas, o ktorý je Objednávateľ v omeškaní.
- 14.17 Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej, vodovodnej, kanalizačnej, IT prípojky si zabezpečí Dodávateľ na svoje náklady, pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi.
- 14.18 Dodávateľ je zodpovedný za správne a presné vytýčenie všetkých podzemných sietí a za dodržanie ich ochranných pásiem pri realizácii Diela.
- 14.19 Dodávateľ je povinný zabezpečiť v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných podmienkach na stavenisko v platnom znení potrebnú súčinnosť svojich pracovníkov pri dodržiavaní vypracovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie pokynov poverených koordinátorov. Rovnako je Dodávateľ povinný zabezpečiť súlad svojej činnosti s akýmkoľvek ďalšími aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 14.20 Všetci pracovníci a zamestnanci Dodávateľa musia byť s Dodávateľom v riadnom pracovnoprávnom alebo inom platnom zmluvnom vzťahu. Všetci pracovníci a zamestnanci Dodávateľa musia mať absolvované všetky predpísané školenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpísané školenia a zdravotné prehliadky vyžadované pre špeciálne činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov. Všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku musia mať na hlave ochrannú prilbu a musia byť preukázateľne vybavení osobnými ochrannými pomôckami. Objednávateľ môže vykazať zo Staveniska osoby, ktoré sa vyššie uvedenými ustanoveniami neradia alebo ich nespĺňajú. Náklady týmito vzniknuté (napríklad omeškanie v plnení termínov) znáša Dodávateľ.
- 14.21 Dodávateľ určí zodpovednú osobu za oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za oblasť požiarnej ochrany. Za porušenie zákonov, právnych predpisov a noriem týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany bude Dodávateľ postihovaný špeciálnou sankciou – zmluvnou pokutou vo výške 100,- EUR (jednoto eur) za každý prípad porušenia osobitne. Tejto zodpovednosti sa Dodávateľ voči Objednávateľovi nemôže zbaviť. Podkladom k tejto sankcii bude fotodokumentácia.

- 14.22 Akákoľvek dokumentácia poskytnutá Objednávateľom Dodávateľovi ostáva vo vlastníctve Objednávateľa a Dodávateľ je povinný po dokončení Diela ju Objednávateľovi vrátiť. Dodávateľ nie je oprávnený ponechať si ani akúkoľvek kópiu tejto dokumentácie. Poskytnutú dokumentáciu je Dodávateľ povinný použiť iba v nevyhnutnom rozsahu a na stanovený účel a účel tejto Zmluvy.

XV.

POISTENIE

- 15.1 Dodávateľ je povinný poistiť zhotovované Dielo minimálne na sumu zodpovedajúcu cene za zhotovovanie celého Diela podľa článku V. tejto Zmluvy. Poistenie Diela preukáže Objednávateľovi predložením poisťky, a to najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 15.2 Náklady poistenia sú zahrnuté v cene za zhotovenie Diela podľa článku V. tejto Zmluvy.
- 15.3 V prípade, že ak Dodávateľ nepoistí zhotovované Dielo podľa tohto článku Zmluvy je Objednávateľ, oprávnený poistiť zhotovované Dielo na náklady Dodávateľa sám. Takto vynaložené náklady je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na zaplatenie faktúry Dodávateľa vystavenej v súlade s ustanovením článku VI. tejto Zmluvy. Zároveň je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa náhradu škody, ktorá mu tým vznikne.
- 15.4 Dodávateľ sa zaväzuje vinkulovať prípadné poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti v prospech Objednávateľa, resp. ním určenej osoby, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

XVI.

SANKCIE, ZMLUVNÁ POKUTA, NÁHRADA ŠKODY

- 16.1 Pri nedodržaní a prekročení termínov uvedených v článku III. tejto Zmluvy alebo v harmonograme prác, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny Diela podľa článku V. tejto Zmluvy za každý aj

začatý deň omeškania, maximálne však do výšky 50% ceny diela. Prípadné nároky na náhradu škody, ktoré vznikajú z omeškania termínu, týmto nie sú dotknuté.

16.2 V prípade, že Dodávateľ nedodrží termín nástupu k odstráneniu nedostatkov/havárie podľa bodu 7.2 Zmluvy alebo ju v dohodnutej lehote neodstráni, zaplatí Dodávateľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400,- EUR za každý začatý deň omeškania.

16.3 V prípade, ak Dodávateľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy a táto nie je sankcionovaná inou zmluvnou pokutou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplataenie zmluvnej pokuty:

- vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania sa Dodávateľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie alebo
- vo výške 0,1% z celkovej ceny Diela, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Dodávateľa, pričom tento druh zmluvnej pokuty je možné uplatniť aj opakovane.

Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Dodávateľovi, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia povinností Dodávateľa, nie sú dotknuté zaplataením zmluvnej pokuty Dodávateľom.

16.4 V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s uhradením faktúry vystavenej Dodávateľom v súlade s touto Zmluvou, má Dodávateľ právo požadovať od Objednávateľa zaplataenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej časti ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 10% z ceny Diela podľa článku V. tejto Zmluvy. Dodávateľ nemá nárok na úrok z omeškania na strane Objednávateľa, ktoré vzniklo z dôvodov majúcich svoj pôvod vo vis major. Nárok na zaplataenie úroku z omeškania je Dodávateľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.

16.5 Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky Objednávateľa na jej zaplataenie Dodávateľovi. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplataenie ktorejkoľvek splatnej zmluvnej pokuty, na ktorej zaplataenie je Dodávateľ povinný, proti úhrade niektorej z faktúr vystavených Dodávateľom.

16.6 Ak Dodávateľ bez písomného súhlasu Objednávateľa pri realizácii Diela nedodrží projekt (použije iný stavebný materiál alebo iné stavebné postupy, použije náhradný stavebný materiál alebo náhradné stavebné postupy) je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Eur za každé takého porušenie zmluvy.

- 16.7 Dodávateľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní vopred písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by mal realizovať pre Dodávateľa podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť (schváliť subdodávateľa alebo ho odmietnuť) najneskôr do 5 pracovných dní po dni obdržania písomnej žiadosti Dodávateľa, inak sa má za to, že subdodávateľa schválil. V prípade porušenia povinnosti podľa 1. vety tohto ustanovenia je Dodávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Eur za každý prípad.
- 16.8 Dodávateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne pri vykonávaní Diela porušením jeho povinnosti vykonať Dielo v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a v zmysle tejto Zmluvy. Dodávateľ sa bezpodmienečne a neodvolateľne zaväzuje odškodniť Objednávateľa a nahradiť mu akúkoľvek škodu a náklady (vrátane primeraných nákladov pokút a poplatkov udelených zo strany správnych orgánov), ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s porušením povinnosti Dodávateľa podľa tejto Zmluvy.
- 16.9 V prípade ak Dodávateľ neplní povinnosť podľa bodu 14.19 Zmluvy zaplatí Dodávateľ Objednávateľovi pokutu vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý neodpracovaný kalendárny mesiac, a to za každú osobu podľa predmetnej Zmluvy, maximálne však do výšky celkovej ceny za zhotovenie Diela uvedenej v bode 5.4 Článku V. Zmluvy.

XVII.

PREDČASNÉ UKONČENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

- 17.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
- Dielo je Dodávateľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným podľa tejto Zmluvy alebo príslušným právnym predpisom;
 - dodržanie medzitermínov a termínov uvedených v harmonograme prác odovzdanom Dodávateľom vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné, pričom omeškanie Dodávateľa v trvaní do 10 kalendárnych dní nie je dôvodom pre odstúpenie od tejto Zmluvy;

- Dodávateľ je v omeškaní so splnením miŕníkov podľa harmonogramu prác o viac ako 10 kalendárnych dní bez toho, aby táto skutočnosť nastala v dôsledku omeškania Objednávateľa alebo vyššej moci;
- zo správania Dodávateľa alebo z iných okolností nepochybne vyplýva ešte pred časom určeným na plnenie zmluvnej povinnosti, že táto povinnosť bude porušená podstatným spôsobom, a Dodávateľ neposkytne po vyzvaní Objednávateľa bez zbytočného odkladu dostatočnú záruku;
- Dodávateľ neodstráni nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom;
- Dodávateľ opakovane porušuje ustanovenia tejto Zmluvy a/alebo opakovane neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, pričom takéto opakované porušovanie povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- Nastanú dôvody podľa § 19 zákona 343/2015 ZVO.

17.2 Dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo zastaviť práce iba v prípade, ak Objednávateľ o viac ako 60 dní mešká s úhradou splatnej časti ceny Diela. Termíny pôvodného harmonogramu sa upravujú min. o dobu prerušenia alebo zastavenia prác.

17.3 Odstúpenie ktorejkoľvek Zmluvnej strany je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane, pokiaľ v ňom výslovne nie je určená iná účinnosť. Dodávateľ je v prípade odstúpenia tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou povinný najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať Stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Dodávateľovi. Aj po skončení zhotovovania Diela podľa tejto Zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi primeranú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania Diela a celej stavby nebol žiadny spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený a je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty Diela a z dôvodu predchádzania škodám. V opačnom prípade Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.

17.4 Pri predčasnom ukončení tejto Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami článkov XI. a XII. tejto Zmluvy, pričom ich ustanovenia sa použijú primerane k predčasnému ukončeniu.

17.5 Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od Zmluvy odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti Dodávateľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy na dovtedy vykonané Dielo. Rovnako sa predčasné ukončenie tejto Zmluvy nedotýka ani ustanovení Zmluvy

uvedených v článku XVI a rovnako nemá vplyv na tie práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vznikli Zmluvným stranám pred ukončením tejto Zmluvy a v účinnosti zostávajú tie ustanovenia tejto Zmluvy, z povahy ktorých vyplýva, že majú zostať v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy.

17.6 Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody.

17.7 Zmluvné strany sa dohodli, že sa vylučuje pôsobnosť a aplikácia zákonných ustanovení, ktoré umožňujú ukončenie záväzkového vzťahu aj iným spôsob, ako si dojednali Zmluvné strany v tejto Zmluve.

XVIII.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

18.1 Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretia tejto Zmluvy, zmeny či zániku ich právnej subjektivity, adresy ich sídla, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Ak niektorá Zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietiť, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

18.2 Ak sa ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsahu alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonajú všetko pre to, aby dosiahli rovnaký výsledok ako bol zamýšľaný týmito neplatnými alebo nevykonateľnými ustanoveniami.

18.3 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takého neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.

18.4 Táto Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky, prednostne ustanoveniami Obchodného zákonníka, s tým, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy.

18.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky údaje, informácie, príp. podklady uvedené v tejto Zmluve, ako i poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať povinnosti vyplývajúce im z tejto Zmluvy.

18.6 Táto Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor Zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom ako také nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.

18.7 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcom zmluvných strán. Dodávateľ nie je oprávnený previesť pohľadávky a záväzky a ani akékoľvek iné práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

18.8 Objednávateľ a oprávnené orgány v zmysle právnych predpisov SR a EÚ sú oprávnené vykonávať kontrolu u Dodávateľa. Dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s predmetom plnenia tejto zmluvy počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorú má Objednávateľ uzatvorenú s Poskytovateľom dotácie, ktorým je Environmentálny fond, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

XIX.

ZÁKLADY ZMLUVY

19.1 Pre zmluvné strany sú záväzné aj:

- všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky,
- technické normy platné na území Slovenskej republiky,
- právnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochrany pracovníkov a bezpečnosti práce na území Slovenskej republiky,
- rozhodnutia, povolenia, súhlasy alebo iné individuálne právne akty orgánov verejnej správy vydané v súvislosti so zhotovovaním Diela,
- predpisy spracovania, osvedčenia o schválení, smernice a odporúčania výrobcov a zhotoviteľov materiálov a stavebných dielcov,
- písomné vyjadrenia a pokyny Objednávateľa na základe tejto Zmluvy.

19.2 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú aj jej nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1a, 1b: Doklad o povolení stavby v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)OU-TN-OSZP3-2019/006921-005 TKL
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na CD/DVD
- Príloha č. 3: Položkový rozpočet Diela vrátane Preambuly a Požiadaviek na ocenenie a zahrnutie prác v jednotlivých položkách vo VV
- Príloha č. 4: Požiadavky objednávateľa na Dokumentáciu zhotoviteľa, súvisiacu inžiniersku činnosť a skúšky
- Príloha č. 5: Harmonogram realizácie diela
- Príloha č. 6: Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 7: Doklad(y) o zapísaní do registra partnerov verejného sektora u Zhotoviteľa, jeho iných osôb, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, každého člena skupiny a subdodávateľov, ak sa na nich táto povinnosť vzťahuje.
- Príloha č. 8: Záväzný úverový prísľub
- Príloha č. 9: Potvrdenia a doklady zamestnávania osôb z MRK
- Príloha č. 10: Zoznam osôb, ktorými dodávateľ preukázal vzdelanie a odbornú prax alebo odbornú kvalifikáciu, osôb určených na plnenie zmluvy
- Príloha č. 11: Strojové vybavenie, ktoré má dodávateľ k dispozícii počas zmluvného vzťahu

Všetky prílohy sú rovnako záväzné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy, ak z obsahu tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, pričom v prípade rozporov medzi nimi platí nasledovné poradie:

- Príloha č. 1a, 1b: Doklad o povolení stavby v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)OU-TN-OSZP3-2019/006921-005 TKL
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na CD/DVD

Ostatné prílohy sú rovnako záväzné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy, pričom v prípade rozporov medzi nimi platí stanovisko Objednávateľa.

19.3 Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy, ktoré budú vydané v súvislosti so zhotovovaním Diela, a to bez vplyvu na dohodnuté termíny a medzi termíny zhotovovania Diela a dohodnutú cenu Diela podľa tejto Zmluvy.

19.4 Akékoľvek obchodné a dodacie podmienky bežne používané Dodávateľom nie sú pre Objednávateľa záväzné, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Dodávateľ Objednávateľa o ich

existencii oboznámil a/alebo mu ich predložil a/alebo sa na ne odvoláva v dokumentoch predložených Objednávateľovi pred, počas a/alebo po odovzdaní Dieľa zhotoveného podľa tejto Zmluvy.

XX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

20.1 Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia sú neplatné okrem dôvodov uvedených v § 18 zákona 343/2015 ZVO.

20.2 Neplatnosť a/alebo neprípustnosť jednotlivých častí a ustanovení Zmluvy nespôsobuje neplatnosť ostatných jej ustanovení. Neplatné a/alebo neprípustné časti a ustanovenia Zmluvy musia byť nahradené platnými a prípustnými ustanoveniami, ktoré podľa možnosti zodpovedajú zmyslu a účelu vypustených ustanovení a častí Zmluvy.

20.3 Všetky písomnosti, ktoré sú Zmluvné strany podľa tejto Zmluvy povinné vyhotovovať a vzájomne si doručovať, sa budú doručovať na adresu sídla Zmluvnej strany uvedenej v Obchodnom registri Slovenskej republiky. Všetky písomnosti sa budú považovať za doručené dňom ich preukázateľného doručenia druhej Zmluvnej strane, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak. Písomnosti doručované Dodávateľovi sa považujú za doručené aj v prípade, ak ich Dodávateľ odmietol prijať alebo sa príslušná písomnosť vrátila ako neprevzatá na príslušnej pobočke pošty počas stanovenej odbernej lehoty, pokiaľ táto Zmluva v osobitných prípadoch neustanovuje inak.

20.4 Okrem osôb uvedených v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnení za Zmluvné strany rokovať:

a) za Objednávateľa:	Mgr. Jozef Kováč- starosta obce
telefón:	0905 399 742
email:	mnichovalehota@stonline.sk

b) za Dodávateľa:	Tomáš Zaujec – konateľ spoločnosti
telefón:	0910 421 859
email:	baumann.nitra@gmail.com
adresa:	Lehota 906, 951 36 Lehota

20.5 Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa spravujú slovenským právnym poriadkom.

Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vždy snažiť vyriešiť akékoľvek spory, ktoré sa môžu vyskytnúť počas plnenia tejto Zmluvy, prostredníctvom dohody. V prípade, že Zmluvné

strany nebudú schopné dosiahnuť dohodu, všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred miestne a vecne príslušným súdom SR.

20.6 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek ústne alebo písomné zmluvy alebo dohody upravujúce predmet tejto Zmluvy alebo súvisiace s predmetom tejto Zmluvy v celom rozsahu dňom uzavretia tejto Zmluvy zanikajú, pokiaľ táto Zmluva nestanovuje inak. Zmluvné strany vyhlasujú, že nebudú voči sebe uplatňovať akékoľvek nároky vyplývajúce zo zmlúv a dohôd uvedených v predchádzajúcej vete s výnimkou práv upravených touto Zmluvou.

20.7 Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 4 a Dodávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia.

20.8 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Mníchovej Lehotě, dňa 7.6.2024

Objednávateľ:


Mgr. Jozef Kováč
starosta obce



V Lehotě, dňa 7.6.2024

Dodávateľ: BAUMANN Nitra s.r.o.



BAUMANN Nitra s.r.o.
Tomáš Zaujec - konateľ



V Lehotě, dňa 7.6.2024

Dodávateľ:


AAA MIDEA
Dvorná 23, 940 02 Nové Zámky
IČO: 47642143 DIČ: SK2023993763
IČ DPH: SK2023993763
AAA MIDEA s.r.o.
Peter Habrman - konateľ



Príloha č. 1a, 1b:

Doklad o povolení stavby v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)OU-TN-OS2P3-2019/006921-005 TKL


BAUMANN NIERER & CO.
Schulstr. 600
731 30 Lahr
Tel. 07 34 25 05 50
Fax 07 34 25 05 50
E-Mail: info@baumann-nierer.de
D.C. 2023571187

Začiatok pôvodného elektronického dokumentu

COO.2176.153.2.10626015

Tento list nie je súčasťou obsahu pôvodného elektronického dokumentu
a slúži len na oddelenie jednotlivých pôvodných dokumentov.

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Číslo spisu
OU-TN-OSZP3-2022/004397-004

Trenčín
20. 01. 2023



Rozhodnutie
Verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Predĺženie platnosti povolenia liniovej vodnej stavby: „Kanalizácia obce Mníchova Lehota“
Stavebník: Obec Mníchova Lehota, 913 21 Mníchova Lehota 90

Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, ktorým je: Obec Mníchova Lehota, 913 21 Mníchova Lehota 90, IČO: 00311774, na predĺženie platnosti stavebného povolenia v súlade so zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

predlžuje

v zmysle § 67 a § 69 stavebného zákona platnosť stavebného povolenia č. OU-TN-OSZP3-2019/006921-005 TKL z 02.05.2019, ktorým bola povolená liniová vodná stavba „Kanalizácia obce Mníchova Lehota“, a vedúce novú dobu platnosti na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V ostatných častiach stavebné povolenie č. OU-TN-OSZP3-2019/006921-005 TKL z 02.05.2019 zostáva nezmenené a toto rozhodnutie je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Odôvodnenie

Stavebník, Obec Mníchova, 913 21 Mníchova Lehota 90, podal dňa 06.12.2021 žiadosť na predĺženie platnosti stavebného povolenia č. OU-TN-OSZP3-2019/006921-005 TKL z 02.05.2019, ktoré vydal Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. Rozhodnutím bola povolená vodná stavba „Kanalizácia obce Mníchova Lehota“. Ide o liniovú vodnú stavbu, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch:

Stoka A

par. C-KN č.: 2760, 2761, 3877, 1438/1, 1439, 1519/2, 1407/1, 1440, 1441, 1435, 544, 1442/1, 1414, 1337/8, 1452/1, 3838, par. E-KN č.: 138/1, 139/1, 140/1, 141/1

Stoka A-1
 par. C-KN č.: 1427/1, 1229/7, 1229/14, 1229/3, 1426/1, 157
 Stoka A-1-1
 par. C-KN č.: 1427/1, 1229/7
 Stoka A-2
 par. C-KN č.: 1431, 1437/1, 1436/1, par. E-KN č.: 1389
 Stoka A-2-1
 par. C-KN č.: 1437/1
 Stoka A-2-2
 par. C-KN č.: 1433/2, 1433/6
 Stoka A-3
 par. C-KN č.: 1408/2, 1409/5, 1409/1
 Stoka A-4
 par. C-KN č.: 1422, 1441
 Stoka A-4-1
 par. C-KN č.: 57/2, 1422
 Stoka A-5
 par. C-KN č.: 1441, 7/6, 7/5, 7/2, 10/1, 10/2, 11, 13, 16, 21/2, 22/1, 25, 27, 30/2
 Stoka A-7
 par. C-KN č.: 1436/1, 1442/1
 Stoka A-8
 par. C-KN č.: 628/1, 1519/2, 1417
 Stoka A-9
 par. C-KN č.: 1442/1
 Stoka A-10
 par. C-KN č.: 1416/3
 Stoka A-10-1
 par. C-KN č.: 1416/3, par. E-KN č.: 5
 Stoka B
 par. C-KN č.: 2771, 2766, 2765, 2764, 2763, 3878, 3884, 2790/1, 2790/2, 3882, 3894, 2791/2, 3881, 3880, 1437/1
 Stoka B-1
 par. C-KN č.: 3878
 Stoka C
 par. C-KN č.: 138, 157
 Stoka C-1
 par. C-KN č.: 1426/1, 157
 Výtlak VI
 par. C-KN č.: 1426/1, 157 (ČS), 1519/2, 1430, 1440

V žiadosti o predĺženie platnosti povolenia stavebník uviedol, že so stavbou bolo začaté, o tejto skutočnosti predložil príslušnú dokumentáciu, ale v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov sa v stavbe nepokračovalo.

Oznámenie o zožití konania č. OU-TN-OSZP3-2021/036857-002 zo dňa 20. 12. 2021 správy orgán doručil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou. V oznámení správy orgán vyzval účastníkov konania a dotknuté orgány na oznámenie skutočností, ktoré môžu mať vplyv na vydanie rozhodnutia, hlavne či stanoviská na základe ktorých bolo vydané stavebné povolenie zostávajú v platnosti. Na podanie stanovísk určil správy orgán lehotu 8 dní od doručenia oznámenia. V stanovenej lehote nebola neboli voči predĺženiu platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby vznesené námietky ani pripomienky.

Správy orgán posúdil dôvody, pre ktoré je potrebné predĺžiť stavebné povolenie na liniovú vodnú stavbu a pretože podniksky a stanoviská dotknutých orgánov, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané zostali nezmenené, žiadosti vyhovel, predĺžil platnosť povolenia na ďalšie dva roky a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Posúdenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

V súlade s § 69 ods. 1 stavebného zákona, s prísladným na § 73 ods. 6 vodného zákona, sa rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou (liniová stavba) a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, Obec Mníchova Lehota a webovom sídle Okresného úradu Trenčín po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Mníchova Lehota, túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, s vyznačením uvedených údajov.

Identifikovaní účastníci konania, ktorým sa rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou:

Obec Mníchova Lehota, 913 21 Mníchova Lehota 90

Ing. Pavol Ježík, 913 21 Trenčianska Turná 544

Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Ing. Viera Fircová, Hydroteam, s. r. o., Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava 2 - projektant

Verejná vyhláška – účastníkmi konania, ktorých vlastnícke práva alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - par. C-KN č.: 2760, 2761, 3877, 1438/1, 1439, 407/1, 1440, 1441, 1435, 544, 1442/1, 1414, 1337/8, 1452/1, 3838, 1427/1, 1229/7, 1229/14, 1229/3, 1431, 1437/1, 1436/1, 1433/2, 1433/6, 1408/2, 1409/5, 1409/1, 57/2, 1422, 7/6, 7/5, 7/2, 10/1, 10/2, 11, 13, 16, 21/2, 22/1, 25, 27, 30/2, 628/1, 1519/2, 1417, 1416/3, 2771, 2766, 2765, 2764, 2763, 3884, 2790/1, 2790/2, 3882, 3894, 2791/2, 3881, 3880, 3878, 138, 157, 1426/1, 1519/2, 1430, par. E-KN č.: 5, 138/1, 139/1, 140/1, 141/1, 1389, v katastrálnom území Mníchova Lehota

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis:

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informačná parafka - tento dokument bol vytvorený elektronicky registrom verejnej moci

IČO: 00151886 SÚR: 10026

Doručuje sa

Obec Mníchova Lehota, Mníchova Lehota 90, 913 21 Mníchova Lehota, Slovenská republika

Pavol Ježík, Trenčianska Turná 544, 913 21 Trenčianska Turná, Slovenská republika

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika

Na vedomie

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábřežie I. Kraska 3/834, 921 80 Piešťany 1

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brziarska 3, 911 05 Trenčín 5

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, Bratislava

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1

SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Koniec pôvodného elektronického dokumentu

COO.2176.153.2.10626015

Tento list nie je súčasťou obsahu pôvodného elektronického dokumentu
a slúži len na oddelenie jednotlivých pôvodných dokumentov.

Začiatok pôvodného elektronického dokumentu

Object20220301092940113_0.xml

Tento list nie je súčasťou obsahu pôvodného elektronického dokumentu
a slúži len na oddelenie jednotlivých pôvodných dokumentov.

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-TN-OSZP3-2022/004397-004

Dátum vytvorenia doložky:

01.03.2022

Vytvoril:

Harcek Svorad, RNDr., PhD.

Údaje správoplatnosti rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

23.02.2022

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

x
-

Koniec pôvodného elektronického dokumentu

Object20220301092940113_0.xml

Tento list nie je súčasťou obsahu pôvodného elektronického dokumentu
a slúži len na oddelenie jednotlivých pôvodných dokumentov.

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaradenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaradení konverzií.

Údaje o pôvodných elektronickej dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu COO.2176.153.2.10525015

Formát dokumentu XMLDataContainer

Hodnota elektronickej odlačky pôvodného elektronickej dokumentu

trFgVv/nwP+y90qj00nazyt.Q17ZP9v++9GDvzQuu3KDrybEsaixtC5S2F1RjyBxj[RWXBHULbEBtcBmQ==

Funkcia použitá pre výpočet elektronickej odlačky SHA-512

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu Ob(eci20220301092340113_0.xml

Formát dokumentu XMLDataContainer

Hodnota elektronickej odlačky pôvodného elektronickej dokumentu

ITRidLT7WZcZ6gh2B4Uy4TLtcT2yq5ElaNndTH8MdGynkoI/DUWAGE7ahJ02u/rmeIEsR0/CNZOaP/CaIgw==

Funkcia použitá pre výpočet elektronickej odlačky SHA-512

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- ☒ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
☐ Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickej dokumentu

Typ autorizácie Kvalifikovaný elektronickej podpis

Stav autorizácie platná

Čas autorizácie 21.01.2022 09:05

Čas overenia autorizácie 20.01.2023 13:40

Miesto autorizácie Neuvedená

Detaily údajov o autorizácii Autorizácia je založená na kvalifikovanom certifikáte

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Jara Hurajova, IDCSK-2717138

Zastupovaná osoba Okresný úrad Trenčín

Mandát

Opravníček 1109, Vedúci odboru okresného úradu, podľa § 9 zákona č. 272/2016 Z. z. § 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy, Zákon č. 55/2017 Z. z. o súdej službe

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu:

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov:

Počet naprádznych strán:

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera:

Počet listov:

Údaje o zarubeňovej konverzii

Evidenčné číslo zánamu o zarubeňovej konverzii:

Dátum a čas vykonania zarubeňovej konverzie:

Zaručenú konverziu vykonal¹

IČO:

Názov právnickej osoby:

Meno:

Priezvisko:

Funkcia alebo pracovné zaradenie:

¹ Ak bola verejná funkcia vykonaná elektronicky, uviesť číslo a meno, priezvisko, funkciu a o pracovnom zaradení na rovnakom

Podpis a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
 Partizánska cesta 9
 975 99 Banská Bystrica
 - 082 -



OU-TN-OSZP3-2019/006921-005-TKL

Trenčín, 02. 05. 2019

Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňa 05.06.2019

V Trenčíne 02. 05. 2019 podpis:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 1 a § 5 zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, predloženého projektu vodnej stavby a na základe výsledku vodoprávneho konania

vydáva

stavebníkovi: Obec Mníchova Lehota, 913 21 Mníchova Lehota č. 90, IČO 00311774,
v zastúpení Ing. Pavlom Ježíkom, 913 21 Trenčianska Turná 544,

p o v o l e n i e na uskutočnenie vodnej stavby:

„Kanalizácia obce Mníchova Lehota“.

podľa § 26 vodného zákona, v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Ide o líniovú stavbu, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území Mníchova Lehota, na pozemkoch C-KN parcelné čísla:

-Stoka A

CKN: 2760, 2761, 3877, 1438/1, 1439, 1519/2, 1407/1, 1440, 1441, 1435, 544, 1442/1, 1414, 1337/8, 1452/1, 3838, EKN: 138/1, 139/1, 140/1, 141/1

-Stoka A-1

CKN: 1427/1, 1229/7, 1229/14, 1229/3, 1426/1, 157

-Stoka A-1-1

CKN: 1427/1, 1229/7

-Stoka A-2

CKN: 1431, 1437/1, 1436/1, EKN: 1389

-Stoka A-2-1

CKN: 1437/1

-*Stoka A-2-2*
CKN: 1433/2, 1433/6
-*Stoka A-3*
CKN: 1408/2, 1409/5, 1409/1
-*Stoka A-4*
CKN: 1422, 1441
-*Stoka A-4-1*
CKN: 57/2, 1422
-*Stoka A-5*
CKN: 1441, 7/6, 7/5, 7/2, 10/1, 10/2, 11, 13, 16, 21/2, 22/1, 25, 27, 30/2
-*Stoka A-7*
CKN: 1436/1, 1442/1
-*Stoka A-8*
CKN: 628/, 1519/2, 1417
-*Stoka A-9*
CKN: 1442/1
-*Stoka A-10*
CKN: 1416/3
-*Stoka A-10-1*
CKN: 1416/3, EKN: 5
-*Stoka B*
CKN: 2771, 2766, 2765, 2764, 2763, 3878, 3884, 2790/1, 2790/2, 3882, 3894, 2791/2, 3881, 3880, 1437/1
-*Stoka B-1*
CKN: 3878
-*Stoka C*
CKN: 138, 157
-*Stoka C-1*
CKN: 1426/1, 157
-*Výtlak V1*
CKN: 157 (ČS), 1426/1, 1519/2, 1430, 1440.

Účelom stavby je odkanalizovanie obce Mníchova Lehota vybudovaním verejnej splaškovej gravitačnej kanalizácie z rúr PP (SN 10) DN 300 v celkovej dĺžke 5728,30 m a výtlačného potrubia z rúr HDPE DN 90 v celkovej dĺžke 51,26 m. Splaškové odpadové vody budú odvedené pripravovanou verejnou kanalizáciou a existujúcou do čistiarnie odpadových vôd Trenčianske Stankovce.

Súčasťou vodnej stavby je SO 02 Prečerpávacía stanica ČS 01 a SO 03 NN prípojka.

Rozsah povolovanej vodnej stavby:

SO 01 Splašková kanalizácia

- <i>Stoka A</i>	PP DN 300 SN 10, dĺžka	2219,04 m
- <i>Stoka A-1</i>	PP DN 300 SN 10, dĺžka	236,07 m
- <i>Stoka A-1-1</i>	PP DN 300 SN 10, dĺžka	73,80 m
- <i>Stoka A-2</i>	PP DN 300 SN 10, dĺžka	870,08 m
- <i>Stoka A-2-1</i>	PP DN 300 SN 10, dĺžka	124,03 m
- <i>Stoka A-2-2</i>	PP DN 300 SN 10, dĺžka	125,00 m

-Stoka A-3	PP DN 300 SN 10, dĺžka	199,00 m
-Stoka A-4	PP DN 300 SN 10, dĺžka	161,59 m
-Stoka A-4-1	PP DN 300 SN 10, dĺžka	134,78 m
-Stoka A-5	PP DN 300 SN 10, dĺžka	134,91 m
-Stoka A-7	PP DN 300 SN 10, dĺžka	63,50 m
-Stoka A-8	PP DN 300 SN 10, dĺžka	107,80 m
-Stoka A-9	PP DN 300 SN 10, dĺžka	299,00 m
-Stoka A-10	PP DN 300 SN 10, dĺžka	115,93 m
-Stoka A-10-1	PP DN 300 SN 10, dĺžka	22,90 m
-Stoka B	PP DN 300 SN 10, dĺžka	630,54 m
-Stoka B-1	PP DN 300 SN 10, dĺžka	124,00 m
-Stoka C	PP DN 300 SN 10, dĺžka	58,60 m
-Stoka C-1	PP DN 300 SN 10, dĺžka	27,73 m
Spolu:		5728,30 m
-Výtlak V1	HDPE d90 SDR 17, dĺžka	51,26 m

SO 02 Prečerpávací stanica

Do čerpacej stanice bude zaústená navrhovaná stoka „C“ a „C-1“. Z čerpacej stanice bude splašková voda dopravovaná navrhovaným výtlačným potrubím „V1“.

SO 03 NN prípojka

ČS 01 bude napojená na elektrickú energiu z jestvujúcej vzdušnej siete káblom z existujúceho podporného bodu, na ktorom bude umiestnená skrinka SP S2/2 s poistkami.

A. Záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby:

1. Stavebníkom vodnej je Obec Mníchova Lehota, 913 21 Mníchova Lehota č. 90.
2. Vodná stavba sa bude realizovať dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní.
3. Povolenie sa vzťahuje na realizáciu vodnej stavby podľa projektovej dokumentácie z 08/2018 vypracovanej Ing. Viera Fircová, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 5543 * 12, HYDROTEAM, spol. s r.o., Potočná 377/37, 900 84 Báhoň, overenej vo vodoprávnom konaní.
4. So stavbou začať najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že sa so stavbou nezačne do dvoch rokov, stratí toto povolenie platnosť.
5. Oznámiť začatie a ukončenie stavebných prác Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.
6. Prerokovať s Okresným úradom Trenčín, odborom starostlivosti o životné prostredie – oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu prác nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkové vzťahy.
7. Nahraďiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke povolenej vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka č. 509/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, resp. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
8. Pri realizácii stavby musia byť dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany zdravia a osôb na stavenisku.

9. Pred začatím realizácie stavby je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a počas realizácie stavby je povinný riadiť sa ich pokynmi.

10. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, č. OU-TN-OSZP3-2017/026510-002 SLI z 15. 08. 2017:

- Investor stavby je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval ustanovenia § 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch.

- Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách a vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim účinkom do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.

- Odpad – výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá ma na to povolenie a prevádzkuje miesto na to určené podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

- Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.

- Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo účelné, len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.

- Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu tunajší úrad. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne listky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).

11. Rešpektovať vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava z 10. 08. 2017:

- V zmysle Elektrizácie zákona č. 251/2012 Z. z., žiadame rešpektovať existujúce podzemné vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s. Ďalej žiadame nenarušiť stabilitu existujúcich podporných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav VN a NN vzdušného vedenia pri výkopových prácach.

Pri realizovaní stavby žiadame dodržať priestorovú normu STN 736005.

- Pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác budú riadne vytýčené všetky existujúce podzemné vedenia nízkeho a vysokého napätia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré križujú a sú v súbehu s predmetnou stavbou. Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí príslušný koordinátor Tímu prevádzky Sever.

- Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti nadzemného a podzemného vedenia vysokého a nízkeho napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.

- Pri použití stavebných mechanizmov musí byť zaručené, aby sa žiadna časť stavebného mechanizmu nepriblížila k vodičom 1 KV vzdušného vedenia na vzdialenosť menej ako 0,5 m, k vodičom 22 kV vzdušného vedenia menej ako 1 m, inak hrozí zásah elektrickým prúdom.

O uvedenej skutočnosti musí dodávateľ stavby preukázateľne poučiť svojich pracovníkov.

- Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení (lôžko, výstražná fólia, atď.).

12. Rešpektovať vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6611724498 z 31. 08. 2017:

-Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

-Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

František Chupák, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289

-V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

-Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

-Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

-V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

-Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

-V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti ST, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

-Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

-Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby, žiadateľ nie je oprávnený

poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, presajovať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

-Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

-Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

-V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancami Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

-Ochrana alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom ST, a.s.

-Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

-Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@supitel.sk, 0907 777474

-Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

-Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

-Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

-Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

-Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najvyššou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).

-Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

-Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).

-Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.

-Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami.

-Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

13. Rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP-distribúcia, Mlynské nivy 44/4, 825 11 Bratislava, č. TD/NS/0612/2017/Ga z 08.09. 2017:

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pre začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., (ďalej SPP-D) o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

-V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

-Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Šimo Daniel, tel. č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.

-Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

-Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

-Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

-Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

-Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

-Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

-Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

-Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727.

-Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške 300,-eur až 150 000,- eur.

-Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12 186, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10.

-Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

-Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržiavať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

-Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

14. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. 7678/2017 z 06. 09. 2017;

-Navrhovaná kanalizačná sieť obce bude slúžiť len pre odvádzanie splaškových OV – t. j. dažďové vody zo striech a spevnených plôch ako i vody z komunikácií nie je možné zaistiť do tejto splaškovej kanalizácie. Podmienkou prevádzkyschopnosti predmetnej kanalizácie je vybudovanie prepoja medzi Š0 a jestvujúcou kanalizáciou v Trenčianskej Turnej – časť Háme.

-Pred zahájením zemných prác je potrebné presné vytýčenie vodovodu priamo v teréne. Vytýčenie bude prevedené na základe objednávky, ktorá musí byť predložená v časovom predstihu na TVK a.s., Trenčín. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodu vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Pre vodovodné potrubia platia normy STN 73 6005 a 75 5401, ktoré žiadame prísne rešpektovať.

-KŠ žiadame riešiť ako typové DN 1000 vrátane úpravy jej dna – OV sa dnom šachty prevedú v žliabku šírky zodpovedajúcej šírke stoky alebo kynetou stoky a hĺbky rovnej 1/2 vnútorného priemeru stoky.

-Výústenie KO resp. ZKO do KŠ trasy žiadame výškovo napojiť dnom nad potrubie stoky.

-Pri montážnych prácach – pri prepájaní na jestvujúci zberač – žiadame jestvujúcu kanalizáciu zabezpečiť tak, aby prípadný materiál z výkopu nevnikal do jestvujúcej kanalizácie.

-Vzhľadom na situovanie vodovodu a kanalizácie žiadame v zmysle zákona 442/2002 Z. z. zabezpečiť úpravu kanalizačných poklopov a zariadení do úrovne nivelety komunikácie a plôch, ktorými bude kanalizačná sieť trasovaná – ku dňu preberacieho konania. Rámy pozdvižných poklopov požadujeme podložiť betónovými prstencami. Rebríky resp. stúpačky v objektoch na stokovej sieti v zmysle STN 75 6101 musia byť z materiálov odolných proti korózii alebo z materiálov s priemernou protikoroziou ochranou a musia vyhovovať požiadavkám príslušných noriem a bezpečnostných predpisov.

-Pre stavbu splaškovej kanalizácie bude určený technický dozor, vedúci strediska kanalizácie a ČOV (Ing. Hartmann – č. t. 0911 239469), ktorý bude odsúhlasovať obsypy potrubia, priestorové uloženie potrubia v ryhe a zúčastní sa skúšok vodotesnosti v zmysle STN 75 6910. V opačnom prípade nevydáme súhlas ku kolaudácii stavby.

-Pri realizácii stavby žiadame v plnej miere rešpektovať STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení – nakoľko na stavenisku sa nachádzajú i jestvujúce podzemné a nadzemné siete – v ich ochrannom pásme treba uplatniť ručný výkop. Pred realizáciou treba zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich IS a rešpektovať ich ochranné pásma – STN 75 5401 a ON 75 5411. Trasu kanalizačného potrubia a prípojok viesť tak, aby nedochádzalo k zbytočnému križovaniu sietí.

-Pri preberacom konaní je potrebné odovzdať výkresovú dokumentáciu – projekt skutočného vyhotovenia v grafickom aj digitálnom spracovaní navrhovaného rozšírenia kanalizačnej siete vrátane kanalizačných prípojok, dokladovať prevedenie kamerovej skúšky pre overenie správnosti zhotovenia stoky a zaistenia kanalizačných prípojok a zabezpečiť vypracovanie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie obce.

15. Rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, Pozemkového a lesného odboru, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, č. OU-TN-PLO-2017/028118-003 z 19. 09. 2017:

V prípade dočasného odňatia je žiadateľ povinný pre začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si v zmysle § 17 alebo § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v ktorom OU-TN-PLO určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

V prípade trvalého alebo dočasného odňatia je potrebné pred vydaním stavebného povolenia požiadať OU-TN-PLO o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy.

16. Rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ochrany prírody a krajiny, č. OU-TN-OSZP3-2017/026517-002 koz z 11. 08. 2017:

-Upozorňujeme na dodržiavanie základných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47 tohto zákona. V prípade, ak sa na výrub drevín vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, aj v súlade s ustanovením § 103 ods. 6 tohto zákona. Orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu na výrub drevín je podľa § 69 ods. 1 písm. d) tohto zákona obec. V prípade výskytu zelene je nutná jej ochrana v súlade s STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Výkopy v blízkosti koreňových systémov stromov je nutné robiť ručne a v čo najkratšom čase obnažený koreňový systém zavlaziť a zasypať zeminou.

Počas umiestňovania stavby a jej realizácie je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu inváznych a ruderalných rastlinných druhov a prijať protierózne opatrenia.

17. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany, č. CS SVP OZ PN 7273/2017/2, CZ 28616/210/2017 z 19. 09. 2017:

Z pohľadu správcu Turnianskeho potoka (parc. č. 1519/2 KN-C, k. ú. Mníchova Lehota, LV č. 1134, parc. č. 3879, k. ú. Mníchova Lehota, LV č. 2268), BP Turnianskeho potoka (potok Rakovec, parc. č. 3894, LV č. 2861) a Rigel'ského potoka (parc. č. 1526/1, k. ú. Mníchova Lehota, LV č. 255) a pozemkov v správe SVP, š.p., priamo dotknutých výstavbou so stavbou súhlasíme za dodržania týchto podmienok:

-Pri súbahu a križovaní trasy kanalizácie požadujeme rešpektovať ochranné pásmo tokov, ktoré je stanovené v súlade s STN 75 2102 pri vodohospodársky významnom vodnom toku (Turniansky potok) v šírke min. 6 m od brehovej čiary a pri drobných tokoch (potok Rakovec a Rigel'ský) v šírke min. 4 m od brehovej čiary. V prípade stiesnených pomerov (križovanie kanalizačného zberača „A“ v km 0,78176 – 0,79039, križovanie č. 2 a v km 1,71951 – 1,72531, križovanie č. 4) s umiestnením pomocných jám a kanalizačných lúčň v odstupovej vzdialenosti min. 2 m od brehových čiar súhlasíme.

-So spôsobom križovania tokov súhlasíme. Pri prekopaní tokov podľa predloženej PD vrchná hrana betónového bloku bude min. 1 m od zameranej nivelety dna. Dno ako aj svahy budú opevnené rovinatinou z lomového kameňa hr. 250 mm, uloženou do cementového lôžka hr. 100 mm, vo vzdialenosti 5 m v smere a proti smeru toku. Miesto križovania priamo v teréne vyznačiť „Pozor nebágrovať!“. V prípade pretláčania požadujeme uložiť chráničku v hĺbke min. 1,2 m od zameranej nivelety dna (bez uvažovaného nánosu). Chráničku ako aj betónový blok uložiť aj v ochrannom pásme toku z oboch strán.

-Na práce vykonávané v koryte vodného toku (v prípade prekopania) je potrebné podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho našej organizácii na vyjadrenie a príslušnému orgánu ochrany pred povodňami na schválenie (Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie).

-Križovaním vodných tokov dôjde k trvalým zásahom do nami spravovaných pozemkov, čo požadujeme do doby kolaudácie stavby zmluvne doriešiť na odbore správy majetku OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764405), uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena. Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov neodkladne uviesť do pôvodného stavu. Narušené pobrežie uviesť do pôvodného stavu, terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.

-K zahájeniu a ukončeniu prác v dotyku s našim majetkom prizvať našu úsekovú technicku (Ing. Maslová, 0903 721 443) a jej pokyny rešpektovať.

-Pred zásypom vykopanej ryhy (uloženie kanalizácie) bude prizvaný náš pracovník (Ing. Maslová) k zápisničnému prevzatiu hĺbky uloženia potrubia a rešpektovania našich podmienok. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu o uložení potrubia pod korytom toku sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených našou organizáciou.

-Po zriadení stavby miesto križovania nami spravovaného majetku, vrátane súbežného trasovania kanalizácie zamerať a poriešiteľné zameranie v digitálnej podobe (vo formáte DWG, DGN) odovzdať nášmu zástupcovi na kolaudácii stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní.

-Vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 vodného zákona povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona.

18. Rešpektovať vyjadrenie Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Benianska 3, 911 05 Trenčín, č. SC/2018/3386 z 13. 11. 2018:

-Vybúvaním kanalizácie nesmie dôjsť k prerušeniu odvodňovacieho zariadenia a žiadne zariadenie nesmie byť uložené v cestnom telese a cestnom pozemku tak, aby sťažovalo výkon bežnej údržby komunikácie.

-Počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdny.

-Pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne.

-Počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.

-Požadujeme, aby k samotnej betonáži ryhy bol prizvaný pracovník správcu komunikácie (Vladimír Bednár, č. t. 0903 566 735), ktorý skontroluje dodržiavanie našich podmienok povrchovej úpravy porušenej časti vozovky.

19. Stavebník bude rešpektovať podmienky vyjadrenia Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č. TSK/2018/03319-2 z 22. 01. 2018:

-Stavebník predloží na tunajší úrad v termíne kolaudačného konania, prípadne predčasného užívania stavebných objektov stavby „Kanalizácia obce Mníchova Lehota“ geometrický plán poriešiteľného zamerania stavebného objektu pre návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako vlastníkom časti pozemku parcely registra „C“ číslo 1439, 1440, 1441, 1442/1, 1442/2, katastrálne územie Mníchova Lehota, obec Mníchova Lehota, okres Trenčín, pod cestnou komunikáciou číslo III/1885 (III/507062) a vlastníkom cestnej komunikácie číslo III/1885.

-Pri vytýčení trasy kanalizačného potrubia stavby „Kanalizácia obce Mníchova Lehota“ je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, z dôvodu určenia lomových bodov – hranice cestného telesa cestnej komunikácie číslo III/1885 v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

-Po uložení kanalizačného potrubia (chráničky uvedenej stavby v osi jazdného pruhu cestnej komunikácie číslo III/1885, bude strojne položený súvislý asfaltbetónový koberec v šírke oboch jazdných pruhov a spevnených krajnic (frézovanie 50 mm, strojné zarezanie zápichov, spojovací postrek plochy a hrán, pokládka AC11 O do pôvodnej nivelety cesty, zálievka spojov), preplátovanie konštrukčných vrstiev (min. 500 mm), vrstva AC16 L, spojovací postrek plochy a hrán, vrstva betónu (min. 200 mm) vystuženého kari rohožou, fólia proti úniku technologickej vody z betónu, zásyp kamenivom frakcií 32-63, 63-125, zásyp chráničky,.....

-Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebno- technický stav cestnej komunikácie a príslušného cestného telesa v mieste zvláštneho užívania pozemnej komunikácie pred začiatkom uvedených prác a získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných objektov uvedenej stavby.

-Uloženie kanalizačného potrubia súbežne s cestnou komunikáciou číslo III/1885 bude mimo spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov, cestného pomocného pozemku a vo vzdialenosti minimálne 1.500 mm od hrany spevnenej krajnice.

-Vybúvaním uvedeného stavebného objektu nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie - cestná priekopa, svah, ..., cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie.

-Žiadame vykonať statické záťažové skúšky (PROCTOR STANDARD/STANDARD) certifikovaným laboratóriom za prítomnosti správcu komunikácie na únosnosť doplnených konštrukčných vrstiev vozovky v zmysle STN, EN v mieste výkopu ryhy, v prítomnosti zástupcu SC TSK, následne predložiť protokoly o tejto vykonanej skúške.

-Žiadame doložiť certifikáty o použitých a zabudovaných materiáloch v telese cestnej komunikácie.

-Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akékoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá v telese cestnej komunikácie zástupcovi SC TSK.

-Po ukončení prác je stavebník povinný teleso cestnej komunikácie dotknutého stavebnými prácami preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie – Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín (SC TSK).

-Stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o vydanie:

- povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – cesty III/1885, ktorým je uloženie kanalizačného potrubia (chráničky uvedenej stavby do telesa cesty pretláčaním, rozkopaním)

- určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia na cestnú komunikáciu III/1885, počas realizácie prác

- povolenia na čiastočnú uzávierku cesty III/1885.

20. Stavebník bude rešpektovať rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín č. KPUTN-2017/19131-5/75336 z 29. 09. 2017:

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník/investor povinný:

- a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
- b) podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ,
- c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu,
- d) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia, poskytnúť celkovú situáciu stavby,
- e) v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako aj torzá architektúr v priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásť krajskému pamiatkovému úradu a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude konzultovaný s KPÚ Trenčín,

- f) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhl. Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z. správneho orgánu a archeologickému ústavu,
 - g) lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil KPÚ Trenčín na 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu,
 - h) zoznam právnických osôb oprávnených na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín a na internetovej adrese www.pamiatky.sk, www.culture.gov.sk.
21. Stavebník bude rešpektovať stanovisko Slovenského pozemkového fondu č. SPFZ/2018/103400, SPFS/2018/17679 z 12. 11. 2018.
22. Stavba bude dokončená v termíne do 31. 12. 2025.
23. Po ukončení výstavby požiadať Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona.

B. Majetkové záležitosti:

Ide o vodnú stavbu, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch C-KN parcelné čísla: 3838, 1452/1, 1416/3, 1519/2, 1442/1, 628/1, 1337/8, 1417, 1436/1, 1414, 544, 1441, 7/6, 7/5, 7/2, 10/1, 10/2, 11, 13, 16, 21/2, 22/1, 25, 27, 30/2, 1422, 57/2, 138, 1408/2, 1409/5, 1409/1, 1440, 1430, 1426/1, 157, 1431, 1435, 1437/1, 1433/2, 1433/6, 1407/1, 1427/1, 1229/7, 1229/14, 1229/3, 1439, 1438/1, 3877, 2761, 2760, 2771, 2766, 2765, 2764, 2763, 3884, 2790/1, 2790/2, 2791/2, 3882, 3894, 3880, 3881, 3878,
E-KN parcelné čísla: 5, 138/1, 139/1, 140/1, 141/1, 1389, všetky v katastrálnom území Mníchova Lehota.

Toto stavebné povolenie neoprávňuje stavebníka k neoprávneným zásahom do práv iných osôb a preto práva z neho plynúce môže začať vykonávať len ak nedôjde k takýmto neoprávneným zásahom.

C. Námietky účastníkov konania:

Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v priebehu vodoprávneho konania, ktoré bolo začaté dňa 22. 01. 2019, vznesené žiadne pripomienky proti vydaniu vodoprávneho povolenia.

D. Všeobecné ustanovenia:

Neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia je projektová dokumentácia z 08/2018 vypracovaná Ing. Viera Fircová, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 5543 * 12, HYDROTEAM, spol. s r.o., Potočná 377/37, 900 84 Bálhoň, ktorej jedna sada sa potvrdená zasiela stavebníkovi a druhá sa ponecháva na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie - oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, pre potreby archivovania.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník, Obec Mníchova Lehota, 913 21 Mníchova Lehota 90, v zastúpení Ing. Pavlom Ježíkom, 913 21 Trenčianska Turná 544, podal dňa 22. 01. 2019 na Okresnom

úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie – oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, žiadosť o vydanie povolenia podľa § 26 vodného zákona na uskutočnenie vodnej stavby: „Kanalizácia obce Mníchova Lehota“.

Začatie vodoprávneho konania bolo oznámené listom z 13. 02. 2019, verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania a konania vo veci povolenia liniovej stavby.

Zároveň bolo nariadené ústne pojednávanie na deň 18. 03. 2019.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.

V zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona stokovú sieť verejnej kanalizácie na pozemkoch mimo zastavaného územia obce, v ktorých majú byť uložené kanalizačné potrubia, možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku. Oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V zmysle § 58 ods. 4 stavebného zákona stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania nezistil skutočností, ktoré by bránili povoleniu na uskutočnenie vodnej stavby. Preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli:

- žiadosť, doručená dňa 22. 01. 2019
- splnomocnenie na zastupovanie z 09. 08. 2017
- projektová dokumentácia z 08/2018
- kópie katastrálnej mapy
- výpis z LVč. 2668, 2146, 2058, 2639, 1134, 1, 630, 636, 1823, 1824, 1825, 1826, 165, 1507, 92, 15, 494, 1650, 1948, 111, 707, 706, 531, 100, 1778, 1256, 2234, 2922, 2197, 2309, 2861, 3181, 2862, 1, 228, v k. ú. Mníchova Lehota.
- rozhodnutie Obce Trenčianska Turná o umiestnenie stavby č. SÚ 1108/2017 – 003 IZ z 6. 11. 2017
- súhlas Obce Trenčianska Turná, č.j.: SÚ 342/2019-001 MT z 20. 03. 2019
- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, OSZP3, orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, č. OU-TN-OSZP3-2017/026510-002 SLI z 15. 08. 2017
- vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, Bratislava z 10. 08. 2017
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6611724498 z 31. 08. 2017
- vyjadrenie SPP-distribúcia, Mlynské nivy 44/4, 825 11 Bratislava, č. TD/NS/0612/2017/Ga z 08.09. 2017
- vyjadrenie Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s., Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín, č. 7678/2017 z 06. 09. 2017
- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, Pozemkového a lesného odboru, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, č. OU-TN-PLO-2017/028118-003 z 19. 09. 2017

- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ochrany prírody a krajiny, č. OU-TN-OSZP3-2017/026517-002 koz z 11. 08. 2017
- vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Piešťany, č. CS SVP OZ PN 7273/2017/2, CZ 28616/210/2017 z 19. 09. 2017
- vyjadrenie Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, č. SC/2018/3386 z 13. 11. 2018
- podmienky vyjadrenia Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č. TSK/2018/03319-2 z 22. 01. 2018
- rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trenčín č. KPUTN-2017/19131-5/75336 z 29. 09. 2017
- vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy, č. OU-TN-OSZP3-2017/028722-002 TKL z 08. 09. 2017
- stanovisko Slovenského pozemkového fondu č. SPFZ/2018/103400, SPFS/2018/17679 z 12. 11. 2018
- iné práva k pozemkom – zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 24 x
- zápisnica z ústneho pojednávania z 18. 03. 2019.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Verejná vyhláška musí byť vyvesená v súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, webovom sídle Okresného úradu Trenčín a obce Mníchova Lehota po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 02. 05. 2019

Zvesené dňa: 14. 05. 2019

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis:

Rozhodnutie sa doručí

Účastníci konania

1. Obec Mníchova Lehota, starosta obce, 913 21 Mníchova Lehota 90
2. Ing. Pavol Ježik, 913 21 Trenčianska Turná 544
3. Ing. Viera Fircová, Hydroteam, s.r.o., Strojnícka 61/A, 82105 Bratislava 2
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
6. Obec Mníchova Lehota, starosta obce - na vyvesenie verejnej vyhlášky ostatným účastníkom konania v k. ú. Mníchova Lehota:
7. COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, Mierové nám. 19, 912 50 Trenčín
8. Rímskokatolícka cirkev – farnosť Soblahov, Hlavná 212, Soblahov
9. Ľuboš Červeňan, 913 21 Mníchova Lehota 40
10. Anna Červeňanová, 913 21 Mníchova Lehota 40
11. Gabriela Lacová, 913 21 Mníchova Lehota 16
12. Ing. Stanislav Zverbík, 913 21 Mníchova Lehota 17
13. Ing. Janka Zverbíková, 913 21 Mníchova Lehota 17
14. Dominika Míňaroviechová, Sasinkova 2585/18, 911 01 Trenčín
15. Miroslav Míňaroviech, Sasinkova 2585/18, 911 01 Trenčín
16. Jozef Riedl, 913 21 Mníchova Lehota 33
17. Margita Danielová, M. R. Štefánika 186, Šaštín-Stráže
18. Marta Rochová, J Ružičky 1234/4, Kunratice, Praha 4
19. Katarína Riedlová, Bohrova 1204/3, Bratislava
20. Ľubica Ďurišová, Homolová 2907/10, Bratislava Dúbravka
21. Roman Vojtek, Námestie SNP 18/18, Rajec
22. Maroš Lobotka, Kožušnícka 88/15, 911 05 Trenčín
23. Janka Dettelbacher, Trautensteinstrasse, Holzhausen PSČ 46 15 Rakúsko
24. Ing. Štefan Balaj, 913 21 Mníchova Lehota 283
25. Anna Hanincová, 913 21 Mníchova Lehota 281
26. Gabriela Sadyová, 913 21 Mníchova Lehota 288
27. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11
28. Milan Halgoš, 913 21 Mníchova Lehota 348
29. Darina Urbanovská, 913 21 Mníchova Lehota 106
30. Stanislav Stehlík, 913 21 Mníchova Lehota 105
31. Viera Fraňová, 913 21 Mníchova Lehota 105
32. Mária Červeňanová, 913 21 Mníchova Lehota 313
33. Mária Hrnčárová (SPF)
34. Štefan Hrnčár (SPF)
35. Eva Balajová (SPF)
36. Jozef Halgoš (SPF)
37. Ján Hrnčár (SPF)
38. Jozef Hrnčár (SPF)
39. Alžbeta Červeňanová (zom.)
40. Ondrej Hrnčár (SPF)

41. Miroslav Hrnčár, 913 21 Mníchova Lehota 90
42. Alena Červeňanová, 913 21 Mníchova Lehota 58
43. Miroslav Červeňan, 913 21 Mníchova Lehota 93
44. Martin Červeňan, 913 21 Mníchova Lehota 93
45. Peter Laško, 913 21 Mníchova Lehota 99
46. Milan Laco, 913 21 Mníchova Lehota 96
47. Eva Lacová, 913 21 Mníchova Lehota 96
48. Ján Valach, Gen. Viesta 1669/38, 911 01 Trenčín
49. Miroslav Tarbus, Halalovka 2344/73, 911 08 Trenčín
50. Monika Tarabusová, Halalovka 2344/73, 911 08 Trenčín
51. Ing. Zuzana Valachová, M. Rázusa 1466/19, 911 01 Trenčín
52. Patrik Fabián, M. Rázusa 1471/26, 911 01 Trenčín
53. Ján Husár, 913 21 Mníchova Lehota 97
54. Ondrej Kohút (SPF)
55. Mária Kohútová (SPF)
56. Anna Kohútová (SPF)
57. Mária Červeňanová (SPF)
58. Pavol Červeňan (SPF)
59. Štefan Červeňan (SPF)
60. Anna Červeňanová (SPF)
61. Blažej Červeňan (SPF)
62. Michal Sijka, 913 21 Mníchova Lehota 94
63. Lenka Sijková, 913 21 Mníchova Lehota 94
64. Pavol Hrnčár, 913 21 Mníchova Lehota 100
65. Tomáš Daneš, 913 21 Mníchova Lehota 118
66. Michaela Danešová, 913 21 Mníchova Lehota 118
67. Radovan Pristach, 913 21 Mníchova Lehota 138
68. Ing. Mariana Pristachová, 913 21 Mníchova Lehota 138
69. Peter Kováč, 913 21 Mníchova Lehota 137
70. Angela Jurigová, 913 21 Mníchova Lehota 144
71. Jozef Belák, 913 21 Mníchova Lehota 44
72. Mária Kováčová, 913 21 Mníchova Lehota 49
73. Jozef Kováč, Soblahovská 1106/19, 911 01 Trenčín
74. Ján Kováč, K. Šmídkeho 2629/7, 911 08 Trenčín
75. Agnesa Janeková, Hlinská 10, 010 01 Žilina
76. Daniel Kováč, 913 21 Mníchova Lehota 265
77. Matilda Beláková, Narcisova 2, 911 01 Trenčín
78. Ján Bielik, 913 21 Mníchova Lehota 273
79. Ján Kováč (SPF)
80. Lucia Horníková, Kunterád 204, 913 13 Ražské Teplice
81. Slavomír Molnár, Snežienkova 638/44, 971 01 Prievidza
82. Dana Molnárová, Snežienkova 638/44, 971 01 Prievidza
83. Ivan Balaj, 913 21 Mníchova Lehota 351
84. Agnesa Beláková, Ján Belák (SPF)
85. Jozef Balaj, Mária Talianová (SPF)
86. Jozef Balaj, Mária Veselá (SPF)
87. Štefan Balaj (SPF)

- 88. Martin Laco, 913 21 Mníchova Lehota 280
- 89. Tatiana Lacová, 913 21 Mníchova Lehota 280
- 90. Miloslava Červeňanová, 913 21 Mníchova Lehota 93
- 91. Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava
- 92. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
- 93. vlastníci susedných nehnuteľností v zmysle priloženej situácie povoľovanej vodnej stavby

Dotknuté orgány

- 94. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
- 95. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 96. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
- 97. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- 98. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- 99. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, orgán OH, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
- 100. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, orgán OPaK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
- 101. Ministerstvo obrany, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- 102. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
- 103. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
- 104. Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
- 105. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín

Príloha č. 3:

Položkový rozpočet Diela vrátane Preambuly a Požiadaviek na
ocenenie a zahrnutie prác v jednotlivých položkách vo VV


BAUMANN WERK S.R.O.
SIL 26, Lohr
8207 07 250 708
o.s. 2020/10/10 č. 011 0020107 1107

Rekapitulácia

Stoka	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
A	420 990,44	84 198,09	505 188,53
A-1	163 327,21	32 665,44	195 992,65
A-1-1	25 672,96	5 134,59	30 807,55
A-2	54 473,26	10 894,65	65 367,91
A-2--1	73 389,60	14 677,92	88 067,52
B	356 133,84	71 226,77	427 360,61
B-1	44 831,19	8 966,24	53 797,43
Spolu	1 138 818,50	227 763,70	1 366 582,20

Odběratel:
Projektant:
Dokladatel: SAUBERMAN Nový s.r.o.

Stavba : Kanaalizační akce Město Liberec
Objekt : Větrná "A"

Ing. Ivan Novák

Popis položky, stavového čísla, množství	Nový rozpočet		
	Konstrukce	Specifikační materiál	Spolu

1 - ŽELEZNÉ PRÁCE	128 739,00	64 348,27	193 086,17
2 - ŽALUZIE	33 174,38	0,00	33 174,38
3 - ŽIVICE A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	320,00	0,00	320,00
4 - VODOVODNÉ KONSTRUKCE	3 347,80	0,00	3 347,80
5 - KOMBINACE	108 471,75	0,00	108 471,75
8 - PÍPŘÍME VEDENÍ	7 887,20	54 203,18	62 090,38
9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE	14 479,88	0,00	14 479,88
PRÁCE A DODÁVKY HŠV smlou.	206 421,12	118 548,45	454 970,57
			0,00
Všechny rovné množství - přímé	426,20	5 593,68	6 019,88
PRÁCE A DODÁVKY HŠV smlou.	426,20	5 593,68	6 019,88
			0,00
			0,00
Za rozpočet celkem	396 647,30	124 542,13	420 990,44

Obstaratel:
Fryziersalon
Cosmetica: EASYMAN NYS s.r.o.

Statut : Kancelářská a služební jednotka
Objekt : Věna "X"

Průběh rozpočtových ukazatelů v EUR

Pr.	Kód	Název položky	Průběh položky, charakteristika, množství, výklad výpočtu	Hodnoty rozpočtu					
				Nákladové výnosy	Měrná jednotka	Základová cena	Kumulace	Standardizovaný měřítko	Tržba

PRÁCE A DODÁVKY NYS

1 - ZEMNÍ PRÁCE

1		Výkop nové vodovodní kanalizace v tunu	0,61%	km	4 500,00	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50
2		Odstranění podkladu a jeho výkop z kámenů řád. hr. 100-200 mm, výš 200 m2	80% 30%	m2	1,00	800,00	800,00	0,00	800,00
3		Odstranění podkladu a jeho výkop z kámenů řád. hr. 100-200 mm, výš 200 m2	1 162,000	m2	1,38	1 603,56	1 603,56	0,00	1 603,56
4		Frezování dv. vykopu hr. do 3 cm	2 200,000	m2	1,42	2 217,67	2 217,67	0,00	2 217,67
5		Odstranění op. hr. do 2 m v tunu v 3 m2 1 500 m2 10 000 m2	2 807,310	m2	10,74	28 100,51	28 100,51	0,00	28 100,51
6		Průběh na výkopu tunu v 2 m výš 1 m do 200 m	2 807,310	m2	1,48	4 154,82	4 154,82	0,00	4 154,82
7		Průběh na výkopu v 1 m v 1,4 m, výš 500 m 800 m	12,240	m	485,00	5 936,40	5 936,40	0,00	5 936,40
8		Odstranění podkladu a jeho výkopu hr. do 4 m	4 788,720	m2	2,67	12 777,54	12 777,54	0,00	12 777,54
9		Odstranění podkladu a jeho výkopu hr. do 4 m	4 788,720	m2	1,58	7 571,76	7 571,76	0,00	7 571,76
10		Základ pro betonové stěny v 1,4 m2 1 m do 2,5 m	2 807,310	m2	1,10	3 088,04	3 088,04	0,00	3 088,04
11		Vodovodní přeměnovací výkop do 500 m tunu v 1,4 m	2 807,310	m2	6,43	17 406,38	17 406,38	0,00	17 406,38
12		Vodovodní výkop výš 100 m v tunu v 1,4 m	2 807,310	m2	1,78	4 997,01	4 997,01	0,00	4 997,01
13		Vodovodní výkop v 1,4 m	2 807,310	m2	3,40	9 605,29	9 605,29	0,00	9 605,29
14		Průběh na výkopu	2 807,310	m2	5,42	15 215,82	15 215,82	0,00	15 215,82
15		Základ pro betonové stěny v 1,4 m2 1 m do 2,5 m	2 807,310	m2	6,57	18 419,51	18 419,51	0,00	18 419,51
16		Odstranění podkladu a jeho výkopu hr. do 4 m	4 788,720	m2	23,27	110 678,60	110 678,60	0,00	110 678,60
17		Průběh na výkopu	4 788,720	m2	33,74	160 603,29	160 603,29	0,00	160 603,29
18		Průběh na výkopu	4 788,720	m2	27,00	128 882,96	128 882,96	0,00	128 882,96
19		Odstranění podkladu a jeho výkopu hr. do 4 m	4 788,720	m2	11,01	52 662,29	52 662,29	0,00	52 662,29
20		Odstranění podkladu a jeho výkopu hr. do 4 m	4 788,720	m2	34,00	162 801,68	162 801,68	0,00	162 801,68
21		Odstranění podkladu a jeho výkopu hr. do 4 m	4 788,720	m2	7,20	32 478,68	32 478,68	0,00	32 478,68

1 - ZEMNÍ PRÁCE NYS

22		Výkop stávkových stěn do výš 1 m v 1,4 m, výš 100 m, výš 100 m	60% 20%	km	48,01	23 174,38	23 174,38	0,00	23 174,38
----	--	--	---------	----	-------	-----------	-----------	------	-----------

2 - ZEMNÍ PRÁCE

23		Výkop stávkových stěn do výš 1 m v 1,4 m, výš 100 m, výš 100 m	60% 20%	km	48,01	23 174,38	23 174,38	0,00	23 174,38
----	--	--	---------	----	-------	-----------	-----------	------	-----------

Pg. list books		Pg. list books				
Pg. list books		Pg. list books				
Pg.	ISBN	Author	Title	Year	Language	Notes
1000	978-3-03-910714-9	John Doe	The Great Book of Knowledge	2020	English	1000

3-2016 A-1 COMPLETE COST IN LACS				
2)	Approximate estimated total with overhead & indirect expenses within	15.50	no	200.00
				200.00
				250.00

	2009	2008
2. FILL A COMPLETE CONTRACT WITH:		
a. 100,000	\$6.00	\$10.00

Variable	Estimated coefficient
Constant	0.00
Age	0.00
Gender	0.00
Marital status	0.00
Income	0.00
Education	0.00
Health	0.00
Religion	0.00
Occupation	0.00
Region	0.00
Time	0.00
Time squared	0.00
Time cubed	0.00
Time quart	0.00
Time quint	0.00
Time sext	0.00
Time sept	0.00
Time oct	0.00
Time non	0.00
Time dec	0.00
Time elev	0.00
Time hend	0.00
Time icad	0.00
Time jide	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	0.00
Time made	0.00
Time nade	0.00
Time oade	0.00
Time pade	0.00
Time qade	0.00
Time rade	0.00
Time sade	0.00
Time tade	0.00
Time uade	0.00
Time vade	0.00
Time wade	0.00
Time xade	0.00
Time yade	0.00
Time zade	0.00
Time aade	0.00
Time bade	0.00
Time cade	0.00
Time dade	0.00
Time eade	0.00
Time fade	0.00
Time gade	0.00
Time hade	0.00
Time iade	0.00
Time jade	0.00
Time kade	0.00
Time lade	

	(9)				
Labor paid outside country + overseas vehicle + per diem + telephone	\$6,150	\$75			
4. ACCORDING CONTRACTOR STATE:					
		(10)			
		\$3,847.80		\$3,847.80	
		\$3,847.80		\$3,847.80	
				\$769.60	

	Number of cases	% of total
Male	80	97.6%
Female	2	2.4%
Total	82	100%

[illegible]

26	Shaw, David A. 1992. <i>How much? UCLA Appendix B3.1, pp. 21-22</i>	1777/800	62	23.94	20.08/78	20.08/58
----	---	----------	----	-------	----------	----------

[illegible]

	χ^2 -test	χ^2 -test
1) comparison with	168.47/1.75	0.00
		0.00

8 - RUPORE VETENNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Modelo de trabalho 1 - trabalho em 2 turnos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

23	average gate voltage	28.000	ms	32.50	2.59730	2.60730
	8444 PTC detector (800 am, width: 1524, 76000)					

Modelo	Preço	Capacidade	Resolução	Velocidade
Modelo A	R\$ 1.200,00	16 GB	1080p	120 FPS
Modelo B	R\$ 1.500,00	32 GB	1440p	144 FPS
Modelo C	R\$ 1.800,00	64 GB	2160p	180 FPS

20	Edy kumandira po QN/200-2012 qon'qon, wadawa 31667/20000	kat	245.20	20 600.00	20 600.00
21	Qon'qon kumandira qon' qon' + 11667/2000	kat	64.98	1 675.96	1 675.96
22					

[illegible]

	1998	1999	2000	2001	2002
1. Total revenue (million dollars)	113,360	118,342	121,723	124,729	127,423
2. Total revenue (million dollars) excluding the 1998 revenue	113,360	118,342	121,723	124,729	127,423
3. Total revenue (million dollars) excluding the 1998 revenue and the 1999 revenue	113,360	118,342	121,723	124,729	127,423
4. Total revenue (million dollars) excluding the 1998 revenue and the 1999 revenue and the 2000 revenue	113,360	118,342	121,723	124,729	127,423
5. Total revenue (million dollars) excluding the 1998 revenue and the 1999 revenue and the 2000 revenue and the 2001 revenue	113,360	118,342	121,723	124,729	127,423
6. Total revenue (million dollars) excluding the 1998 revenue and the 1999 revenue and the 2000 revenue and the 2001 revenue and the 2002 revenue	113,360	118,342	121,723	124,729	127,423

8. ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME	7. 687.32	04/2015.18	62.090.00
--------------------------------	-----------	------------	-----------

3 - OBTENIR LE CONSTRUCTEUR A PRÉVOIR

36	Structure elucidated: bicyclic epox. ester produced by 40-50 min	96	4.05	4.48/18	4.66/24
37	Compound under test: benzene, propoxide	89.4/25	1.86	5.24/22	5.24/22

Year	Standardized rate of respiratory pneumonia	Standardized rate of pneumonia	Standardized rate of pneumonia
2000	1.00	2.00	2.00
2001	1.00	2.00	2.00
2002	1.00	2.00	2.00
2003	1.00	2.00	2.00
2004	1.00	2.00	2.00
2005	1.00	2.00	2.00
2006	1.00	2.00	2.00
2007	1.00	2.00	2.00
2008	1.00	2.00	2.00
2009	1.00	2.00	2.00
2010	1.00	2.00	2.00
2011	1.00	2.00	2.00
2012	1.00	2.00	2.00
2013	1.00	2.00	2.00
2014	1.00	2.00	2.00
2015	1.00	2.00	2.00
2016	1.00	2.00	2.00
2017	1.00	2.00	2.00
2018	1.00	2.00	2.00
2019	1.00	2.00	2.00
2020	1.00	2.00	2.00

Year	Number of female nurses, nonmanagement (thousands)	Number of female nurses, management (thousands)	Total (thousands)
1990	1,010	1,010	2,020
2000	1,010	1,010	2,020
2010	1,010	1,010	2,020
2020	1,010	1,010	2,020

[illegible]

Ing. Ivan Bouček		Prehľad rozpočtových nákladov v EUR					
		Nový rozpočet					
Príj.	Výd.	Príj. položky	Výd. položky	Nové príjmy	Nové výdavky	Nové príjmy	Nové výdavky
číslo	číslo			príjmy	výdavky	príjmy	výdavky
		Základná a Dodatočná hodnota					
				296 421,12	118 348,49	414 769,61	

product is not available in

Weekend travel available - 100% only

E1	Material property & dimensions for S20 x 8	12,249	426.25	426.25
E2	Keyway material S20 x 8	34.92		5,593.66
E3	Keyway material S20 x 8	29,736		5,593.66

Webb, J. 1999. *How to write a research paper*. New York: McGraw-Hill.

IMPLICIT & EXPLICIT INSTRUCTION

The research design

924 443.93 428 590.44

Odběratel:
Projektant:
Odběratel: BAUWANN s.r.o.

Stavba: Naučná železnice Bratříků Letavů
Objekt: Vozna "A-1"

Ing. Ivan Novák

Průběh práce, standardní díla, množství	Nový rozpočet		
	Kapitál	Specifický materiál	Spolu
1. ŽELEZNÉ PRÁCE	42 127,27	16 503,42	62 068,29
2. ZÁKLADY	18 844,34	0,00	18 844,34
3. ŽELEZÁ A KOPLETNÉ KONSTRUKCE	48,10	0,00	48,10
4. VODOVODNÉ KONSTRUKCE	1 320,12	0,00	1 320,12
5. KOPLETNÉ KONSTRUKCE	33 262,31	0,00	33 262,31
6. KOPLETNÉ KONSTRUKCE	16 423,14	11 961,36	28 384,50
7. KOPLETNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	4 423,58	0,00	4 423,58
PRÁCE A DODÁVKY HSY 3000	179 502,95	26 891,78	148 144,73
Všechny náklady včetně - přímých PRÁCE A DODÁVKY HSY 3000	1 923,60	13 828,82	14 802,47
Za materiál celkem	125 606,60	42 720,60	143 327,20

Obstarávateľ:
Projektant:
Dodávateľ: BAU-MANN spol. s r.o.

Stavba : Kancelária spoločnosti Michala Lešocha
Objekt : Veža "A.1"

Ing. Ivan Novák

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Název položky	Popis položky, charakteristika, jednotka, výkaz výkony	Návrh rozpočtu				
			Stručná výmera	Strana položka	Jednotková cena	Kumulovaný náklad	Spolu

PRÍLOHA A.0000000000000000

1. ZLOŽENIE PRÍLOHY

1	Výpočet ceny vkladu, kumulácia a celok		0,236	140	4 500,00	1 062,00	1 062,00
2	Obstarávanie materiálu a práce z kumulácie 140, 100 000 mm, nad 200 mm		323,500	40	1,00	323,50	323,50
3	Obstarávanie materiálu a práce z kumulácie 140, 100 000 mm, nad 200 mm		1 000,500	40	1,30	1 300,50	1 300,50
4	Pracovná 24, 140, 100 000 mm		0,000	40	1,40	0,00	0,00
5	Hodnoty vlny 140, 100 000 mm, 140 000 mm, 140 000 mm		729,500	40	10,74	7 634,30	7 634,30
6	Pracovná 140, 100 000 mm, 140 000 mm, 140 000 mm		729,500	40	1,40	1 019,90	1 019,90
7	Pracovná 140, 100 000 mm, 140 000 mm, 140 000 mm		18,700	40	400,00	7 634,30	7 634,30
8	Obstarávanie materiálu a práce z kumulácie 140, 100 000 mm, nad 200 mm		1 300,500	40	1,30	1 694,80	1 694,80
9	Pracovná 140, 100 000 mm, 140 000 mm, 140 000 mm		729,500	40	1,40	1 019,90	1 019,90
10	Pracovná 140, 100 000 mm, 140 000 mm, 140 000 mm		729,500	40	1,40	1 019,90	1 019,90
11	Pracovná 140, 100 000 mm, 140 000 mm, 140 000 mm		729,500	40	1,40	1 019,90	1 019,90
12	Pracovná 140, 100 000 mm, 140 000 mm, 140 000 mm		729,500	40	1,40	1 019,90	1 019,90
13	Pracovná 140, 100 000 mm, 140 000 mm, 140 000 mm		729,500	40	1,40	1 019,90	1 019,90
14	Pracovná 140, 100 000 mm, 140 000 mm, 140 000 mm		729,500	40	1,40	1 019,90	1 019,90
15	Pracovná 140, 100 000 mm, 140 000 mm, 140 000 mm		729,500	40	1,40	1 019,90	1 019,90
16	Pracovná 140, 100 000 mm, 140 000 mm, 140 000 mm		729,500	40	1,40	1 019,90	1 019,90
17	Pracovná 140, 100 000 mm, 140 000 mm, 140 000 mm		729,500	40	1,40	1 019,90	1 019,90
18	Pracovná 140, 100 000 mm, 140 000 mm, 140 000 mm		729,500	40	1,40	1 019,90	1 019,90
19	Pracovná 140, 100 000 mm, 140 000 mm, 140 000 mm		729,500	40	1,40	1 019,90	1 019,90
20	Pracovná 140, 100 000 mm, 140 000 mm, 140 000 mm		729,500	40	1,40	1 019,90	1 019,90
21	Pracovná 140, 100 000 mm, 140 000 mm, 140 000 mm		729,500	40	1,40	1 019,90	1 019,90

1. ZLOŽENIE PRÍLOHY

2. ZÁKLADY

Výsledok základov: 20 000, 140, 100 000 mm, nad 200 mm, 140 000 mm, 140 000 mm

200,110

40

40,01

16 944,34

16 944,34

Pos. číslo	Kód položky	Popis položky, standardní data, množství, výklad výpočtu	Nový rozpočet						
			Množství výpočet	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukční množství	Specifický materiál	Spolu	
3 - ZVLÁŠTĚ A KOMPLETELNÍ KONSTRUKCE			18 844,84						
23		Výpočet uvolněných částí mezi střešnicí a podlahou střešního systému	0,236	m ²	208,04	49,10		0,23	18 844,84
3 - ZVLÁŠTĚ A KOMPLETELNÍ KONSTRUKCE			48,10						
24		4 - VODODILOVNÍ KONSTRUKCE	34,146	m ²	39,00	1 326,12	0,20	0,20	48,10
4 - VODODILOVNÍ KONSTRUKCE			0,20						
25		1 - KOMPANOVÁNÍ	201,718	m ²	27,57	10 706,66		0,20	10 706,66
26		2 - KOMPANOVÁNÍ	504,578	m ²	26,54	13 389,27		0,20	13 389,27
27		3 - KOMPANOVÁNÍ	504,578	m ²	19,57	9 879,59		0,20	9 879,59
4 - KOMPANOVÁNÍ			33 202,31						
28		4 - KOMPANOVÁNÍ	50,878	m	4,30	449,79		0,20	449,79
29		5 - KOMPANOVÁNÍ	20,008	m	52,20	1 044,00		0,20	1 044,00
30		6 - KOMPANOVÁNÍ	226,878	m	17,46	3 960,36		0,20	3 960,36
31		7 - KOMPANOVÁNÍ	48,000	m	279,00	13 302,00		0,20	13 302,00
32		8 - KOMPANOVÁNÍ	12,000	m	44,78	537,36		0,20	537,36
33		9 - KOMPANOVÁNÍ	66,878	m	2,73	182,54		0,20	182,54
34		10 - KOMPANOVÁNÍ	226,878	m	4,30	974,16		0,20	974,16
35		11 - KOMPANOVÁNÍ	10,000	m	1 149,00	11 490,00		0,20	11 490,00
12 - KOMPANOVÁNÍ			16 423,14						
13 - KOMPANOVÁNÍ			17 861,36						
14 - KOMPANOVÁNÍ			28 204,28						
15 - KOMPANOVÁNÍ			4,00						
16 - KOMPANOVÁNÍ			1 446,55						
17 - KOMPANOVÁNÍ			129,00						

[illegible]

Odberteľ:
Projektant:
Dopraviteľ: BAUMANN Nova s.r.o.

Stavba : Kúpeľňa obce Mníchovská Lúčka
Objekt : Vlna "A-1-1"

Ing. Ivan Novák

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Práca podľa: zariadenia domu, terasu	Konštrukcie	Spoločný materiál	Spolu
1 - ZDANÉ PRÁCE	13 204,20	2 578,71	15 802,91
4 - VÝCHOVNE KONŠTRUKCIE	404,12	0,00	404,12
8 - NÁJDNÉ VEDENIA	5 008,24	4 035,26	9 043,50
8 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	224,23	8,00	232,23
PRÁCE A DODÁVKY HEV spol.	19 081,99	6 618,97	25 672,96

Za rozpočet celkom

19 081,99

6 618,97

25 672,96

Odběratel:
Příjemce:
Dodavatel: SÚS/MISK spol. s r.o.

Společnost:
JAKO:
Datum: 17.01.2023

Stavba: Kanaalizační systém
Objekt: Větrná "A-S-1"

KONKRETNÍ

Pos. číslo	Kód položky	Popis položky, standardní jednotka, množství	Stručná výměra	Stručná jednotka	Konstrukce	Specifický název	Spolu
------------	-------------	--	----------------	------------------	------------	------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY

1. ZEMNÍ PRÁCE

1		Výkopové práce, kanalizační systém	8,034	m	4 500,00	361,50	361,50
2		výkopové práce, kanalizační systém	242,000	m	15,18	3 680,39	3 680,39
3		výkopové práce, kanalizační systém	242,000	m	1,48	368,19	368,19
4		výkopové práce, kanalizační systém	448,040	m	2,67	1 198,91	1 198,91
5		výkopové práce, kanalizační systém	448,040	m	1,58	708,47	708,47
6		výkopové práce, kanalizační systém	242,000	m	1,10	266,27	266,27
7		výkopové práce, kanalizační systém	242,000	m	2,09	505,82	505,82
8		výkopové práce, kanalizační systém	242,000	m	1,79	400,88	400,88
9		výkopové práce, kanalizační systém	76,340	m	0,40	30,35	30,35
10		výkopové práce, kanalizační systém	76,340	m	0,82	413,19	413,19
11		výkopové práce, kanalizační systém	140,340	m	4,51	646,59	646,59
12		výkopové práce, kanalizační systém	76,340	m	21,27	1 618,43	1 618,43
13		výkopové práce, kanalizační systém	76,340	m	22,74	2 519,71	2 519,71
14		výkopové práce, kanalizační systém	76,340	m	11,91	845,30	845,30
15		výkopové práce, kanalizační systém	76,340	m	24,06	2 400,14	2 400,14
16		výkopové práce, kanalizační systém	76,340	m	7,25	503,47	503,47
1. ZEMNÍ PRÁCE			15 860,01		13 284,30	2 575,71	15 860,01

4. VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE

17		výkopové práce, kanalizační systém	12,740	m	38,00	484,72	484,72
4. VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE			484,72		484,72	484,72	484,72

8. KANALIZAČNÍ SYSTÉM

18		Kanalizační systém, kanalizační systém	42,000	m	4,50	189,00	189,00
19		Kanalizační systém, kanalizační systém	9,000	m	50,50	454,50	454,50
20		Kanalizační systém, kanalizační systém	21,800	m	11,46	250,75	250,75
21		Kanalizační systém, kanalizační systém	71,000	m	270,00	1 917,00	1 917,00

Objektant:
Projektant:
Dělníci: BAUMANN NOVÝ s.r.o.

Stavba: Kancelářská obec Město Lázně
Objekt: Větrná "A-2"

Ing. Ivan Novák

Práci poskytl, stanovuje cena, jednotka	Nový rozpočet		
	Konstrukce	Společný materiál	Spolu

1 - ZEMNÍ PRÁCE	13 063,33	6 530,82	19 594,15
2 - ZAKLADY	6 371,30	0,00	6 371,30
4 - VODOVODNÉ KONSTRUKCE	481,34	0,00	481,34
5 - KANALIZACE	15 079,95	0,00	15 079,95
8 - KUPONÉ VEDENÍ	5 303,96	4 098,82	9 402,78
8 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE	2 887,04	0,00	2 887,04
PRÁCE A DODÁVKY VEŠT. SPOL.	43 242,52	11 230,74	54 473,26

Za rozpočet celkem	43 242,52	11 230,74	54 473,26
--------------------	-----------	-----------	-----------

Odběratel:
Projektant:
Dovozce: BALMANN s.r.o.

Stavba : Kvalitativní studie Strážnice Lázeň
Objekt : Věna "A.2"

Ing. Ivan Štecl

Pr. číslo	Kód položky mno	Popis položky, standardní jedn. měření, výklad výraz	Nový rozpočet				
			Množství výraz	Množ. jednotka	Jednotková cena	Kumulované surovatinové	Surovatinový materiál

PRÁCE A DOČASNÝ NÁV

1 - ŽIVÉ PRÁCE

1		Výkopové díry souběžné, kardinální v ústí	0,000	m	4 100,00	400,00	400,00
2		Obtavení podkladu stěny výkopu s kardinální tl. 100-200 mm, do 200 m2	100,000	m2	5,00	500,00	500,00
3		Obtavení podkladu stěny výkopu železných tl. do 50 mm, nad 200 m2	0,000	m2	1,00	0,00	0,00
4		Obtavení 2m výkopu tl. do 5 cm	0,000	m2	1,42	0,00	0,00
5		Obtavení výkopu do 7 m v hloubce 1-2 m nad 200 m2	245,700	m2	10,74	2 638,80	2 638,80
6		Obtavení výkopu do 7 m v hloubce 1-2 m nad 200 m2	245,700	m2	1,00	245,70	2 884,50
7		Obtavení výkopu do 7 m v hloubce 1-2 m nad 200 m2	448,700	m2	2,87	1 289,77	4 174,27
8		Obtavení výkopu do 7 m v hloubce 1-2 m nad 200 m2	448,700	m2	1,00	448,70	4 622,97
9		Obtavení výkopu do 7 m v hloubce 1-2 m nad 200 m2	245,700	m2	1,10	270,27	4 893,24
10		Obtavení výkopu do 7 m v hloubce 1-2 m nad 200 m2	245,700	m2	4,42	1 086,40	5 979,64
11		Obtavení výkopu do 7 m v hloubce 1-2 m nad 200 m2	245,700	m2	1,79	439,70	6 419,34
12		Obtavení výkopu do 7 m v hloubce 1-2 m nad 200 m2	245,700	m2	0,00	0,00	6 419,34
13		Obtavení výkopu do 7 m v hloubce 1-2 m nad 200 m2	245,700	m2	0,00	0,00	6 419,34
14		Obtavení výkopu do 7 m v hloubce 1-2 m nad 200 m2	245,700	m2	0,00	0,00	6 419,34
15		Obtavení výkopu do 7 m v hloubce 1-2 m nad 200 m2	245,700	m2	0,00	0,00	6 419,34
16		Obtavení výkopu do 7 m v hloubce 1-2 m nad 200 m2	245,700	m2	0,00	0,00	6 419,34
17		Obtavení výkopu do 7 m v hloubce 1-2 m nad 200 m2	245,700	m2	0,00	0,00	6 419,34
18		Obtavení výkopu do 7 m v hloubce 1-2 m nad 200 m2	245,700	m2	0,00	0,00	6 419,34
19		Obtavení výkopu do 7 m v hloubce 1-2 m nad 200 m2	245,700	m2	0,00	0,00	6 419,34
20		Obtavení výkopu do 7 m v hloubce 1-2 m nad 200 m2	245,700	m2	0,00	0,00	6 419,34

1 - ŽIVÉ PRÁCE, spolu

2 - ŽIVÉ PRÁCE

0,00

Pos. číslo	Kód mno	Kód položky	Popis položky, charakteristika zboží, specifikace, výběr option	Název skupiny						
				Strukturální skupina	Materiál jednotka	Jednotková cena	Kumulativní	Specifikační tabulka	Spolu	
25			Výška základového bloku ze ztv. smtl (KAL) průměr otvor 60 mm, výšok 60 a 120x120 mm	120.000	kus	49.37	6.371.30		6.371.30	
			3 - Zlakový spolek				6.371.30	0.00	6.371.30	0.00
			4 - VODODÍKOVÉ KONSTRUKCE				491.34	0.00	491.34	0.00
27			Lištní pod patinu, smtl v tloušťce výškov 2, proužek a tloušťka	12.000	m3	20.00	491.34		491.34	0.00
			4 - VODODÍKOVÉ KONSTRUKCE, spolek				491.34	0.00	491.34	0.00
			5 - KOKOSOVÉ				491.34	0.00	491.34	0.00
28			Podklad z proužek tloušťka 10, 12x15 mm 200 mm	177.000	m2	27.57	4.887.87		4.887.87	0.00
29			Smrti smtl v 1 AC 16 (KAL) 3 smtl, smtl KAL (KAL) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	228.000	m2	25.54	0.846.17		0.846.17	0.00
30			Smrti smtl v 1 AC 11 (KAL) 3 smtl, smtl KAL (KAL) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	228.000	m2	18.87	4.342.73		4.342.73	0.00
			5 - KOKOSOVÉ				491.34	0.00	491.34	0.00
			8 - KALOVÉ VEDENÍ				491.34	0.00	491.34	0.00
31			Smrti smtl v 1 AC 11 (KAL) 3 smtl, smtl KAL (KAL) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	18.000	m	4.50	0.810		0.810	0.00
32			Smrti smtl v 1 AC 11 (KAL) 3 smtl, smtl KAL (KAL) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	4.000	m	25.20	220.80		220.80	0.00
33			Smrti smtl v 1 AC 11 (KAL) 3 smtl, smtl KAL (KAL) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	98.000	m	11.86	1.164.28		1.164.28	0.00
34			Smrti smtl v 1 AC 11 (KAL) 3 smtl, smtl KAL (KAL) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	20.000	m	21.80	4.360.00		4.360.00	0.00
35			Smrti smtl v 1 AC 11 (KAL) 3 smtl, smtl KAL (KAL) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	4.000	m	44.78	179.12		179.12	0.00
36			Smrti smtl v 1 AC 11 (KAL) 3 smtl, smtl KAL (KAL) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	18.000	m	2.73	49.14		49.14	0.00
37			Smrti smtl v 1 AC 11 (KAL) 3 smtl, smtl KAL (KAL) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	98.000	m	6.52	643.96		643.96	0.00
38			Smrti smtl v 1 AC 11 (KAL) 3 smtl, smtl KAL (KAL) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	3.000	m	1.84.40	5.532.00		5.532.00	0.00
			8 - KALOVÉ VEDENÍ, spolek				5.532.00	4.880.00	10.412.00	0.00
			5 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				4.880.00		4.880.00	0.00
39			Smrti smtl v 1 AC 11 (KAL) 3 smtl, smtl KAL (KAL) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	598.000	m	4.50	2.691.00		2.691.00	0.00
40			Smrti smtl v 1 AC 11 (KAL) 3 smtl, smtl KAL (KAL) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	502.700	m	5.96	3.007.80		3.007.80	0.00
41			Smrti smtl v 1 AC 11 (KAL) 3 smtl, smtl KAL (KAL) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	502.700	m	2.90	1.458.20		1.458.20	0.00
42			Smrti smtl v 1 AC 11 (KAL) 3 smtl, smtl KAL (KAL) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	128.000	m	1.40	179.20		179.20	0.00

Fig. date	Kilg possibly over	Figs possibly, standardize both, summarize over	New material								
			Shedding system	Shed possibly	Antennal sens.	Karsthaus material	Spine material	Spine			
S - CRITIC KONG/SHENGE & POLICE spm.								2 887.24	0.00	2 887.24	0.00
POLICE & DOCKWY HOY spm.								43 242.52	11 238.78	54 473.28	0.00
2x respedal sarban								43 242.52	11 238.78	54 473.28	0.00

Odběratel:
Projektant:
Dodavatel: BAUWANN Nitra s.r.o.

Stavba: Kancelárie mesta Bielehoša (LHNS)
Objekt: Věňa "A,2,1"

Ing. Ivan Kováč

Popis položky: standardní stla, emenda	Nový rozpočet		
	Konstrukce	Specifikace množství	Stavba

1 - ZEDNÉ PRÁCE	18 037,50	8 471,47	26 508,97
2 - ZÁKLADY	7 900,43	0,00	7 900,43
4 - VODOVODNÉ KONSTRUKCE	840,94	0,00	840,94
5 - KANALIZACE	21 250,15	0,00	21 250,15
8 - RÚROVNÉ VEDENIA	7 314,57	8 790,94	16 105,51
9 - OSTATNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	2 750,00	0,00	2 750,00
PRÁCE A DODÁVKY MSV (MSV)	56 122,57	15 267,03	71 389,60

23 - rozpočet celkom:	56 122,57	15 267,03	71 389,60
-----------------------	-----------	-----------	-----------

Obdobie:
Projektant:
Zodpoved' SAUKHART MORA s.r.o.

Stavba : Kanaľizácia obce Štebná Lúčka
Objekt : Vetro 74.2.17

Ing. Ivan Novák

Por. číslo	Název	Množstvo	Jednotka	Náklady				Spolu
				Material	Práca	Podpora	Príloha	

PRÍLOHA A - DODANÉ MS

1. ZŠKADENIE PRÍLOHY

1	Výroba trupu vodovodu, kanalizácie z tvrdého betónu	119,250	m	4 500,00	508,70			5 008,70
2	Odstránenie poškodeného betónu z kanalizácie 100 mm, 150, 200 mm, 40, 200 mm	119,250	m	5,86	1 003,87			1 009,73
3	Odstránenie poškodeného betónu z vývodu z betónu 100 mm, 150, 200 mm	600,000	m	1,26	697,00			698,26
4	Frezovanie betónu 100 mm do 5 cm	0,000	m	1,43	0,00			0,00
5	Odstránenie betónu 100 mm do 2 m v tvrdosti 100 mm	200,000	m	30,78	2 502,16			2 532,94
6	Príprava 100 mm betónu 100 mm v tvrdosti 100 mm	200,000	m	1,46	488,12			489,58
7	Príprava betónu 100 mm v tvrdosti 100 mm	604,380	m	2,67	1 633,56			1 636,23
8	Odstránenie poškodeného betónu z vývodu z betónu 100 mm	604,380	m	1,46	883,46			884,92
9	Príprava betónu 100 mm v tvrdosti 100 mm	200,000	m	1,15	202,79			203,94
10	Výroba trupu vodovodu, kanalizácie z tvrdého betónu 100 mm, 150, 200 mm	200,000	m	4,43	1 407,06			1 411,49
11	Výroba trupu vodovodu, kanalizácie z tvrdého betónu 100 mm, 150, 200 mm	200,000	m	1,18	387,06			388,24
12	Príprava betónu 100 mm v tvrdosti 100 mm	200,000	m	0,45	148,47			148,92
13	Príprava betónu 100 mm v tvrdosti 100 mm	200,000	m	5,42	1 787,37			1 792,79
14	Príprava betónu 100 mm v tvrdosti 100 mm	172,450	m	4,57	788,10			792,67
15	Príprava betónu 100 mm v tvrdosti 100 mm	113,080	m	23,27	2 631,37			2 654,64
16	Príprava betónu 100 mm v tvrdosti 100 mm	113,080	m	23,29	2 631,37			2 654,66
17	Príprava betónu 100 mm v tvrdosti 100 mm	172,450	m	27,09	1 280,87			1 298,06
18	Príprava betónu 100 mm v tvrdosti 100 mm	113,080	m	11,01	1 280,87			1 291,88
19	Príprava betónu 100 mm v tvrdosti 100 mm	0,000	m	24,06	0,00			0,00
20	Príprava betónu 100 mm v tvrdosti 100 mm	0,000	m	7,25	0,00			0,00

1. ZŠKADENIE PRÍLOHY

2. ZŠKADENIE

[illegible]

Odběratel:

Projektant:

Dodavatel: BAUMANN BROS s.r.o.

Stavba: Kanalizace obce Mladá Lhota

Objekt: Vlna "B"

Ing. Ivan Novák

Práce položky, stavby, práce, materiál	Nový rozpočet		
	Konstrukce	Specifický materiál	Spolu

1. ZEMNÍ PRÁCE

2. ŽALUZY

3. ŽLITELNÉ KONSTRUKCE

4. VODOVODNÉ KONSTRUKCE

5. KANALIZACE

6. PŘÍKOPNÉ VEDENÍ

7. OSTATNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

PRÁCE A DODÁVKY NOVÉHO

Officer:
 Preceptor:
 Coordinator: **BALLMAN** room 416

Studio : Kawahara & Associates Labors
 Artists : Yuma "Y"

100

[illegible]

PRODUCT A is available with

4. Training policy

1	Wyróżnienie klasy wyrobów, konstrukcji w oparciu	8,000	nr1	4 500,00	2 817,00	2 817,00
2	Obciążenie konstrukcji anten krytych z numerami 1-12, 14, 150, 200 mm, nad 200 m2	207,540	nr2	1,00	403,67	403,67
3	Obciążenie konstrukcji anten krytych (zestawiać w: do 50 mm, nad 200 m2)	1 285,000	nr2	1,38	1 917,38	1 917,38
4	Pręgurowanie 2m, krytych, w: do 5 cm	8,000	nr2	1,43	0,00	0,00
5	Obciążenie oprawy z promieniami 00, 50, 10	211,613	nr3	1,26	274,27	274,27
6	Obciążenie 0m (zestawiać w: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000)	2 214,500	nr3	11,14	24 868,37	24 868,37
7	Pręgurowanie 2m (zestawiać w: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000)	2 214,500	nr3	1,48	3 423,51	3 423,51
8	Pręgurowanie 2m (zestawiać w: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000)	20,200	nr	400,30	14 104,18	14 104,18
9	Obciążenie konstrukcji anten krytych (zestawiać w: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000)	4 225,070	nr2	2,67	11 243,24	11 243,24
10	Obciążenie konstrukcji anten krytych (zestawiać w: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000)	4 225,070	nr2	1,88	7 983,07	7 983,07
11	Zestawienie promieniowania krytych (zestawiać w: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000)	2 214,500	nr3	1,19	2 646,07	2 646,07
12	Obciążenie konstrukcji anten krytych (zestawiać w: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30,					

1. **THESE PEOPLE ARE**

[illegible]

Pr. číslo	Kód	Název položky	Popis položky, standardní jednotka měření, jednotka výpočtu	Náklady na materiál						Spolu
				Skutečné výnosy	Standardní jednotka	Jednotlivá cena	Kumulované	Společenské	Spolu	
38			Skutečné výnosy kumulované jednotka 200 Kč do 200 Kč	200,000	m	2,73	546,00		546,00	
39			Skutečné výnosy kumulované jednotka 200 Kč do 200 Kč	200,000	m	6,50	1 300,00		1 300,00	
40			Skutečné výnosy kumulované jednotka 200 Kč do 200 Kč	12,000	kg	1 548,37	18 580,44		18 580,44	
B - ROZLIŠOVACÍ SYSTÉMY										
							24 329,44	32 777,48	47 098,92	
B - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE										
41			Práce na výstavbě budovy, výstavba podlaží, výstavba podlaží, výstavba podlaží	442,100	m	4,05	1 790,61		1 790,61	
42			Práce na výstavbě budovy, výstavba podlaží, výstavba podlaží	146,000	m	6,46	943,23		943,23	
43			Práce na výstavbě budovy, výstavba podlaží, výstavba podlaží	150,000	m	7,20	1 080,00		1 080,00	
44			Práce na výstavbě budovy, výstavba podlaží, výstavba podlaží	4 127,897	m	1,42	5 861,61	0,00	5 861,61	
B - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE										
							246 420,12	96 575,67	342 995,79	
PRÁCE A DOPLNĚNÍ										
Všechny ostatní práce										
45			Práce na výstavbě budovy, výstavba podlaží, výstavba podlaží	24,250	m	34,82	844,03		844,03	
46			Práce na výstavbě budovy, výstavba podlaží, výstavba podlaží	25,200	m	407,08	10 258,42		10 258,42	
Všechny ostatní práce										
							1 078,45	13 371,82	14 450,27	
PRÁCE A DOPLNĚNÍ										
							1 078,45	13 371,82	14 450,27	
Za všechny práce										
							246 444,56	109 646,49	356 091,05	

Odběratel:
Projektant:
Dělníci: BAUMANN NERO s.r.o.

Stavba: Kancelářská věž Brno - Jihlava
Objekt: Věže "B-F"

Ing. Ivan Novák

Typy prací, stavěných děl, prací	Nový rozpočet		
	Konstrukce	Stavební materiál	Spolu

1 - ŽELEZNÉ PRÁCE	14 800,92	7 487,97	22 288,89
2 - ŽALUZIE	882,78	0,00	882,78
3 - ŽALUZIE A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	289,27	0,00	289,27
4 - VODOVODNÉ KONSTRUKCE	617,88	0,00	617,88
5 - KOMBINOVANÉ	2 201,33	0,00	2 201,33
6 - RÚROVÉ VEDENÍ	6 087,96	5 785,34	11 873,30
8 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE	926,56	0,00	926,56
PRÁCE A DODÁVKY VEŠT. SPOL.	26 496,39	13 267,31	39 763,70

272 - Vědná práce - přílohy	282,89	4 787,70	5 070,59
PRÁCE A DODÁVKY VEŠT. SPOL.	282,89	4 787,70	5 070,59

28 - rozpočet celkem	26 876,79	17 054,61	43 931,40
----------------------	-----------	-----------	-----------

Odbiorca:
Przebiegni
Dostawca: BUDIMANN s.p. z o.o.

Stacja : Kanałizacja szara Wrocław-Lubów
Opis: V=100 m³

Wzrost: 100 cm

Pos. Data	Kod miej	Nazwa posady	Przebiegni: szerokość dna, szerokość wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm					
				Wzrost: wzrost	Wzrost: jednostka	Wzrost: miej	Wzrost: miej	Wzrost: miej	Wzrost: miej

PRACE A DODAWKI

1 - ZESTAW PRAC

1	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
2	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
3	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
4	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
5	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
6	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
7	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
8	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
9	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
10	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
11	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
12	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
13	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
14	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
15	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
16	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
17	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
18	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
19	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm
20	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm	Wzrost: 100 cm

1 - ZESTAW PRAC

2 - ZESTAW PRAC

Prí- číslo	Kód stavu	Kód položky	Popis položky, charakteru stavu, množstva, výšku opotre- by	Nový výpočet					
				Skutočné výdavky	Skutočné množstvo	zdrojová stavu	Kurzovník	Skutočnosť množstva	Spolu
21			Výška ziskových bonusov zo zisku súdiu Kúdel, primeru 8700 Kč/m, výška súdiu 1000 Kč/m	18.000	Kč	49,07	882,18	0,00	882,18
2 - ZISKOVÝ SPOLU									
3 - ZISKOVÝ A KOMPENZATÍVNY KONTROLNÝ									
22			Výdavky vynajímavých bonusov medzi ziskovými a ziskovými kontrolnými výdavkami	1.204	Kč	208,09	250,27	0,00	250,27
3 - ZISKOVÝ A KOMPENZATÍVNY KONTROLNÝ SPOLU									
4 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
23			Labor pod kontrolou, stav v dôstojnom výške z postu a stavu	18.200	Kč	38,08	671,86	0,00	671,86
4 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ SPOLU									
5 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
24			Príjem z postu stavu v C 1215 W 200 mm	25.000	Kč	37,52	789,79	0,00	789,79
25			Príjem z stavu v C 1215 W 200 mm	25.000	Kč	25,54	638,54	0,00	638,54
26			Príjem z stavu v C 1215 W 200 mm	25.000	Kč	18,57	459,25	0,00	459,25
5 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ SPOLU									
6 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
27			Príjem z stavu z karanténnych sú z PVC v ekonomickom výške do 20% DN 150, bezpečnosť stavu	25.000	Kč	4,50	112,50	0,00	112,50
28			Príjem PVC karanténnych sú z PVC, výška 1500 / 14000	5.000	Kč	35,25	276,30	0,00	276,30
29			Príjem z stavu z karanténnych sú z PVC DN150 v ekonomickom výške do 20%	104.000	Kč	11,46	1.421,84	0,00	1.421,84
30			Príjem karanténnych sú z PVC DN150 v ekonomickom výške do 20%	25.000	Kč	211,00	5.275,00	0,00	5.275,00
31			Príjem karanténnych sú z PVC DN150	3.000	Kč	44,78	134,34	0,00	134,34
32			Príjem karanténnych stavu DN do 200 mm	25.000	Kč	2,73	68,26	0,00	68,26
33			Príjem karanténnych stavu DN 200 mm	124.000	Kč	6,52	808,48	0,00	808,48
34			Príjem karanténnych stavu DN 200 mm	4.000	Kč	1.940,52	7.764,34	0,00	7.764,34
6 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ SPOLU									
7 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
8 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
9 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
10 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
11 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
12 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
13 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
14 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
15 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
16 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
17 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
18 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
19 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
20 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
21 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
22 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
23 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
24 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
25 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
26 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
27 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
28 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
29 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
30 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
31 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
32 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
33 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									
34 - KONTROLNÝ KONTROLNÝ									

[illegible]

Príloha č. 4:

Požiadavky objednávateľa na Dokumentáciu zhotoviteľa, súvisiacu
inžiniersku činnosť a skúšky


BAUMANHOLDING s.r.o. Lakšná 608
054 36 Lakšná
IČO: 47 343 788
DIČ: 20204187, IČ DPH: SK20204187

**Požiadavky objednávateľa na dokumentáciu zhotoviteľa,
súvisiacu inžiniersku činnosť a skúšky**

1. SÚŤAŽNÁ PONUKA

Zhotoviteľ pripraví svoju ponuku, ktorá bude v súlade s požiadavkami uvedenými v Súťažných podkladoch. Celá ponuka, vrátane softvéru a digitálnych záznamov, bude v slovenskom jazyku.

Zhotoviteľ si zaistí, aby bol plne informovaný o lokalite, prístupoch a podmienkach na stavenisku a to nie len z informácií uvedených v tejto dokumentácii. Podaním ponuky Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s celým Staveniskom, jeho charakterom a rozsahom, ako aj s rozsahom a druhom prác, ktoré bude nutné realizovať počas výkonu zmluvy, dopravnými vzdialenosťami, všetkými aspektmi a rizikami realizácie Diela a jeho prevádzky, a že tieto zohľadní vo svojej technickej a cenovej ponuke.

Zhotoviteľ zahnie do svojej ponuky všetky náklady súvisiace s realizáciou stavby a so zabezpečením jej priebehu, ďalej so sociálnym zabezpečením pracovníkov, s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci, a pod. v rozsahu plne pokrývajúcim všetky činnosti pri výstavbe.

Vo svojom návrhu Zhotoviteľ prihliada na tú skutočnosť, že prevádzka vodovodov, kanalizácie bude počas výstavby zaistená súčasným prevádzkovateľom (Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.). Zhotoviteľ bude svoju činnosť koordinovať a urobiť všetko preto, aby umožnil v maximálnej miere obsluhu a prevádzku existujúcich zariadení. Zhotoviteľ nebude obmedzovať prevádzkovateľa pri plnení jeho povinností pri zabezpečení prevádzky do takej miery, že by znemožnil alebo obmedzil riadnu prevádzku existujúcich zariadení. Prípadné obmedzenie prevádzky bude písomne odsúhlasené SD a prevádzkovateľom.

2. ORGANIZAČNÁ SCHÉMA

Do 7 dní od Dátumu začatia prác Zhotoviteľ predloží kompletnú organizačnú schému Personálu Zhotoviteľa, ktorý plánuje použiť pri realizácii Zmluvy spolu s podrobnosťami a kontaktmi na Predstaviteľa Zhotoviteľa a na ostatný kľúčový Personál Zhotoviteľa s dôrazom na stavbyvedúcich Zhotoviteľa. Zmeny Zhotoviteľ bezodkladne oznámi Objednávateľovi aj Stavebnému dozoru.

Organizačná schéma bude obsahovať aj údaje o akreditovanom laboratóriu, v ktorom sa budú vykonávať skúšky s uvedením personálneho aj prístrojového vybavenia laboratória.

3. HARMONOGRAM PRÁČ

Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy vypracovať aktualizáciu podrobného Harmonogramu prác predloženého vo svojej ponuke. Harmonogram musí zohľadňovať klimatické podmienky (vrátane zimného obdobia a zimných opatrení), geologické a hydrogeologické podmienky (hladiny podzemných vôd) v predmetnej oblasti. Pozn.: Obmedzenie: vetva „A“ sa môže realizovať len v období od 15.3. do 15.11. - komunikácia III. triedy.

K aktualizovanému harmonogramu dopracuje Zhotoviteľ dodatkový Harmonogram prác, ktorý bude navyše ku náležitostiam zmluvných podmienok obsahovať:

- postup vykonania geodetického zamerania

- postup projekčných prác (prípravu prípadného doplnenia realizačnej dokumentácie) vrátane plánovaného časového harmonogramu zabezpečenia potrebných súhlasov, vyjadrení a odsúhlasenia týchto projektov,
- postup výroby a dodania hlavných technologických zariadení, postup výstavby, skúšok, spúšťania do trvalej prevádzky, prebratia, požiadaviek Objednávateľa na danie do užívania, s vyznačením kľúčových mílnikov, postup hlavných stavebných prác podľa jednotlivých stavieb (častí Diela),
- podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých častiach Diela,
- pri technologických zariadeniach/prevádzkových súboroch bude obsahovať samostatne stavebnú pripravenosť a dodávku/montáž technológie a typ skúšok.

Zhotoviteľ predloží harmonogram v tlačenej aj v elektronickej forme.

4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

4.1 Všeobecne

Zhotoviteľ bude vykonávať všetky práce na základe Súťažných podkladov (SP) Objednávateľa. Akákoľvek dodatočná dokumentácia vyhotovená Zhotoviteľom nesmie meniť účel a rozsah Prác opísaných v týchto Súťažných podkladoch. Výkresy budú vyhotovené podľa požiadaviek platných STN a legislatívy platnej v čase vypracovania PD. Dokumentácia Zhotoviteľa sa musí odsúhlasiť tak Objednávateľom ako aj SD minimálne 3 pracovné dni pred začatím prác. Výdavky spojené na vyhotovenie uvedenej dokumentácie Zhotoviteľa sú zahrnuté v jednotkových cenách ponuky.

Všetky modifikácie požadované SD súvisiace s možnými vyjadreniami dotknutých štátnych orgánov uvedených v stavebnom povolení budú vykonané bez nároku na dodatočné náklady. V prípade, že SD bude požadovať zmeny a Zhotoviteľ nesúhlasí so zmenami požadovanými SD, Zhotoviteľ zašle písomné oznámenie SD do sedem dní od prijatia žiadosti SD o zmenu. V takomto prípade Zhotoviteľ opäť predloží konkrétny výkres (výkresy) a v prípade potreby aj výpočty SD po tom, čo Zhotoviteľ zvážil požiadavky SD.

Ak sa počas realizácie Zmluvy, v súlade s jej podmienkami, vyskytne potreba modifikovať projektovú dokumentáciu alebo sa vyskytne potreba požiadať o nové alebo modifikované povolenie alebo súhlas oprávnených orgánov k akejkoľvek činnosti na stavenisku (napr. vybavenie rozkopávkového povolenia, povolenia k dočasnému užívaniu komunikácií, ku križovaniu verejných komunikácií, železníc, vodných tokov, výrubov stromov, atď.), Zhotoviteľ bude zodpovedný za získanie akýchkoľvek povolení, licencií, schválení, potvrdení atď. od oprávnených orgánov alebo správcov/majiteľov, vrátane prípravy potrebnej dokumentácie alebo projektu. Pred začatím takejto činnosti, predmet a rozsah dokumentácie resp. činnosti bude opäť konzultovaný a schválený Objednávateľom a SD.

4.2 Projekt stavby

Objednávateľ má k dispozícii projekt stavby. Na Dielo bolo vydané stavebné povolenie. Stavebné povolenie je k dátumu podpisu Zmluvy právoplatné.

Od Zhotoviteľa sa požaduje (okrem dodržania ustanovení technických špecifikácií) dodržanie všetkých ustanovení stavebných povolení a všetkých vyjadrení k stavebnému povoleniu uvedených v Stavebnom povolení. Zhotoviteľa obzvlášť upozorňujeme na dôkladné preštudovanie vyjadrení cestných správnych orgánov ohľadne spätnej úpravy komunikácií, ďalej vzorových výkresov spätých úprav komunikácií ako aj na vyjadrenia

Krajského pamiatkového úradu a ostatných orgánov a SVP, š.p. Zhotoviteľ má v jednotkových cenách v zmysle vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu započítaný archeologický výskum.

Bude sa mať za to, že Navrhovaná zmluvná cena obsahuje všetky náklady súvisiace s riadnym zhotovením Diela tak, aby bolo funkčné, prevádzky schopné a skolaudovateľné v súlade s platnou legislatívou.

Objednávateľ nebude uznávať žiadne naviac náklady z dôvodu nedôkladného preštudovania podmienok stavebných povolení a súvisiacich vyjadrení priložených k Súťažným podkladom.

Bude sa mať za to, že Navrhovaná zmluvná cena obsahuje všetky náklady súvisiace aj projekt organizácie dopravy vrátane odsúhlasenia na dopravnom inšpektoráte, Vybavenie všetkých povolení k čiastočnému alebo v prípade potreby úplnému uzatvoreniu komunikácii, všetky rozkopové povolenia vrátane potrebnej dokumentácie.

Súčasťou dopracovania bude aj dokumentácia v zmysle vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu.

4.3 Geodetické zameranie staveniska

Výškopisné a polohopisné zameranie bolo vykonané obcou Mníchova Lehota v rámci spracovania projektu stavby a bude odovzdané pri odovzdaní staveniska.

4.4 Dokumentácia existujúceho stavu (pasport)

Zhotoviteľ, v súlade zmluvných podmienok, je povinný predložiť Objednávateľovi a Stavebnému dozoru dokumentáciu skutočného stavu (pasport) jestvujúcich prístupových ciest ako aj prísluších nehnuteľností, ktoré by mohli byť poškodené alebo ohrozené pracovnou činnosťou Zhotoviteľa.

Predmetom podrobnej pasportizácie okrem prístupových ciest sú všetky dočasné a trvalé objekty a ich vlastnosti, ktoré môžu byť nepriaznivo ovplyvnené alebo poškodené postupom stavebných prác. Veľkú pozornosť je potrebné venovať dokumentácii objektov, ktoré sú v blízkosti výkopov alebo štôlní a pretlakov, zistenie ich stavu s ohľadom na možné sadanie počas a po realizácii stavby.

Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať postup výstavby s dôrazom na dodržiavanie kvality Diela, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie s inžinierskymi sieťami a podobne. Príslušná dokumentácia musí byť odovzdaná Stavebnému dozoru podľa potreby buď pred začatím, zakrytím, alebo prebratím prác na predmetnej časti Diela.

U objektov, u ktorých sa dajú predpokladať prípadné statické poruchy, bude pasport doplnený o stavebno-technický prieskum, vyhotovený oprávneným statikom. Tento musí obsahovať podrobný súpis všetkých poškodení, nedostatkov a závad na exteriéri aj interieri stavby a údaje o vlastnej stavbe (objekte)

Pasportizáciu zhotoviteľ spracuje a odovzdá stavebnému dozoru 2 dni pred začatím realizácie prác. Nevyhnutnou súčasťou pasportizácie je jej potvrdenie a odsúhlasenie vlastníkom/správcom objektu. V prípade, že vlastník/správca odmieta dať súhlas alebo nie je dosiahnuteľný, potom je nutné verifikáciu pasportizácie zaistiť v spolupráci s orgánom, ktorý stavbu povolil, t.j. príslušným stavebným úradom, popriprade so Stavebným dozorom.

Podrobná pasportizácia technického stavu slúži ako podklad pri riešení prípadných sporov po vzniku škôd na objekte.

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, stavbách, materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu svojej činnosti resp. činnosti ktoréhokoľvek zo svojich podzhotoviteľov. Zhotoviteľ opraví resp. uvedie do pôvodného

stavu každý poškodený objekt, stavbu, materiál alebo zariadenie ku spokojnosti Stavebného dozoru a bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľa.

4.5 Protipovodňový plán stavby

Zhotoviteľ do 30-tich dní od Dátumu začatia prác predloží Objednávateľovi „Protipovodňový plán stavby“ odsúhlasený správcom toku a príslušným vodo hospodárskym orgánom štátnej správy - v 4-och vyhotoveniach + 4x v elektronickej forme na CD/DVD.

4.6 Kontrolný a skúšobný plán

Pre oblasť skúšobníctva Zhotoviteľ je povinný využívať akreditované skúšobné laboratória, ktoré majú zavedený manažérsky systém riadenia kvality a sú akreditované aj podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005 Všeobecné požiadavky na výkon skúšobných laboratórií.

Vykonané práce a jednotlivé stavebné látky, dielce a zariadenia, stavebne montované celky a súbory takýchto látok a dielcov, musia zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, uvedeným v jednotlivých častiach SP, v technických normách STN, STN EN a ostatných všeobecne záväzných predpisoch, smerniciach a v PD Objednávateľa. V súlade so znením zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch do Diela môžu byť zabudované iba materiály a zmesi ktoré budú označené značkou zhody CE alebo C_{sk}.

Zhotoviteľ do 30-tich dní od Dátumu začatia prác predloží v 2 tlačenej forme a 2x digitálne na CD/DVD Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na odsúhlasenie „Kontrolný a skúšobný plán (KSP)“, ktorého obsahom bude počet a druhy skúšok pre všetky materiály a technológie použité pri výstavbe vrátane spôsobu predkladania a zodpovednosti za skúšky. Akékoľvek dopĺňovania alebo vyvolané zmeny musia byť schválené Stavebným dozorom.

KSP musí obsahovať podrobné údaje o navrhovaných Počiatočných skúškach typu (PST) a výrobo-kontrolných skúškach (VKS), vrátane spôsobu merania, intervalov ich vykonávania, celkového počtu skúšok s odvolávkami na príslušnú normu alebo predpis, ktorou sa jednotlivé skúšky riadia. V prípade dodávky stavebných výrobkov treba do KSP zahrnúť aj osvedčovací skúšky. KSP musí byť vypracovaný pre každý stavebný objekt (SO) a každý druh činnosti alebo dodávaného stavebného výrobku samostatne v prehľadnej tabuľkovej forme.

Ďalšie podrobnosti o skúškach sú uvedené v časti Skúšky týchto Súťažných podkladov.

4.7 Havarijný plán

V rámci preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku nekontrolovaného úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd počas výstavby Zhotoviteľ pred začatím prác vypracuje havarijný plán v zmysle § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhl. MŽP SR č. 556/2002 Z.z. a predloží ho orgánu štátnej vodnej správy a Objednávateľovi na schválenie. Žiadne práce nezačnú pred obdržaním súhlasu príslušného orgánu k stavebnej činnosti.

Pri vykonávaní zemných prác prijať účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenia prípadných havarijných stavov. Pri realizácii Diela použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana vodného zdroja.

Nakoľko sa predmetné časti Diela nachádzajú v ochranných pásmach vodných zdrojov alebo v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a minerálnych vôd, stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o súhlas podľa § 27 vodného zákona ods. 1) písm. a).

4.8 Plán ochrany životného prostredia počas výstavby

Aby sa určili potenciálne vplyvy na životné prostredie v súvislosti s realizovanými stavebnými prácami, dodávateľ musí vypracovať a predložiť na schválenie SD akčný plán ochrany životného prostredia/riadiaci plán činností, ktorý sa týka životného prostredia (RPCŽP), a ktorý zahŕňa nutné nápravné opatrenia, ktoré sa musia vykonávať po celú dobu výstavby.

Tento plán musí zahŕňať nasledujúce položky, pričom musí obsahovať návrhy na elimináciu alebo zníženie zdrojov znečistenia, okrem iného:

- hygienické zariadenia pre stavebný personál na stavenisku
- likvidácia prebytočného materiálu z výkopov
- likvidácia odpadov zo stavby
- znečistenie recipientov olejom, znečistenou vodou, stavebnými materiálmi a chemikáliami
- znečistenie podzemnej vody následkom stavebných činností
- odtok z odvodňovacích systémov staveniska
- hlučnosť
- znečistenie vzduchu
- poriadok na stavenisku.

4.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (Projekt BOZP)

Je potrebné, aby všetci zodpovední pracovníci a pracovníci priamo zúčastnení na spracovaní projektu a na prácach dôsledne dodržiavali všetky predpisy o bezpečnosti práce a nepodporovali snahu zjednodušovať niektoré pracovné úkony, ak by sa tým ohrozilo ich zdravie alebo zdravie iných pracovníkov. Pri svojej činnosti budú dôsledne dodržiavať relevantné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä zákony č. 272/1994 Z.z., 367/2001 Z.z., 124/2006 Z.z. (od júla 2006), vyhl. č. 718/2002 Z.z. a Nariadenia vlády č. 40/2002 Z.z., 115 a 145/2006 Z.z. aj Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia je rovnocennou a nedeliteľnou časťou prípravy, plánovania a plnenia pracovných úloh (§ 132 zákonníka práce).

- a) Zhotoviteľ je povinný pripraviť „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“. Táto dokumentácia musí rešpektovať zákon č. 124/2006 Z.z. Technická dokumentácia pracovných prostriedkov a pracovných postupov musí obsahovať požiadavky podľa súvisiacich predpisov - zákon č. 264/1999 Z.z., NV SR č. 571/2001, 327/2003 a 310/2004 Z.z. Požiadavky na stavbu a jej súčasti, komunikácie, pracoviská, pracovné prostriedky, pracovné postupy a činnosti musí obsahovať požiadavky osobitných predpisov - napr. NV SR č. 159/2001 a 470/2003 Z.z., ďalej č. 201/2001, 510/2001 a 282/2004 Z.z.
- b) Práce sa budú vykonávať za plnej alebo čiastočnej prevádzky niektorých vodovodov, stokových sietí a ČOV. Pre tieto práce Zhotoviteľ vypracuje návrh „Dohody o vytvorení podmienok BOZP na spoločnom pracovisku“, ktorá sa po jej odsúhlasení Objednávateľom stane prílohou písomnej zmluvy podľa § 18 zák. č. 124/2006 Z.z.
- c) Zhotoviteľa tiež upozorňujeme na niektoré úkony, ktoré sú spojené so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu vlastných pracovníkov, pracovníkov prevádzkovateľa, Objednávateľa a verejnosti. Pred začatím akejkoľvek rizikovej činnosti uvedenej dole

musí Zhotoviteľ predložiť **“Bezpečnostné/ Metodické prehlásenie”** na schválenie SD (stavebný dozor) a práce začať len po písomnom súhlase SD vykonanom v stavebnom denníku. Nasledovné úkony predstavujú vážne riziko ohrozenia zdravia a preto sa musia prijať opatrenia na zníženie tohto nebezpečenstva:

- výkopové práce (napr. paženie na zabránenie zosuvov pôdy, podzemné práce, oploštenie/ohrady, výstražné znamenia pre chodcov)
- výškové práce (napr. pády, padajúce materiály)
- uzavreté priestory (napr. nedostatok kyslíka, otravné plyny/výpary/dym, výbušné plyny)
- práce na verejných komunikáciách (napr. doprava, chodci)
- dvíhanie ťažkých bremien (napr. vhodné vybavenie, stabilný podklad, kvalifikovaný vodič/viazač/narážáč)
- prelinanie Prác s inými aktivitami prevádzkovateľa (napr. existujúca prevádzka a vybavenie)
- skladovanie, manipulácia a používanie nebezpečných látok (napr. chemické látky, výbušniny)
- kontrolovaná manipulácia s odpadovými materiálmi.

Projekt BOZP musí byť prerokovaný a odsúhlasený miestne príslušným Inšpektorátom práce.

4.10 Plán organizácie výstavby

Bude spracovaný s ohľadom na požadované zachovanie čiastočnej alebo úplnej prevádzky existujúcej kanalizácie, vodovodu alebo ČOV. Plán bude predložený SD najneskôr 5 dní pred zahájením realizácie dotknutej aktivity Projektu a musí byť odsúhlasený SD, Objednávatelom a prevádzkovateľom.

5. DOKUMENTÁCIA POČAS REALIZÁCIE DIELA

5.1 Stavebný denník

2

Zhotoviteľ je povinný počas celej doby výstavby a skúšobnej prevádzky stavebný denník v zmysle paragrafu 46d Stavebného zákona 50/1976 Z.z. v aktuálnom znení. Stavebný denník bude tvoriť súčasť dokumentácie Zhotoviteľa uloženej na Stavenisku. Bude obsahovať záznamy o všetkých podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu Prác.

Za vedenie stavebného denníka je výlučne zodpovedný Zhotoviteľ. Zápisy do denníka môžu urobiť nasledovné osoby:

- Zhotoviteľ, Objednávatel, Stavebný dozor
- autorský dozor a koordinátor bezpečnosti práce na základe uzavretej zmluvy s Objednávatelom, autorizovaný geodet Zhotoviteľa
- štátne kontrolné orgány, správcovia/prevádzkovatelia ostatných inžinierskych sietí
- stavebné úrady.

Zhotoviteľ je zodpovedný aj za vedenie záznamov o dodávkach a montáži strojov a zariadení v montážnom denníku, ktorý tvorí osobitnú časť Stavebného denníka. Oba dokumenty budú k dispozícii Stavebnému dozoru, koordinátorovi bezpečnosti práce, Objednávatelovi a štátnym kontrolným orgánom počas celého trvania Zmluvy. Všetky záznamy vykonané Zhotoviteľom alebo jeho poverencami do Stavebného denníka budú podpísané Zhotoviteľom alebo nim poverenými osobami.

Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných prác musia byť zaznamenané do Stavebného denníka. Záznamy musia byť vždy aktualizované Zhotoviteľom na základe meraní vykonaných v súčinnosti so Stavebným dozorom, pred zakrytím vykonaných Prác.

Všetky strany Stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť po ich predchádzajúcom podpísaní postúpené Stavebnému dozoru na konci každého týždňa. Stavebný denník musí byť podpísaný tak Zhotoviteľom, ak aj Stavebným dozorom, minimálne na konci každého týždňa.

Záznamy v stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle zmluvných podmienok a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

5.2 Plán individuálnych a komplexných skúšok

Zhotoviteľ musí vykonať všetky nevyhnutné skúšky na stavenisku za prevádzkových podmienok, aby bolo možné potvrdiť splnenie špecifikácie k úplnej spokojnosti SD.

a) Program individuálneho odskúšania

Zhotoviteľ spracuje a predloží na schválenie SD Program individuálneho vyskúšania obsahujúci rozsah, vecnú náplň a časový harmonogram prípravy vrátane požiadaviek na obsluhu, energiu a média (hradených zhotoviteľom).

Po úspešnom ukončení skúšok Zhotoviteľ spracuje Protokol.

5.3 Prevádzkové predpisy

a) Prevádzkové a manipulačné poriadky

Budú vypracované v slovenskom jazyku v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Po ukončení realizácie Zhotoviteľ spracuje a predloží **prevádzkové poriadky pre trvalú prevádzku Diela**.

Prevádzkové a manipulačné poriadky budú predložené v tlačенých a elektronických verziách na CD/DVD nosiči v editovateľnej forme.

Náklady na vypracovanie všetkých prevádzkových predpisov budú zahrnuté do ponukovej ceny Zhotoviteľa.

6. DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA (DSV)

Zhotoviteľ vypracuje k preberaniu diela dokumentáciu skutočného vyhotovenia v súlade s nasledovnými položkami:

- úplná dokumentácia skutočného vyhotovenia na úrovni realizačnej dokumentácie, situácie budú so zákresom aktuálnej katastrálnej mapy
- zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasené SD
- podrobný geodetický elaborát so zameraním realizovanej stavby v zmysle vyššie uvedeného
- geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena
- certifikáty a elaboráty kvality

- protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok (skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky strojnotechnologických zariadení)
- záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových alebo podobných prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok od správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku
- doklady o zhutnení zásypov rýh v komunikáciách a chodníkoch (protokoly o skúškach)
- doklady o zhutnení základových škár podzemných a nadzemných objektov (protokoly o skúškach)
- doklady o skúškach vodotesnosti a plynotesnosti podzemných a nadzemných objektov (protokoly o vykonaní skúšok)
- zoznam odborných prehliadok a skúšok technických zariadení alebo prvých úradných skúšok vyhradených technických zariadení podľa požiadaviek vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
- kópie stavebných denníkov
- špecifikácia bežných porúch a ich opráv
- doklady vyžadované podľa zákona o odpadoch
- prevádzkové a manipulačné poriadky vrátane pokynov pre včasné a riadne vykonávanie údržby
- dokumentácia pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN, protokoly o vykonaní skúšok,
- porealizačné súhlasné stanoviská prevádzkovateľov jednotlivých dotknutých IS a komunikácií
- porealizačné súhlasné stanoviská starostu dotknutej obce a zodpovedných orgánov dotknutých miest
- súhlasné stanoviská majiteľov pozemkov o znovuvvedení dotknutých parciel do pôvodného stavu.

DSV bude formálne pozostávať z nasledovných šiestich častí (zväzkov):

1.	Projekt skutočného vyhotovenia
2.	Geodetický elaborát
3.	Dokumentácia kvality
4.	Stavebné denníky
5.	Porealizačné vyjadrenia
6.	Majetkoprávny elaborát

Obsah jednotlivých častí DSV bude nasledovný:

6.1 Projekt skutočného vyhotovenia

Zhotoviteľ pripraví a odovzdá SD na schválenie projekt skutočného vyhotovenia na jednotlivé časti vykonaných Prác (aktivity) na úrovni **realizačnej dokumentácie** (tzn. aktualizovaná technická správa, situácie na podklade geodetického zamerania a katastrálnej mapy, pozdĺžne a priečne rezy, detaily a pod.) v tlačenej aj digitálnej forme.

Projekty skutočného vyhotovenia sa majú vyhotovovať ihneď po ukončení tej ktorej časti diela (aktivity). Záverečná verzia projektu skutočného vyhotovenia bude odsúhlasená SD pred vydaním preberacieho protokolu.

Zhotoviteľ je povinný archivovať a dopĺňať projekt skutočného vyhotovenia „do vydania preberacieho protokolu“, a poskytnúť kópie záznamov, výkresov a certifikátov pre Objednávateľa v pravidelných intervaloch podľa inštrukcií SD. Záznamy budú obsahovať podrobnosti o všetkých zariadeniach a materiáloch, o výstavbe, skúškach a skúšobných certifikátoch.

Záverečné kópie projektu skutočného vyhotovenia budú odovzdané SD vo vzájomných celkoch a budú riadne označené jeden mesiac pred predpokladaným dátumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentáciou priebehu komplexných skúšok a odchýlok vykonaných ako výsledok týchto skúšok.

Projekt skutočného vyhotovenia po odsúhlasení SD bude odovzdaná Objednávateľovi v tlačenej aj digitálnej forme.

6.2 Geodetický elaborát

6.2.1 Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia

Požiadavky na zameranie skutočného stavu vychádzajú z Vyhlášky 300/2009 Z.z. ÚGKK, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a sú podmienené dodržaním týchto hlavných zásad: výškový systém Baň po vyrovnaní (Bpv), súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej platný ku dňu dodávky, údaje spracované na počítači s výstupmi čitateľnými programom Microstation a zo súboru *.dgn vytlačením príslušnej digitálnej mapy (geodetický zákres, polárne súradnice vo formáte .xls a technická správa vo formáte .doc).

Zhotoviteľ geodeticky zameria polohové a výškové zameranie skutočného realizovania Diela, vrátane všetkých objektov a zariadení inžinierskych sietí, polohopisné a výškové zameranie všetkých súbehov a križovaní s inými inžinierskymi sieťami.

Celá stavba meraných trás pozemných komunikácií, vodovodov a kanalizácií vrátane križovaní a súbehov s inými sieťami bude zameraná pred jej zakrytím, čo potvrdí súhlasným písomným stanoviskom Stavebný dozor – bude súčasťou odovzdania GD.

Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi geodetickú časť dokumentácie skutočného realizovania objektu v vyhotoveniach spolu s oznámením o dokončení prác na objekte.

V prípade potreby doprojektovania zmien a doplnkov si geodetické podklady zabezpečí Zhotoviteľ sám.

Všetky náklady na geodetické práce vyplývajúce z činnosti Zhotoviteľa ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania Diela sú zahrnuté v ponukovej cene.

Geodetické zameranie bude zahŕňať zameranie novo vybudovaných kanalizácií a k nim prislúchajúcich objektov (napr. šachty, čerpacie stanice,) ako aj prípadných preložiek sietí. Geodetické zameranie bude u liniových stavieb zahŕňať aj zameranie miesta napojenia a ukončenia prípojok (resp. vstupu do budovy alebo na súkromný pozemok), horizontálne alebo vertikálne lomové body trasy, profily a materiál jednotlivých vedení, u vodovodov body v priamych úsekoch vo vzdialenosti max. 100 m, zmeny dimenzie potrubí atď.

Závazne sa predpisuje zameriavať uvedené objekty vrátane kanalizačných odbočiek a všetkých inžinierskych a ostatných sietí (nadzemných a podzemných), pokiaľ sú súčasťou stavby, ďalej rekonštrukcie a preložky. Rovnako sa predpisuje u novo vybudovaných liniových stavieb zamerať všetky križované inžinierske siete v rozsahu 3 m na každú stranu realizovaného vedenia.

Pre existujúce liniové stavby, ktoré nie sú realizáciou Projektu dotknuté, vodovodné a kanalizačné odbočky sa geodetické zameranie záväzne nepredpisuje.

GD ku kolaudácii jednotlivých stavieb bude odovzdávaná **spolu so súhlasným písomným stanoviskom správcu GIS-uprevádzkovateľa**.

Obsah geodetickej dokumentácie:

Časť Polohopis :

- technická správa
- geodetické údaje bodov meračskej siete výpis PBPP - potvrdenie Katastrálnym úradom o prevzatí pevných bodov /fotokópia/
- prehľadný náčrt bodov PBPP.dgn – výkres daných a novourčených bodov
- meračská sieť.txt / *.doc/ -zoznam súradníc a výšok bodov meračskej siete; číslo bodu, súr. x, y, z, popis; body dané a novourčené
- polohopis.dgn - obsahuje zapracovanie všetkých chýbajúcich objektov pôvodného polohopisu s očíslovaním objektov
- polohopis_body.dgn - číslo bodu , súr."z"
- polohopis.txt / *.doc/ - obsahuje body meraného polohopisu; číslo bodu, x, y, z
- kontrolná tlač v mierke M = 1:500, 1:1000

Časť Kanalizácia :

- kanalizácia.dgn – zameraná trasa kanalizácie a prípojok (napojenie a ukončenie), vrátane objektov a zariadení, popis vetiev, materiál a DN potrubí, sklon a vzdialenosť medzi šachtami; zakótovať všetky dôležité body kanalizácie od pevných bodov polohopisu, použiť kótovanie na kolmice, zakótovať všetky križovania s inými sieťami
- kanalizácia_body.dgn – číslo bodu, hĺbkovú hodnotu H odpočet súradníc z, ž, - umiestniť tak, aby sa neprekrývala hodnota so z-tovými súradnicami výkresom kanalizácia.dgn
- kanalizácia.txt / *.doc/ - číslo bodu, súr. x, y, z, ž, H, popis
- pozdĺžny profil.dgn

Časť Vodovod :

- vodovod.dgn – zameraná trasa vodovodu a prípojok (napojenie a ukončenie) vrátane objektov a zariadení, popis vetiev, materiál a DN potrubí, sklon a vzdialenosť medzi horizontálnymi lómami; zakótovanie významných bodov vodovodu od pevných bodov polohopisu – použiť kótovanie na kolmice, zakótovať križovania s inými sieťami,
- vložiť hĺbkovú hodnotu uloženia potrubia „H“ v /m/ - odpočet súrad. z, ž, zakresliť vnútorné dispozičné rozmery armatúrnych šacht so zakresom jednotlivých armatúr v šachtách.
- vodovod_body.dgn – obsahuje číslo bodu, súr. z, ž
- vodovod.txt / *.doc/ - číslo bodu, súr. x, y, z /terén/, ž/hĺbka uloženia/, H, popis; taktiež vypísať križovanie s inými sieťami
- pozdĺžny profil.dgn – u vodovodov odovzdať po predchádzajúcej dohode s objednávateľom

Časť Iné vedenia:

- iné vedenia.dgn - zakres všetkých vedení, ktoré križovali, resp. boli v súbehu s meranou trasou potrubí, do 30 vrstvy umiestniť hĺbkovú hodnotu „H“ odpočet súr. z,ž
- iné vedenia_body.dgn - číslo bodu, súradnice z, ž
- iné vedenia.txt / *.doc/ - číslo bodu, súrad. x, y, z, ž, H, popis

Časť ČOV :

- čov.txt / *.doc/ - číslo bodu, súr. x, y, z /terén/, ž/hĺbka uloženia/, H, popis

Elaborát overí autorizovaný geodet.

6.2.2 Geometrické plány

Súčasťou DSV budú tiež porealizačné **geometrické plány** vypracované podľa platných technických predpisov. V porealizačných geometrických plánoch na vyznačenie vecného bremena sa vyčíslí plocha obmedzenia (šírka ochranného pásma) pre jednotlivé parcely.

Zhotoviteľ je zodpovedný za vyhotovenie geometrických plánov, v takej podobe, aby boli akceptované na zápis do katastra nehnuteľností v zmysle vyhlášky č. 461/2009 Z.z. o vykonaní katastrálneho zákona v znení neskorších predpisov a pokynov Stavebného dozora a Objednávateľa bez ďalšej úpravy Objednávateľom.

V porealizačných GP sa právny stav v miestach prekročeného trvalého záberu rieši podľa vykonanej analýzy a vypracujú sa kompletne podklady k majetko-právnejmu vysporiadaniu /zoznam vlastníkov, vyňatie BPEJ/.

Porealizačné geometrické plány Zhotoviteľ spracuje v 6 vyhotoveniach v tlači a 4x v digitálnej forme vo formáte .dgn.

Meranie a spracovanie musí byť podľa príslušných STN a inštrukcií na prácu v polohových bodových poliach v aktuálnych pozemkových mapách, ktoré si zabezpečí Zhotoviteľ stavby. Elaborát overí autorizovaný geodet Zhotoviteľa.

6.3 Dokumentácia kvality

Dokumentácia kvality bude obsahovať atesty a certifikáty materiálov, strojov a zariadení zabudovaných do trvalého Diela ako aj protokoly skúšok tesnosti kanalizácie v plnom rozsahu a kamerové skúšky v plnom rozsahu. Kamerový záznam musí okrem tesnosti potrubia preukázať aj sklonové pomery kanalizácie. Protokoly tesnosti skúšok a kamerové skúšky odovzdá Zhotoviteľ v papierovej aj digitálnej forme

6.4 Stavebné denníky

Tento zväzok bude obsahovať originálne strany všetkých stavebných denníkov, ktoré sa týkajú predmetnej časti Diela.

6.5 Porealizačné vyjadrenia

Porealizačné vyjadrenia budú obsahovať vyjadrenia dotknutých orgánov, organizácií, správcov komunikácií a dotknutých inžinierskych sietí, majiteľov pozemkov a dotknutých nehnuteľností, starostov obcí, primátorov miest, príslušných úradov a pod. k skutkovému stavu.

6.6 Majetkoprávny elaborát

Táto časť DSV bude obsahovať:

- kópie máp z C-KN overených Katastrálnym úradom so zakreslenými trasami a objektmi
- kópie máp určeného operátu overených Katastrálnym úradom so zakreslenými trasami a objektmi
- zoznam vlastníkov a užívateľov všetkých dotknutých pozemkov, vrátane dokladov o vlastníkoch LV, EL (koľková známka)
- identifikácie všetkých dotknutých pozemkov (č. parcely, druh pozemku, LV, EL, vlastník, užívateľ podľa KN, PK)

Majetkoprávne vysporiadanie sa počas realizácie zmluvy v prípade zmien oproti projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podmienok bude riadiť nasledovnými princípmi:

6.6.1. Objednávateľ zabezpečuje:

- na základe výzvy Zhotoviteľa uskutočnenie podpisu kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv a zmlúv o zriadení vecného bremena (ďalej len „príslušných zmlúv“)
- znalecké posudky na určenie kúpnej ceny pozemku, nájomného a odplát za vecné bremená
- vklad príslušných zmlúv do katastra nehnuteľností

6.6.2. Objednávateľ hradí:

- náklady za znalecké posudky
- výkup pozemkov trvalých záberov (kúpne ceny)
- odplaty za vecné bremená
- odplaty za prenájom vyplývajúce z nájomných zmlúv
- poplatky súvisiace s vkladom príslušných zmlúv do katastra nehnuteľností
- notárske poplatky za overenie pravosti podpisu vlastníka/spoluvlastníka dotknutej nehnuteľnosti (pričom je na dohode medzi objednávateľom a vlastníkom/spoluvlastníkom dotknutej nehnuteľnosti kto uhradí tieto poplatky)

6.6.3. Zhotoviteľ zabezpečuje:

- geometrické plány jednotlivých parciel, ktoré sú predmetom kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv a zmlúv o zriadení vecného bremena po zrealizovaní príslušnej časti diela a požiadaviek v zmysle dokladovej časti. Geometrické plány zhotoviteľ vyhotoví na každého vlastníka zvlášť (podľa LV v dokladovej časti – príloha 6 a geometrické plány na 3ks čerpacích staníc)
- vypracovanie návrhov na vklad príslušných zmlúv do katastra nehnuteľností
- písomné upovedomenie (výzva) objednávateľa na uzatvorení príslušných zmlúv

6.6.4. Zhotoviteľ hradí:

- náklady v súvislosti s vyhotovením geometrických plánov podľa bodu 3
- náklady v súvislosti s vyzdvihnutím listov vlastníctva, výpisov z pozemkovo-knižných vložiek a snímok z katastrálnej mapy
- náklady v súvislosti s prípravou príslušných zmlúv
- náklady v súvislosti s vypracovaním návrhov na vklad príslušných zmlúv do katastra nehnuteľností

Jednotlivé časti DSV budú odovzdávané v pevných doskách a budú vložené do škatúl tak, aby v jednotlivých škatuliach boli jednotlivé stavby.

Všetky náklady na vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia budú zahrnuté v ponukovej cene Zhotoviteľa.

HARMONOGRAM PREDKLADANIA DOKUMENTÁCIE ZHOTOVITEĽA

Nižšie uvedený harmonogram uvádza zoznam dokumentov, ktoré Zhotoviteľ predloží SD na schválenie v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ musí vypracovať "Program predkladania dokumentov" označujúci časy predkladania týchto dokumentov.

Tab. Harmonogram spracovania dokumentácie

A	Projekty a manuály	Počet kópií	Čas
A4	Plán organizácie výstavby pre jednotlivé aktivity	3 tlač 3 digi	podľa požiadaviek
A5	Projekt dopravného značenia (ak je potrebný)	3 tlač 3 digi	podľa požiadaviek
A7	Pasport – dokumentácia existujúceho stavu)	2 tlač 2 digi	podľa požiadaviek
A8	Návody na obsluhu a údržbu	3 tlač	podľa požiadaviek
A12	Prevádzkové a manipulačné poriadky pre trvalú prevádzku	4 tlač 4 digi	k ukončeniu stavby
A15	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	5 tlač 5 digi	k preberaniu stavby
B	Programy	Počet kópií	Čas
B1	Harmonogram prác a POV	3 tlač 3 digi	v zmysle ZoD
B2	Plán individuálnych skúšok	3 tlač	podľa požiadaviek
C	Zdravie a bezpečnosť pri práci, ochrana ŽP	Počet kópií	Čas
C1	Protipovodňový plán stavby	5 tlač 5 digi	podľa požiadaviek
C2	Kontrolný a skúšobný plán	3 tlač 3 digi	podľa požiadaviek
C3	Havarijný plán opatrení pri úniku látok škodiacich vodám	3 tlač 3 digi	podľa požiadaviek
C4	Plán ochrany životného prostredia počas stavby	3 tlač 3 digi	podľa požiadaviek
C5	Projekt BOZP	3 tlač 3 digi	podľa požiadaviek
C6	Denník BoZP	3 tlač	mesačne
D	Správy	Počet kópií	Čas
D1	Mesačné správy a súpisy vykonaných prác	6 tlač 6 digi	mesačne

Pozn. Digi znamená elektronickú verziu v editovateľnej forme na CD/DVD nosiči.

Náklady na vypracovanie všetkých týchto dokumentov budú zahrnuté v ponukovej cene Zhotoviteľa.

7 Skúšky

Prebratie stavby v tejto Zmluve je podmienené spokojnosťou Objednávateľa, že Práce alebo časť Prác boli dokončené, preskúšané, preukázané, sú funkčné a boli vyhotovené v súlade s požiadavkami súťažných podkladov a zmluvy o dielo. Všetky skúšky sa musia vykonať v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a technických noriem.

V prípade, že boli testy ukončené k spokojnosti SD a všetky atesty, krivky, atď. boli skontrolované, SD musí predložiť písomný súhlas so skúškami, a žiadne zariadenie, materiál alebo iné časti Prác nesmú byť zabudované do diela ani dodané, pokiaľ tento súhlas nebol vydaný.

SD si vyhradzuje právo žiadať od Zhotoviteľa, aby uhradil akékoľvek navyše náklady, ktoré vznikli chybou Zhotoviteľa pri plnení vyššie uvedených skúšok, vrátane úhrady atestov, kriviek, podobojednávok, atď. alebo takých nákladov, ktoré podľa SD vznikli nedostatočnou starostlivosťou Zhotoviteľa alebo Podzhotoviteľa predtým, ako bolo zariadenie podrobené kontrole alebo skúške. Ak dôjde k neoprávnenej dodávke, Zhotoviteľ môže byť požiadaný, aby zabezpečil vrátenie zariadenia výrobcovi na kontrolu a/alebo na svedecký test na svoje vlastné náklady.

Zhotoviteľ sa musí zabezpečiť, aby všetci Podzhotovitelia obdržali kópiu týchto Požiadaviek.

Podrobnosti týkajúce sa skúšobnej metódy navrhutej pre každý prvok, musia byť predložené SD.

Má sa za to, že ponuková cena Zhotoviteľa, bez ohľadu na rozsah špecifikácie v jednotlivých výkazoch, zahŕňa náklady na všetky skúšky, vrátane dočasných prác, montáží, materiálov, nástrojov, skladovania, paliva a energie spotrebovaného počas inšpekcií a skúšok, odberov vzoriek a laboratórnych analýz (napr. u vodovodných potrubí) ako aj náklady na zaobstaranie skúšobných certifikátov, súhlasov a vyjadrení (napr. TI SR).

Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné skúšky za účelom preukázania súladu s požiadavkami Súťažných podkladov a prevádzkovými podmienkami.

Všeobecné podmienky skúšok:

- Všeobecné podmienky platné pre skúšky musia byť aplikované, pokiaľ nie sú niekde v tejto špecifikácii podrobne uvedené iné požiadavky vzťahujúce sa ku špecializovanej prevádzke.
- U nehomologovaných zariadení umožňuje Zhotoviteľ SD na jeho požiadavku zúčastňovať sa homologácií zariadení.
- Špecifické skúšky a revízia požadovaná podľa tejto zmluvy sú špecifikované nižšie, ale pokiaľ dodávateľ komponentov má vlastný postup štandardných skúšok a revízií, potom musia byť vykonané a kópia testu a revízijských správ budú odovzdané SD.
- Zhotoviteľ musí vykonať rozsiahle skúšky a revíziu, aby potvrdil, že zariadenie a jeho prevádzka spĺňajú požiadavky technických špecifikácií. Zhotoviteľ musí pripraviť zoznam navrhovaných skúšok a revízií, ktoré zahŕňujú, ale neobmedzujú sa na tie, ktoré sú podrobne uvedené v zvyšnej časti textu, a ktoré musia byť odovzdané SD k schváleniu. Tento zoznam je potrebné upraviť, pokiaľ to SD považuje za potrebné. • Zhotoviteľ musí byť zodpovedný za organizáciu skúšok celého zariadenia a SD musí aspoň s týždňovým predstihom oznámiť dátum, kedy sa plánuje vykonávanie skúšok. Pokiaľ nie je uvedené inak, Zhotoviteľ musí zodpovedať za dodávku vody, energie a materiálu, ktorá je potrebná pre vykonávanie skúšok.

- V prípade, že niektorá časť zariadenia nevyhovuje Špecifikácii, Zhotoviteľ musí ihneď prijať opatrenia a nahradiť ho iným zariadením, ktoré zodpovedá Špecifikácii, alebo podniknúť iné kroky, ktoré môže stanoviť SD.
- Ak niektorý prvok zariadenia nevyhovuje požadovaným skúškam, tak tieto skúšky sa musia v primeraných obdobiach za rovnakých situácií a podmienok opakovať. Akékoľvek rovnaké výdaje, ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s opakovaním skúšok, musia byť odpočítané od zmluvnej ceny.
- Ak SD oznámi Zhotoviteľovi, že nebude prítomný pri danej skúške, aj vtedy musí Zhotoviteľ vykonať skúšku za takých podmienok, ktoré by v prevažnej miere nastali, ako keby SD bol prítomný, a musí SD zaslať v písomnej forme podrobné výsledky skúšky.

Za všetky skúšky, ktoré vykoná SD alebo Zhotoviteľ, nesie riziko i náklady Zhotoviteľ.

Účasť Objednávateľa na skúškach:

- Zhotoviteľ pred začatím skúšok vyhotoví harmonogram skúšok, ktorý predá SD aj Objednávateľovi. Zhotoviteľ bude vykonávať skúšky v súlade s Kontrolným a skúšobným plánom.
- Zhotoviteľ oznámi termín konania skúšok strojných zariadení minimálne 7 dní pred stanoveným termínom SD ako aj Objednávateľovi.
- Zhotoviteľ oznámi dátum konania skúšok potrubných vedení minimálne 48 hodín pred stanoveným termínom.
- Zhotoviteľ umožní aj účasť Objednávateľa (popri SD) na skúškach. Ak Objednávateľ, po predošlom oznámení, sa na stanovené miesto a v stanovenom čase nedostaví, a v prípade, že SD nevydá iný pokyn, Zhotoviteľ môže pokračovať so skúškami.

SKÚŠANIE TESNOSTI GRAVITAČNÝCH STÓK A KANALIZAČNÝCH ODBOČIEK

Skúšanie tesnosti gravitačných potrubí sa riadi normou STN EN 1610 „Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stók“.

Skúšať sa majú úseky stók, ktoré ešte neboli zasypané. Potrubia majú byť zabezpečené proti posunu, ak treba, rúry môžu byť čiastočne alebo úplne zasypané – spoje však musia ostať viditeľné.

Skúšky sa môžu vykonať:

- vodou, alebo
- vzduchom.

Ak nie je možné vykonať predpísané skúšky vodou alebo vzduchom (napr. v prípade špeciálnych profilov alebo pri rekonštrukcii), potom je možné použiť iné skúšobné metódy za účelom dôkazu tesnosti (napr. skúšky dymom). Dovoľuje sa aj kombinácia skúšok vodou a vzduchom, napr. stoky sa môžu skúšať vzduchom a šachty vrátane prípojok vodou.

Skúšanie vzduchom (metóda L)

Trvanie skúšky potrubí s vylúčením vstupných šacht a revízných komôr závisí od priemeru rúry a skúšobnej metódy. Skúšobnú metódu má určiť objednávatel.

Aby sa vyvarovalo chybám zapríčineným skúšobným zariadením, musia sa použiť vhodné vzduchohé sne uzavery.

Najprv sa musí približne 5 minút udržiavať začiatkový tlak približne o 140 % prekračujúci vyžadovaný skúšobný tlak p_0 . Potom sa musí tlak nastaviť na skúšobný tlak stanovený normou. Potrubie vyhovuje, ak tlak nameraný po skúške klesne menej, ako o rozdiel tlaku stanovený normou.

Skúšanie vodou (metóda W) Príprava

Stoky majú byť vodotesne uzavreté z oboch strán testovaného úseku ako aj v bode pripojenia vpustov a kanalizačných prípojk. Zátky a kolená majú byť dostatočne zaistené proti silám vzniknutým počas skúšok. Počas plnenia sa musí pamätať na to, aby v testovanom úseku nevznikali vzduchové vankúše. Preto stoky musia byť plnené pomaly, aby sa vzduch mohol vypustiť cez dostatočne veľký vzdušník alebo cez šachtu na hornom konci potrubia. Z toho dôvodu na prípravu a vykonávanie skúšok musí byť rezervovaný dostatočný čas. Ďalej, stoky nesmú byť poškodené pretlakovaním alebo v dôsledku vodného rázu.

Skúšobný tlak

Skúšobný tlak je tlak ekvivalentný/vyplývajúci z naplnenia skúšaného úseku po úroveň terénu pri vstupnej šachte umiestnenej po prúde (vo výnimočných prípadoch proti prúde) s maximálnym tlakom 50 kPa a minimálnym tlakom 10 kPa meraným vo vrchole rúry. Vyššie skúšobné tlaky sa môžu predpísať pre potrubia navrhnuté na prevádzku pri vyšších tlakoch. Po naplnení potrubia môže byť potrebné kondicionovanie. Zvyčajne stačí 1 hodina, dlhší čas môže byť potrebný v suchých klimatických podmienkach.

Trvanie skúšky

Predpísané trvanie skúšky je (30 ± 1) minút.

Kolísanie tlaku počas skúšky nesmie byť väčší ako 1 kPa v porovnaní s predpísaným skúšobným tlakom.

Požiadavky na skúšky

Množstvo vody doplnené počas skúšky na udržanie predpísaného tlaku sa musí merať spolu s hydrostatickým tlakom vody a vyžadovaným skúšobným tlakom. Skúšobná požiadavka je splnená, ak množstvo doplnenej vody v skúšanom úseku nie je väčšie ako:

- 0.15 l/m² omočeného obvodu za 30 minút pre potrubia
- 0.20 l/m² omočeného obvodu pre potrubia vrátane vstupných šacht
- 0.40 l/m² omočeného obvodu pre vstupné šachty a revízne komory

Skúšanie jednotlivých spojov

Ak nie je určené inak, pre potrubia väčšie ako DN 1000 mm sa môžu skúšať jednotlivé spoje namiesto skúšania celého potrubia. V týchto prípadoch, ak nie je určené inak, berie sa do úvahy plocha reprezentujúca 1 m dĺžky rúry. Skúšobné požiadavky sú totožné s požiadavkami popísanými vyššie so skúšobným tlakom 50 kPa meraným vo vrchole rúry.

Zhotoviteľ okrem skúšok vykoná monitoring všetkých gravitačných stokoví sietí, ktoré sú súčasťou zmluvy. Monitorovanie bude zabezpečené priemyselnou kamerou k spokojnosti SD. Pokiaľ monitoring preukáže nesúlad vyhotovenia s požiadavkami súťažných podkladov, zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opravy na vlastné náklady.

Skúšanie tesnosti gravitačných stôk a kanalizačných odbočiek ako aj kamerové skúšky sa bude vykonávať v 100%-nom rozsahu.

Všetky náklady spojené s uvedenými skúškami zhotoviteľ započíta do jednotkových cien, vrátane nákladov na zabezpečenie médií, napúšťacieho potrubia, čerpadiel, energií atď..

Náklady spojené so všetkými skúškami


vrátane zabezpečenia všetkých médií (energie, voda, kal, chemikálie) znáša Zhotoviteľ v súlade s ustanoveniami zmluvných podmienok.

Na základe požiadaviek Trenčianskeho samosprávneho kraja zhotoviteľ vykoná statické záťažové skúšky v zmysle povolenia certifikovaným laboratóriom za prítomnosti správcu komunikácie.

Príloha č. 5:

Harmonogram realizácie diela

BAUMANN HORA s.r.o. Lúčna 808
001 33 Lúčna
IČO: 47 510 728
IČD: 20201167, IČ DIK: 50033071167

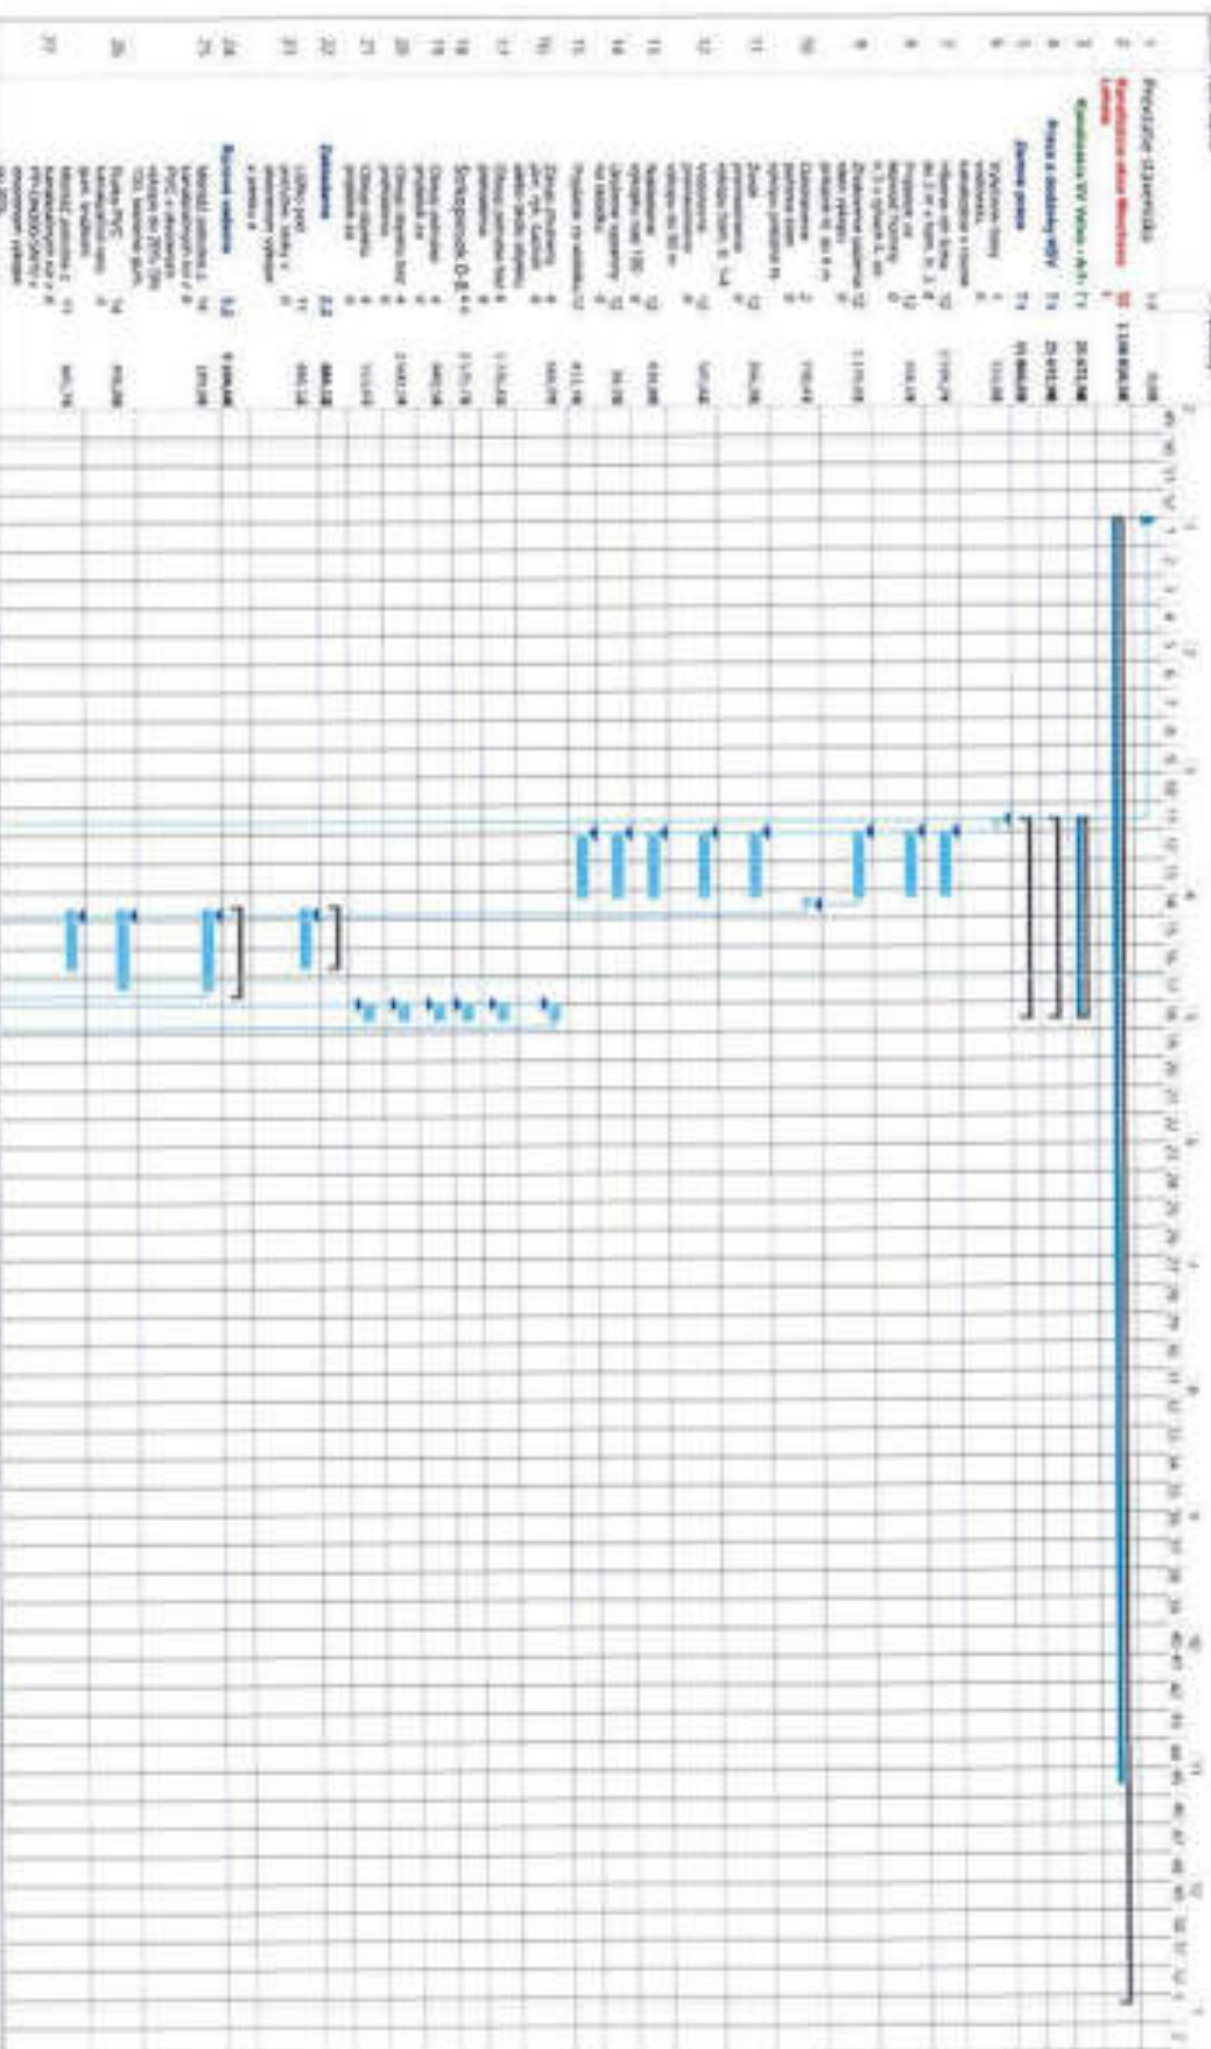


Project: Blanket Test	Date: 01/11/2024	Time (min)	% Buckling
		0	0.00
		10	0.00
		20	0.00
		30	0.00
		40	0.00
		50	0.00
		60	0.00
		70	0.00
		80	0.00
		90	0.00
		100	0.00
		110	0.00
		120	0.00



Project: Project 100
Date: 2023-01-01

1000000

Column	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
3	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
4	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
5	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
6	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
7	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
8	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
9	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
10	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

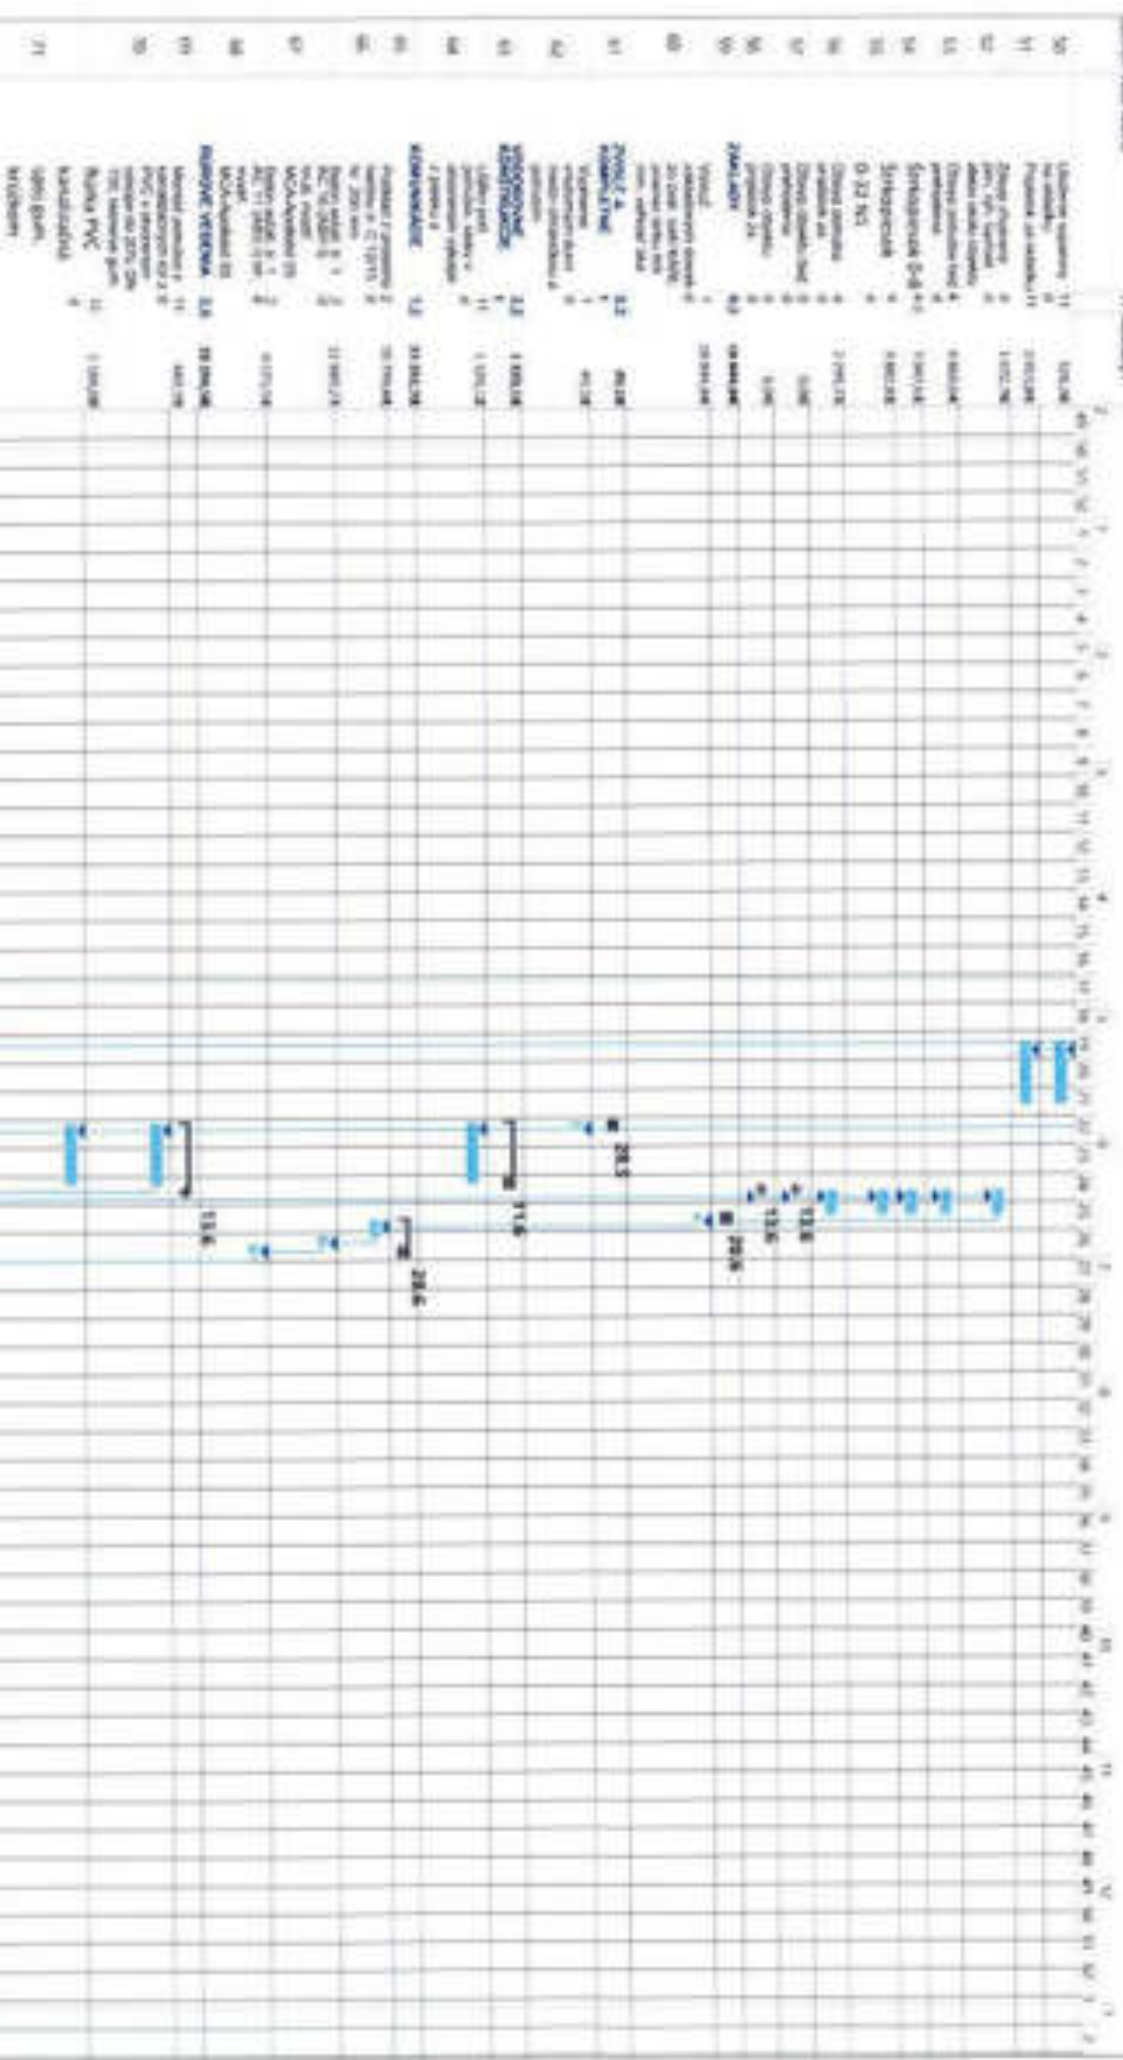

Project: Roadway
Date: 01-11-2024


Scale:

1:10000.00


[illegible]

Project: Project184
Date: 06/17/2024[illegible]

Material	Year	Volume	Weight	Value
117	2017	1.0	1.0	1.0
118	2018	1.0	1.0	1.0
119	2019	1.0	1.0	1.0
120	2020	1.0	1.0	1.0
121	2021	1.0	1.0	1.0
122	2022	1.0	1.0	1.0
123	2023	1.0	1.0	1.0
124	2024	1.0	1.0	1.0
125	2025	1.0	1.0	1.0
126	2026	1.0	1.0	1.0
127	2027	1.0	1.0	1.0
128	2028	1.0	1.0	1.0
129	2029	1.0	1.0	1.0
130	2030	1.0	1.0	1.0
131	2031	1.0	1.0	1.0
132	2032	1.0	1.0	1.0
133	2033	1.0	1.0	1.0
134	2034	1.0	1.0	1.0

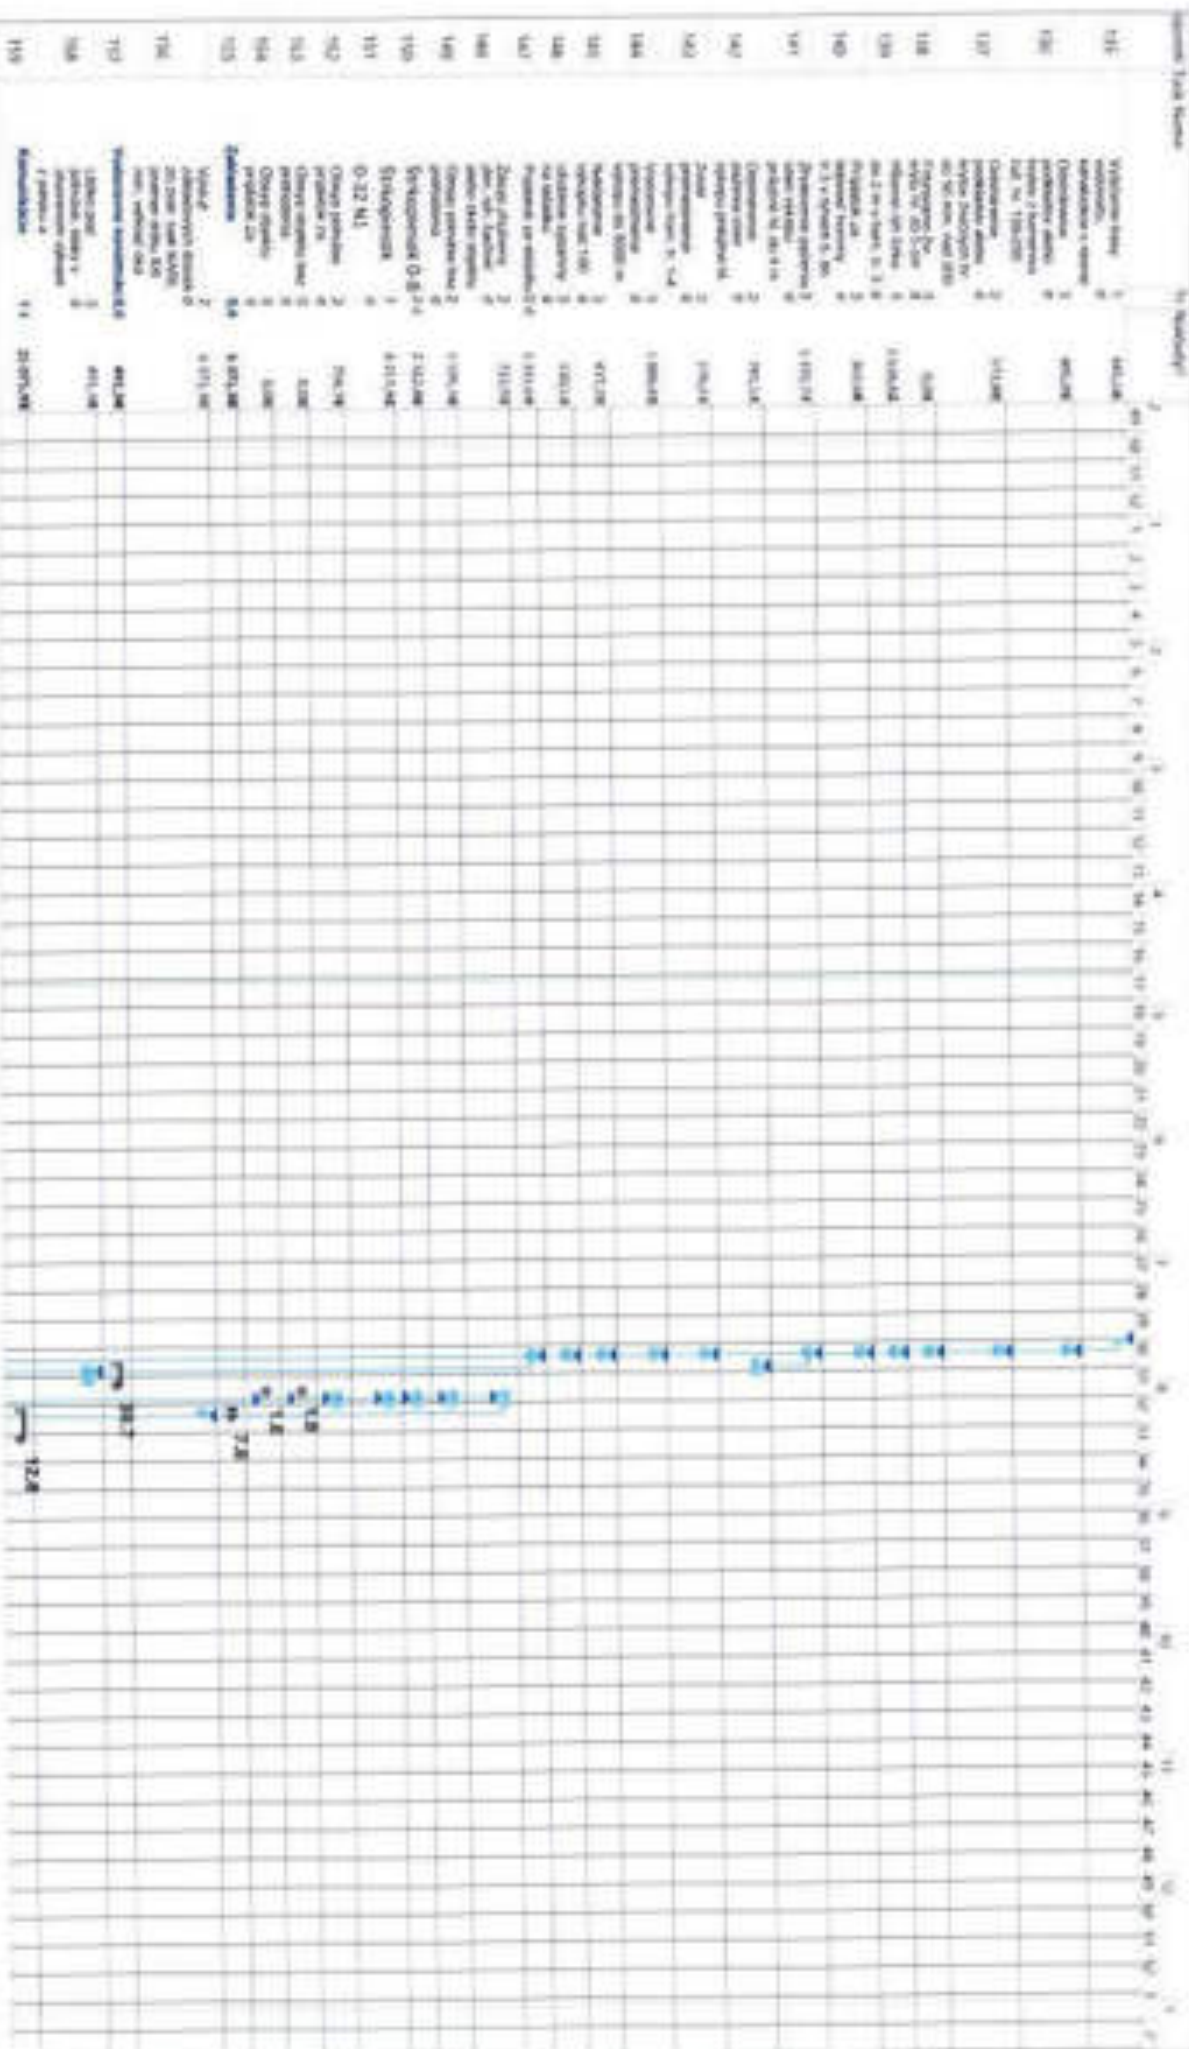[illegible]

[illegible]

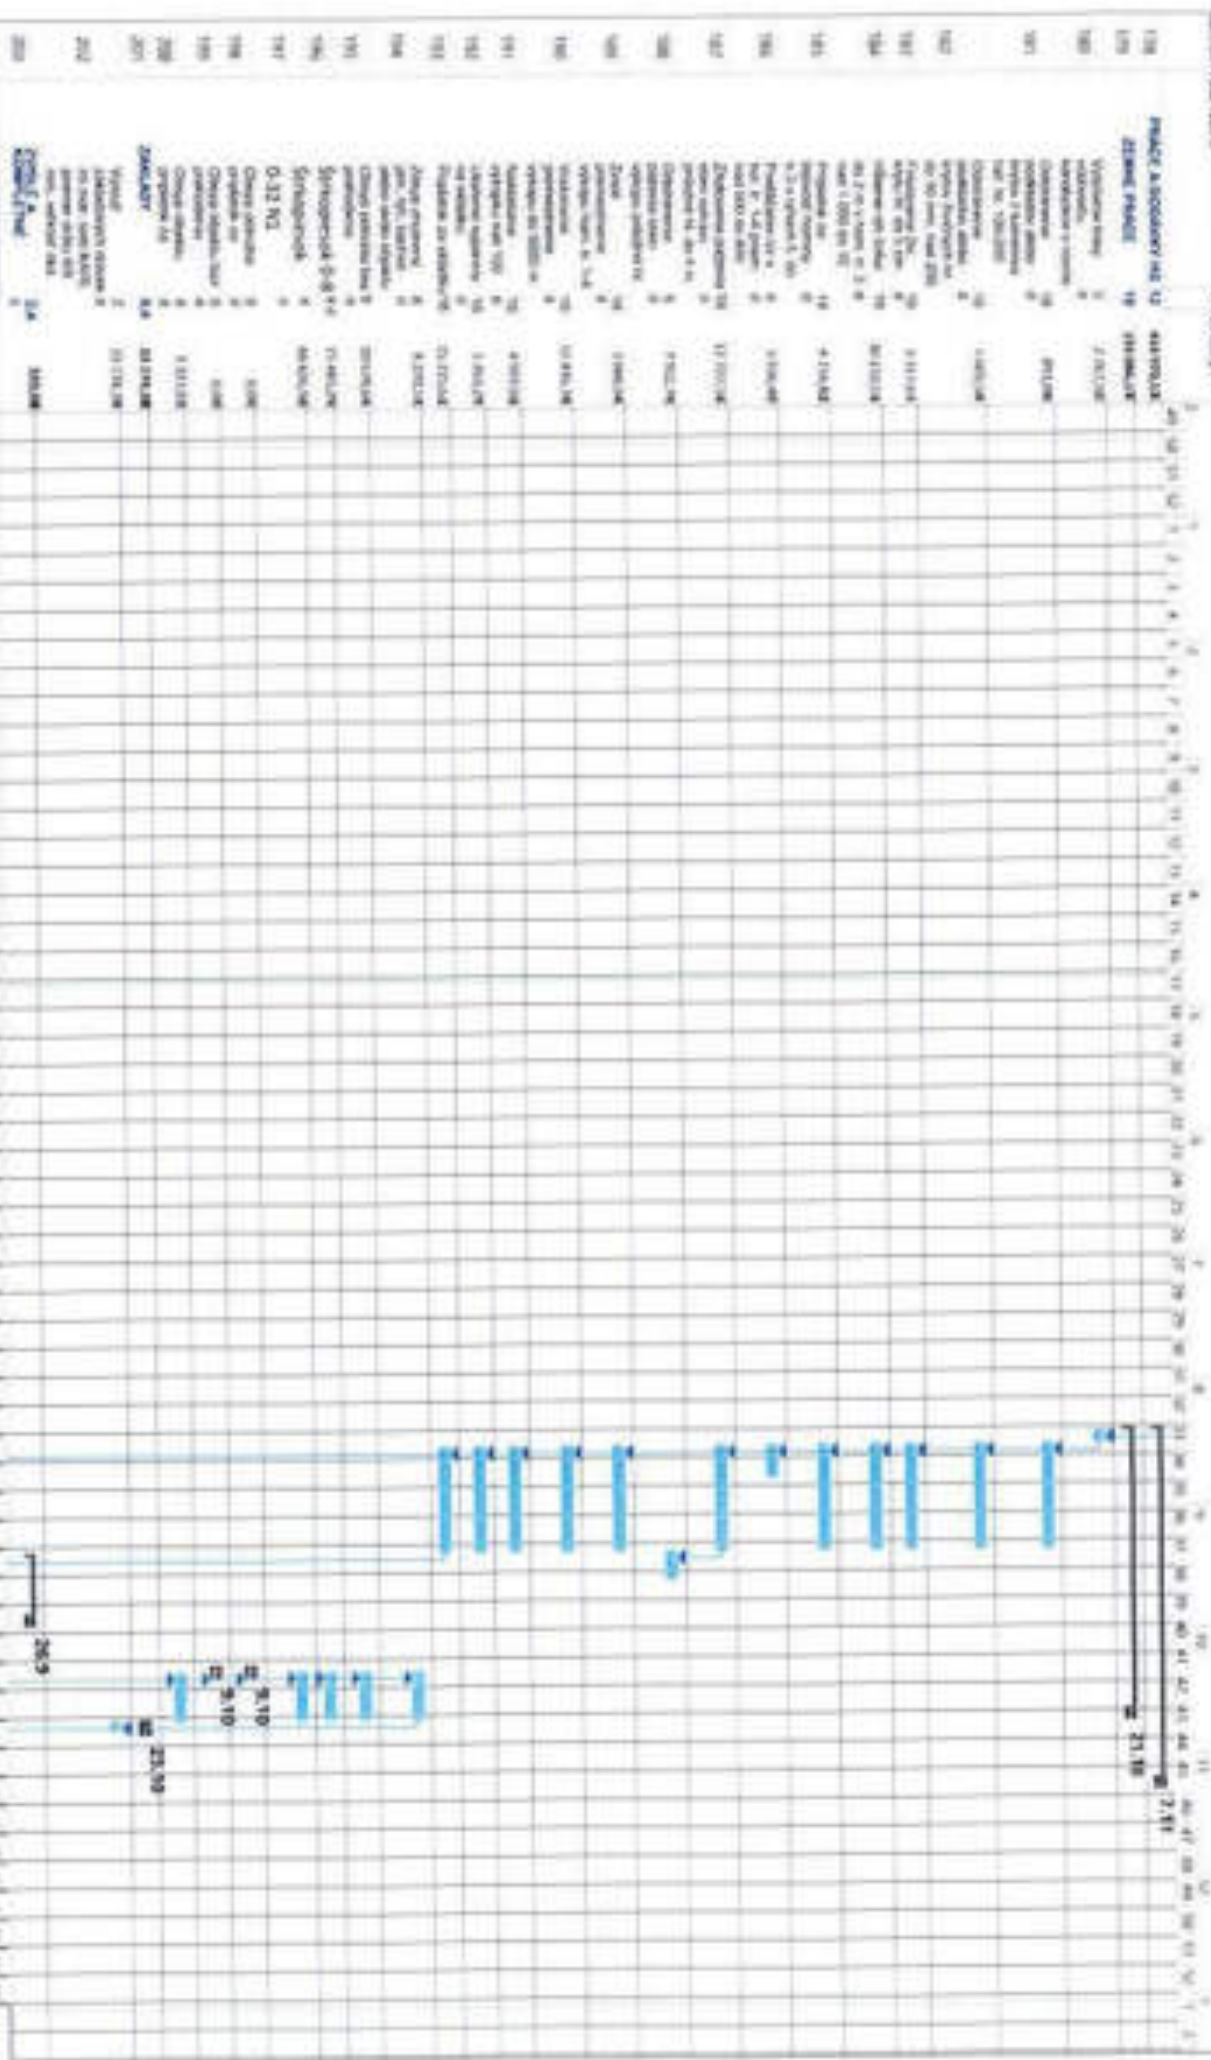

Project: 2004
Date: 2004

1: 2000

1: 2000

1: 2000

1: 2000

1: 2000

1: 2000

1: 2000


1: 2000

1: 2000

1: 2000


1: 2000

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.
205	Водосток изделие из полипропилена с отливом	шт.	1	100
206	Водосток изделие из полипропилена с отливом	шт.	1	100
207	Водосток изделие из полипропилена с отливом	шт.	1	100
208	Водосток изделие из полипропилена с отливом	шт.	1	100
209	Водосток изделие из полипропилена с отливом	шт.	1	100
210	Водосток изделие из полипропилена с отливом	шт.	1	100
211	Водосток изделие из полипропилена с отливом	шт.	1	100
212	Водосток изделие из полипропилена с отливом	шт.	1	100
213	Водосток изделие из полипропилена с отливом	шт.	1	100
214	Водосток изделие из полипропилена с отливом	шт.	1	100
215	Водосток изделие из полипропилена с отливом	шт.	1	100
216	Водосток изделие из полипропилена с отливом	шт.	1	100
217	Водосток изделие из полипропилена с отливом	шт.	1	100
218	Водосток изделие из полипропилена с отливом	шт.	1	100

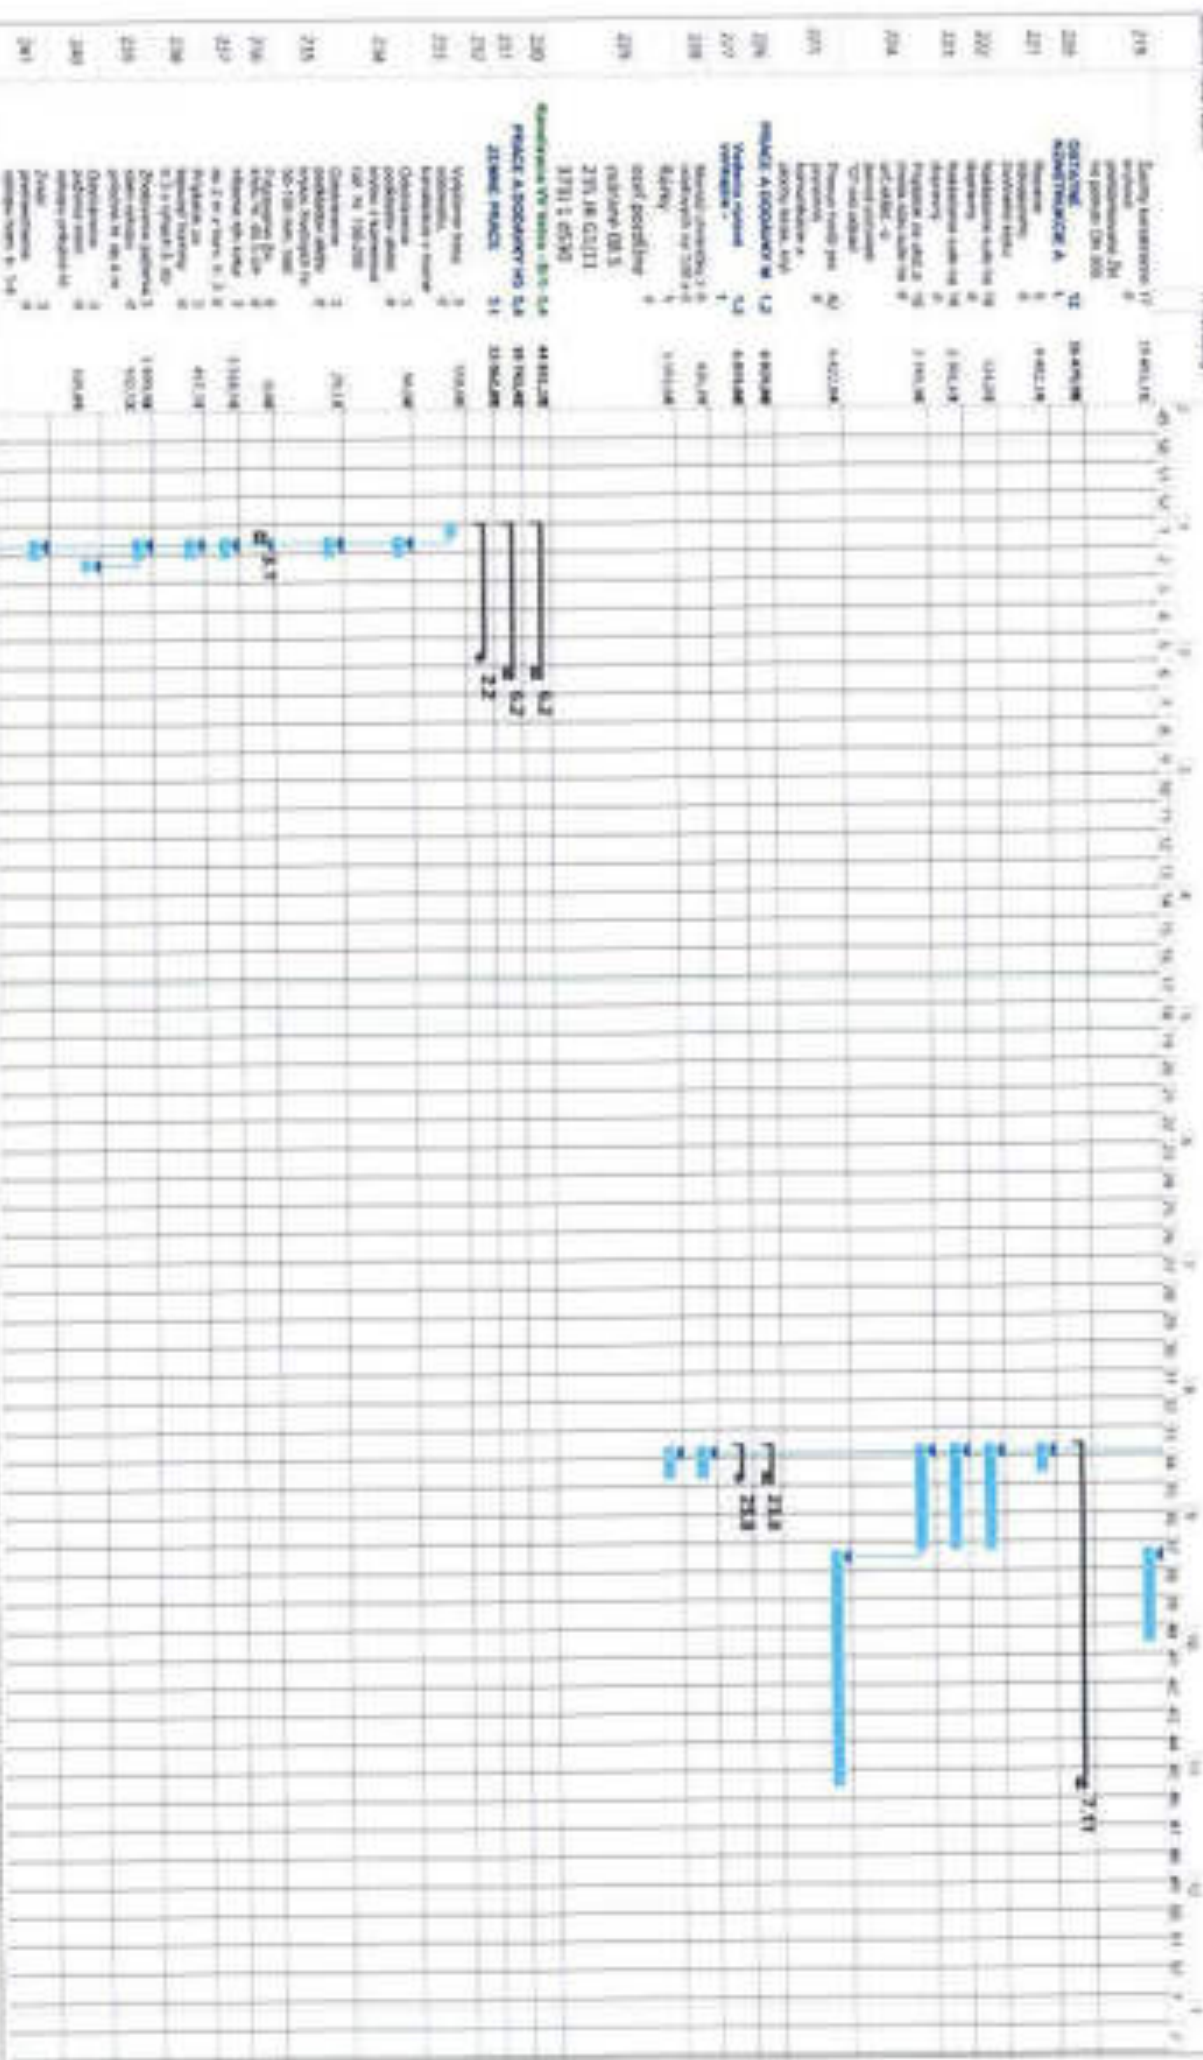

Project: Regional
Date: 2017.1.20

Station	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
60	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
70	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
80	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
90	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

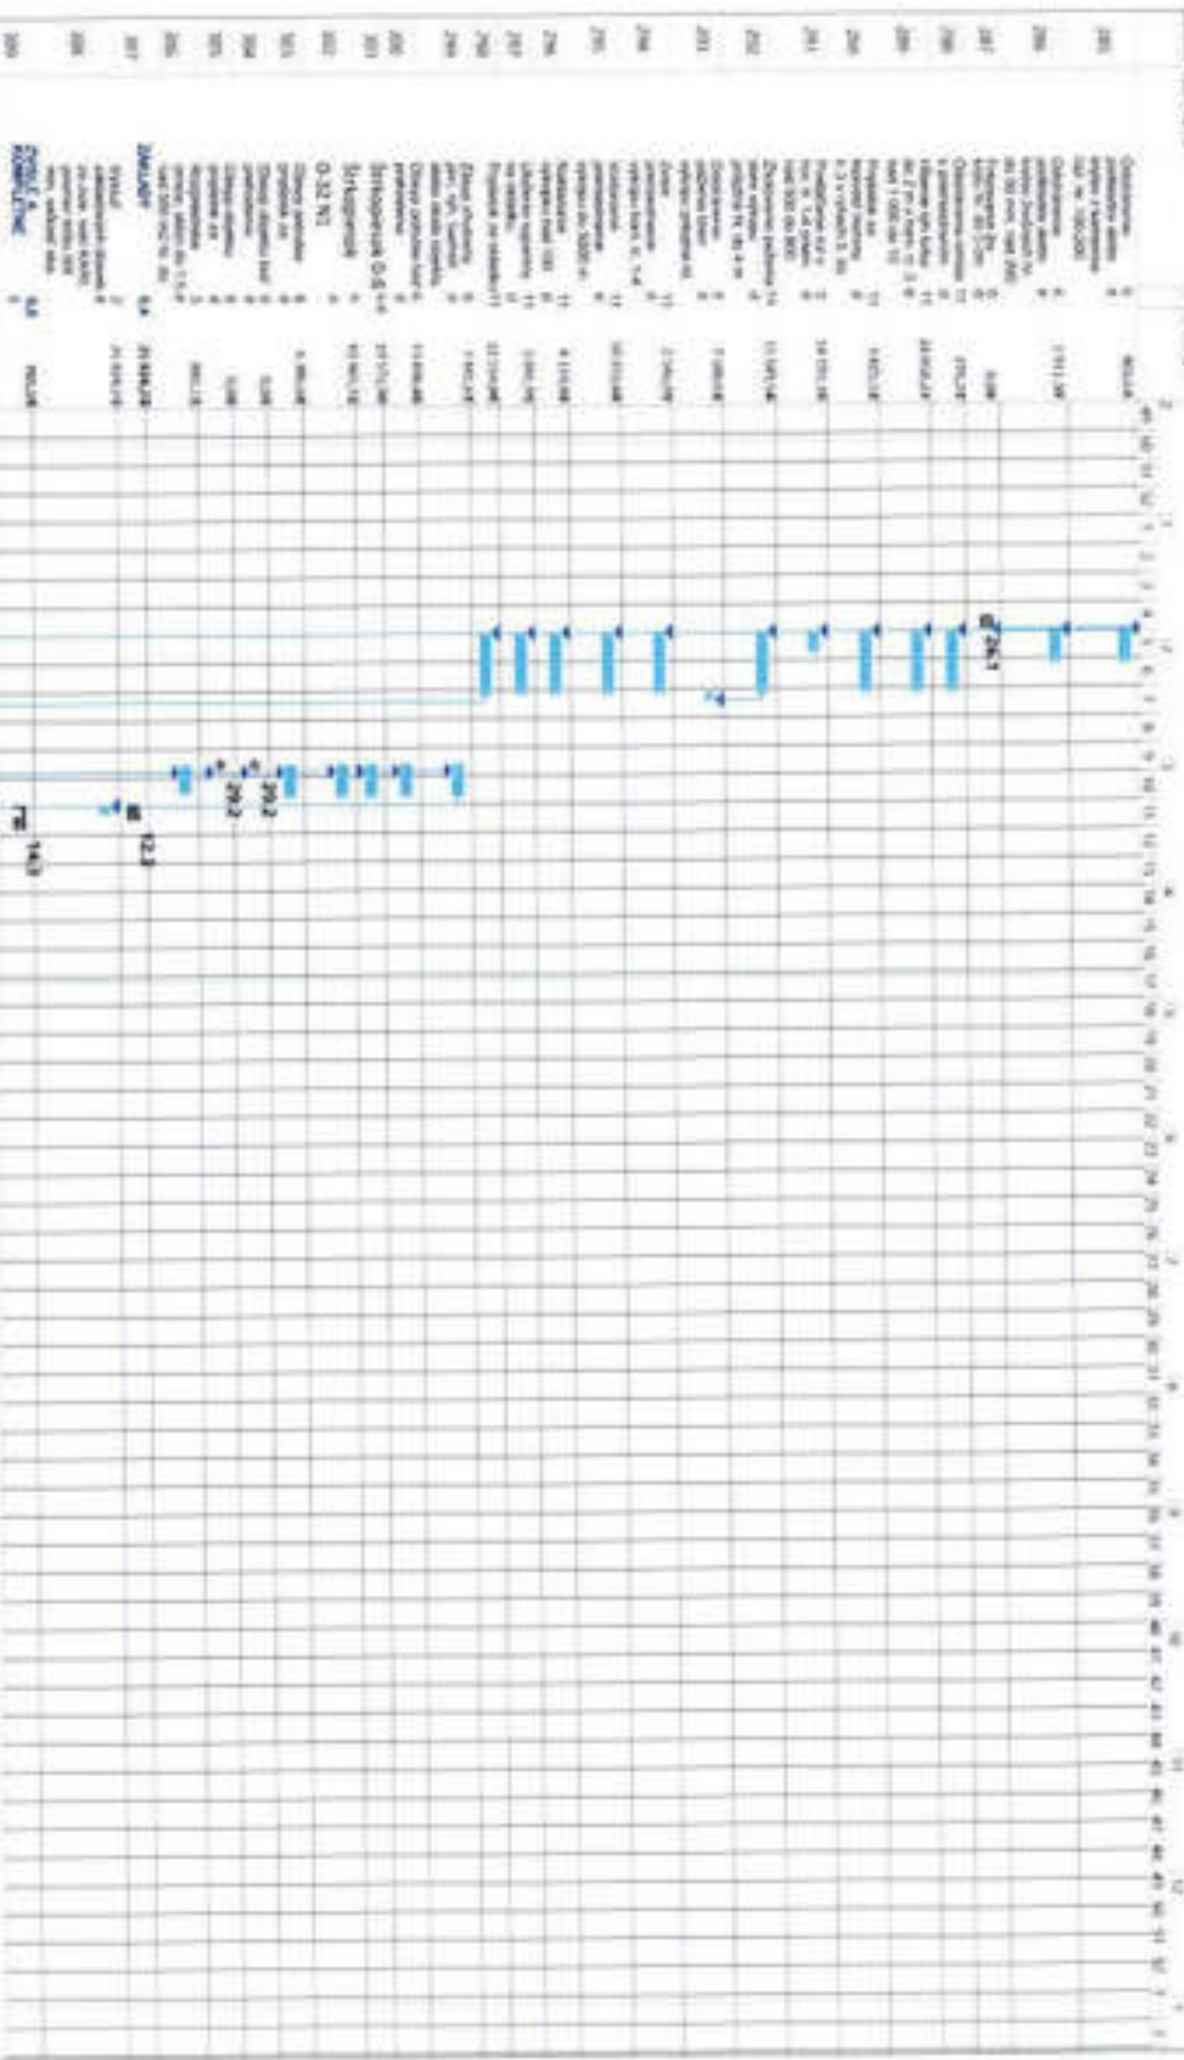

Project: Highway
Date: 07/17/2024

Stationing

200.0 200.1 200.2 200.3 200.4 200.5 200.6 200.7 200.8 200.9 201.0 201.1 201.2 201.3 201.4 201.5 201.6 201.7 201.8 201.9 202.0 202.1 202.2 202.3 202.4 202.5 202.6 202.7 202.8 202.9 203.0 203.1 203.2 203.3 203.4 203.5 203.6 203.7 203.8 203.9 204.0 204.1 204.2 204.3 204.4 204.5 204.6 204.7 204.8 204.9 205.0 205.1 205.2 205.3 205.4 205.5 205.6 205.7 205.8 205.9 206.0 206.1 206.2 206.3 206.4 206.5 206.6 206.7 206.8 206.9 207.0 207.1 207.2 207.3 207.4 207.5 207.6 207.7 207.8 207.9 208.0 208.1 208.2 208.3 208.4 208.5 208.6 208.7 208.8 208.9 209.0

[illegible]



Project: Project A
Date: 10/1/2024

Value	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

Príloha č. 6 - Zoznam subdodávateľov

Názov, adresa a IČO subdodávateľa	Oprávnená osoba konať v mene subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky vyjadrený v %
He – TEST, spol. s r.o. Ulica Vladimíra Clementisa 6643/35, 917 01 Trnava IČO 36 218 154	Ing. Gabriela Nízlová Horeckého 784/21 949 01 Nitra Dátum narodenia 7.1.1978	Kamerové skúšky potrubia, vykonávanie skúšok tesnosti	3%
AGG s.r.o. Kremnická 12 851 01 Bratislava IČO 36 628 476	Ing. Richard Míka Kremnická 20 851 01 Bratislava Dátum narodenia 17.1.1961	Geotechnik	3%
Matej Haváč Bazovského 415/6 949 11 Nitra IČO 48 086 649	Matej Haváč Bazovského 415/6 949 11 Nitra Dátum narodenia 2.10.1990	Strojové a technické vybavenie	5,50%
DIGGER s.r.o. Široká 19 949 05 Nitra IČO 47 098 520	Ján Križan Široká 19 949 05 Nitra Dátum narodenia 30.12.1984	Strojové a technické vybavenie	7%
ESO STAV s.r.o. Jaročná 397 951 35 Veľké Zálužie IČO 45 675 058	Jozef Bíro Jaročná 397 951 35 Veľké Zálužie Dátum narodenia 18.4.1982	Strojové a technické vybavenie	7%
STRENT, s.r.o. Jána Mrvu 24 949 01 Nitra IČO 35 941 120	Vladimír Strapko Jána Mrvu 24 949 01 Nitra Dátum narodenia 21.5.1965	Strojové a technické vybavenie	3%

BAUMANI Nitra s.r.o.
IČO 35 941 120
Jána Mrvu 24
949 01 Nitra
Lena 028
051 35 Lakota
020-47 540 158
020-47 540 158

Príloha č. 7:

Doklad(y) o zapísaní do registra partnerov verejného sektora u Zhotoviteľa, jeho iných osôb, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, každého člena skupiny a subdodávateľov, ak sa na nich táto povinnosť vzťahuje.

Príloha č. 7
Doklad(y) o zapísaní do registra partnerov verejného sektora u Zhotoviteľa, jeho iných osôb, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, každého člena skupiny a subdodávateľov, ak sa na nich táto povinnosť vzťahuje.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 06.06.2024

Číslo vložky: 14434

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : BAUMANN Nitra s.r.o.

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva:

b) Súpisné/Orientačné číslo: 906

c) Názov obce: Lehota

d) Psč: 95136

e) Štát: Slovenská republika

IČO: 47240768

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 05.04.2023

Obchodné meno : BAUMANN Nitra s.r.o.

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Šenkovská

b) Súpisné/Orientačné číslo: 189

c) Názov obce: Lehota

d) Psč: 95136

e) Štát: Slovenská republika

IČO: 47240768

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.08.2019 - 04.04.2023

Obchodné meno : BAUMANN Nitra s.r.o.

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Šenkovská

b) Súpisné/Orientačné číslo: 189

c) Názov obce: Lehota

d) Psč: 95136

e) Štát: Slovenská republika

IČO: 47240768

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 05.07.2017 - 31.07.2019

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : AK Šranko s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mostná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 29

c) **Názov obce:** Nitra

d) **Psč:** 949 01

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 50485601

Platnosť : od: 16.10.2020

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Tomáš Zaujec

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Lehota

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 236

c) **Názov obce:** Lehota

d) **Psč:** 95136

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 01.07.1989

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Áno

Platnosť : od: 16.10.2020

IV. Verejní funkcionári

Meno : Tomáš Zaujec

Platnosť : od: 16.10.2020

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 17.01.2024

Dátum overenia : 16.01.2024

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 06.06.2024

Číslo vložky: 36170

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : AAA MIDEA s.r.o.

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Dvorská cesta

b) Súpisné/Orientačné číslo: 0/23

c) Názov obce: Nové Zámky

d) Psč: 94002

e) Štát: Slovenská republika

IČO: 47642343

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 22.11.2022

Obchodné meno : AAA MIDEA s.r.o.

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Komárňanská

b) Súpisné/Orientačné číslo: 0/4348/31

c) Názov obce: Nové Zámky

d) Psč: 94002

e) Štát: Slovenská republika

IČO: 47642343

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 05.03.2022 - 21.11.2022

II. Oprávnená osoba

Meno : Mgr. Zsolt Ördög

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Turecká

b) Súpisné/Orientačné číslo: 36

c) Názov obce: Nové Zámky

d) Psč: 94023

e) Štát: Slovenská republika

IČO : 42253951

Platnosť : od: 05.03.2022

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Peter Habrman

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 557

c) **Názov obce:** Veľké Lovce

d) **Psč:** 94142

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 08.06.1984

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 05.03.2022

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 04.03.2024

Dátum overenia : 28.02.2024

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Príloha č. 8:

Závazný úverový príslub

GAUMANN HUB & CO. Ltd.
Léonard 100
2611 St. Laurent
QC H4T 1G5
Tél: 514 345 1100
Fax: 514 345 1101

Závazný úverový príslub

Banka: Tatra banka, a.s.
sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
zapísaná v: obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 71/B
IČO: 00 686 930
 (ďalej len „banka“)

týmto potvrdzuje a vyhlasuje, že žiadosť klienta

BAUMANN Nitra s.r.o.
sídlo: 951 36 Lehotá 906
zapísaná v: obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 41043N
IČO: 47 240 768
 (ďalej len „klient“)

zo dňa 24.5.2024 o poskytnutí úveru vo výške 450 000,- EUR na účely spolufinancovania projektu s názvom **Kanalizácia obce Mníchova Lehota** bola dňa 29.5.2024 schválená.

Vyhlasením a vystavením tohto úverového príslubu vzniká banke záväzok poskytnúť označenému klientovi úver ak sa banka a klient dohodnú na konečnom znení zmluvy o úvere a ak sa počas prípravy spolufinancovania nevyskytnú žiadne závažné okolnosti, ktoré by podľa názoru banky mohli viesť k zhoršeniu ekonomickej situácie klienta a tým k ohrozeniu schopnosti klienta plniť záväzky z pripravovaného úverového vzťahu s bankou. Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody, v prípade ak klientovi nebude bankou poskytnutý úver alebo jeho časť.

Doba platnosti úverového príslubu: do 29.11.2024

V Nitre, dňa 30.5.2024

Tatra banka, a.s.
 Hodžovo námestie 3
 Bratislava
 441



za banku

Marek Hrdica
 riaditeľ fremného centra

Ing. Marcela Solarová
 relationship manager Mid market

Sme súčasťou
 vášho biznisu

Príloha č. 9:

Potvrdenia a doklady zamestnávania osôb z MRK

Čestné prehlásenie

Ja, dolu podpísaný:

Trvale bytom:

Narodený:

Daniel Stojke

Týmto čestne prehlasujem, že patríam k [REDACTED]

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosť BAUMANN Nitra s.r.o.,
Lehota 906, 951 36 Lehota, IČO 47 240 768, AAA Midea s.r.o, Komárňanská 4348/31, 940 02
Nové Zámky, IČO 47 642 343, obci Mníchova Lehota a iným subjektom za účelom realizácie
zákazky Kanalizácia obce Mníchova Lehota.

V *Lehotě* dňa 5-6 2019

[REDACTED]
Meno a priezvisko



č.k.:

Nové Zámky 05.06.2024

POTVRDENIE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky týmto potvrdzuje, že

p. Daniel Stojka

narodený/á: [REDACTED]

adresa: [REDACTED]

je vedený/á v evidencii uchádzačov o zamestnanie

[REDACTED] rvá.

Predchádzajúce evidencie :

[REDACTED] rítane

Vybavuje: Ing. Martina Cigáňová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
F. Kapistóryho 1, 940 36 Nové Zámky
[Signature]
-75-



SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC

100

For advertising information:

Stojka

Daniel

References

[illegible]

5/16/2004 10:00 AM

Psychological Test

Concepts reviewed: Order of magnitude

© 2009 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 265: 103–110

[illegible]



Čestné prehlásenie

Ja, dolu podpísaný:

Trvale bytom:

Narodený:

ČOUKOVÁ MARCELA
[redacted]
[redacted]

Týmto čestne prehlasujem, že patrí

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosti BAUMANN Nitra s.r.o.,
Lehota 906, 951 36 Lehota, IČO 47 240 768, AAA Midea s.r.o, Komárňanská 4348/31, 940 02
Nové Zámky, IČO 47 642 343, obci Mníchova Lehota a iným subjektom za účelom realizácie
zákazky Kanalizácia obce Mníchova Lehota.

V VEĽKÝ ŠTAVROV 5.6.2024

[redacted]

Meno a priezvisko



č.k.

POTVRDENIE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad týmto potvrdzuje, že

p. Marcela Čonková

narodený a

adresa

Je vedený/á v evidencii uchádzačov o zamestnanie

trvá.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Poprad
Hlavná 64/11, 058 01 Poprad
31.

Vybavuje;

Mgr. Anetta Dobisová



SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVAK REPUBLIC
OBYČIANSKY PREUKAZ / ID-CARD

Prezývka / Surname

Čonková

Ime / Given names

Marcela

Číslo občianstva / Nationality

[REDACTED]

Pohlavie / Sex

[REDACTED]

Číslo / No.

[REDACTED]

Vydal / Issued by

[REDACTED]

Podpis držiteľa / Signature

[REDACTED]

Podpis vydávateľa / Issued by

[REDACTED]

Podpis človeka / Issued by

[REDACTED]

Podpis držiteľa / Issued by

[REDACTED]

Podpis držiteľa / Issued by

[REDACTED]

Podpis držiteľa / Issued by

[REDACTED]



Čestné prehlásenie

Ja, dolu podpísaný:

Trvale bytom:

Narodený:

VASIL STOJKA

Týmto čestne prehlasujem, že patrí

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosti BAUMANN Nitra s.r.o.,
Lehota 906, 951 36 Lehota, IČO 47 240 768, AAA Midea s.r.o, Komárňanská 4348/31, 940 02
Nové Zámky, IČO 47 642 343, obci Mnichova Lehota a iným subjektom za účelom realizácie
zákazky Kanalizácia obce Mnichova Lehota.

v N. Le dňa 04.06.2024

Meno a priezvisko

VASIL STOJKA



POTVRDENIE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra týmto potvrdzuje, že

p. Vasil Stojka

narodený/a [REDACTED]

adresa [REDACTED]

bol/a vedený/á v evidencii uchádzačov o zamestnanie

[REDACTED] vrátane

[REDACTED] vrátane

[REDACTED] vrátane

[REDACTED] vrátane

[REDACTED] vrátane

[REDACTED] vrátane

Vybavuje: Slavka Blányiová

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

NITRA

Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra

- 00 -



Čestné prehlásenie

Ja, doľu podpísaný:

Trvale bytom:

Narodený:

Rigo Ján

Týmto čestne prehlasujem, že patrí

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosti BAUMANN Nitra s.r.o.,
Lehota 906, 951 36 Lehota, IČO 47 240 768, AAA Midea s.r.o, Komárňanská 4348/31, 940 02
Nové Zámky, IČO 47 642 343, obci Mníchova Lehota a iným subjektom za účelom realizácie
zákazky Kanalizácia obce Mníchova Lehota.

V *Šuranyoch* dňa 04.06.2024


Meno a priezvisko







č.k.: NZ2/SZ/ZAM/2024/17597

Nové Zámky 04.06.2024

POTVRDENIE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky týmto potvrdzuje, že

p. Ján Rigo

narodený/á

adresa:

je vedený/á v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Predchádzajúce evidencie :

vrátane

vrátane

vrátane

vrátane

vrátane

vrátane

vrátane

Vybavuje: Mária Tináková

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Nové Zámky
F. Kapistóryho 1, 940 36 Nové Zámky
44

Čestné prehlásenie

Ja, dolu podpísaný:

Trvale bytom:

Narodený:

ĽUDOVÍT CZUCOR

Týmto čestne prehlasujem, že patrí

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosti BAUMANN Nitra s.r.o.,
Lehota 906, 951 36 Lehota, IČO 47 240 768, AAA Midea s.r.o, Komárňanská 4348/31, 940 02
Nové Zámky, IČO 47 642 343, obci Mnichova Lehota a iným subjektom za účelom realizácie
zákazky Kanalizácia obce Mnichova Lehota.

v Lehote dňa 04.06.2024

Meno a priezvisko

ĽUDOVÍT CZUCOR



POTVRDENIE

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra týmto potvrdzuje, že

p. Ľudovít Czuczor

narodený/á

adresa:

je vedený/á v evidencii uchádzačov o zamestnanie

encia trvá.

Predchádzajúce evidencie :

vrátane

vrátane

vrátane

vrátane

vrátane

vrátane

vrátane

Vybavuje: Slavka Bányiová

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

NITRA

Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra

- 00 -



Profesia	Meno a priezvisko	Číslo oprávnenia
Stavbyvedúci	Ing. Marek Blaško	12504
Skúšky tesnoti	Ing. Miroslav Nízl	LT3/23/83/B
Kamerové skúšky	Jaroslav Strecký	VT2/21/697/A
Geodet	Ing. Juraj Krajmer	1012
Geotechnik	Ing. Richard Míka	4420*Z*13

Typ stroja	Názov stroja
Cestná fréza so zhotovovaním odpaľu R6	Wirtgen Road W 150
Ošetrový bager s hmotnosťou min. 15 ton	ROMA750/PC210LC, New Holland E215, TAKEUCHI TB215D LP
Cestný frezler so šírkou pohľadky od 5m do 2,2m	Emmer BT200C - 2 TV
Cestný frezler so šírkou pohľadky 2,5 do 5 m	ROMAG RF 600C-2
Automobil s motorenou penetračnou postreku	Renault Midlum
Cestný valc s hmotnosťou min. 5 ton	Vibračný valc BB358-AP-6A
Cestný valc s hmotnosťou min. 8 ton	ROMAG RW 215 DH
Valcový valc s hmotnosťou nad 1,5 tony	Valcový valc, BATHOLD, Bomag BMP 850D, AMMANN ARR1575 SV
Traktorbager alebo ťažký nakladač	Caterpillar 480F2
Smýkací ručný nakladač	SUNWARD SWL5700, SUNWARD SWL1220 RF, SUNWARD SWL4018
Mini bager s hmotnosťou min. 3,5t - max 6 ton	Kubota U 35-3, Takeuchi TB138B
Nákladný automobil značky Euro 6 so sklápacou korbou	Tatra Phoenix, Renault C Pôvod OFF ROAD 131 E6, RENAULT 6MB2
Nákladný automobil G800 značky Euro 6	PLIECEI, Tatra MAN TGS 18.480 XLX H 8C5
Paleta box výkopový	palety box 2580x2000x115, palety box 2580x2000x115, palety box 2580x2000x115, palety box výkopový 301x110x210, palety box výkopový 301x110x210, palety box výkopový 300x110x210
Paleta box ťažový	Ťažový box 2850x2400, Ťažový box 2850x2400, Ťažový box 2850x2400
Stĺpová nevykondenzovaná voda vodotesnosť, tesniace veko, olej monitor, kompresor, náhradný zdroj	EU 22 - 2200W, Tesniaci vak nepriechodný U70/60, Tesniaci vak priechodný Weiching PU 20/60 E, ovládacia jednotka s podtlakom 0,25MPa, kompresor olej 3,2 kW 300L
Motorová čerpadla min. 1000l/min	Čerpadlo WT32K, Čerpadlo WT30K, Čerpadlo WT40K
Elektrická súprava min. 11,5kW	Elektrická súprava TRT-34 H 02/010-6, Elektrická súprava ESE 502W II, Elektrická súprava TRT-34
